



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

**PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA DÉPENSE
PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)**

UNITÉ DE GESTION DU PROJET

**REVUE DES MARCHÉS PASSÉS PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES AU TITRE DE LA GESTION
BUDGETAIRE 2019, 2020 ET 2021**

RAPPORT PROVISOIRE DE SYNTHÈSE

SOMMAIRE

ABREVIATIONS ET ACRONYMES	4
I. RÉSUMÉ DU RAPPORT DE LA MISSION	6
II. MANDAT CONFIE À L'AUDITEUR	10
2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION	10
2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION	11
2.2.1. OBJECTIF GLOBAL	11
2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES	11
III - CONCLUSIONS SUR :	13
3.0. LE CADRE REGLEMENTAIRE	13
3.0.1. TEXTES APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES CTD	13
3.0.2. POSITIONNEMENT DE LA REGLEMENTATION PAR RAPPORT AUX NORMES INTERNATIONALES ET AUX OBJECTIFS NATIONAUX DE DEVELOPPEMENT	15
3.0.3. REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS ET LOI PORTANT CODE GENERAL DES CTD	23
3.1. LES CONTRATS AUDITES	25
3.1.0. LISTE DES MARCHES A AUDITER	25
3.1.1. COLLECTE, ARCHIVAGE ET BANQUE DES DONNEES	27
3.1.2. EXPLOITATION DES DOCUMENTS COMMUNIQUEES A L'AUDITEUR	29
3.2. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DE MARCHES	36
3.2.1. VERIFICATION DU NIVEAU DE MATURITE DES PROJETS	36
3.2.2. CONTROLE A PRIORI PAR L'OBSERVATEUR INDEPENDANT	36
3.2.3. CONTROLE DE L'EXECUTION - LIMITATION DES DOCUMENTS DISPONIBLES	36
3.3. LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE PASSATION DES MARCHES	37
3.4. LES MAITRES D'OUVRAGES	38
IV. RECOMMANDATIONS SUR L'AMELIORATION DU SYSTEME	39
4.1. ADAPTATION AUX STANDARDS INTERNATIONAUX ET AUX OBJECTIFS NATIONAUX	39
4.1.1. CHAMP D'APPLICATION ET PORTEE DU CADRE REGLEMENTAIRE :	39
4.1.2. REGLES CONCERNANT LA PARTICIPATION :	39
4.1.3. CRITERES D'EVALUATION ET D'ATTRIBUTION :	39
4.1.4. DROIT DE CONTESTER ET DE FORMULER UN RECOURS :	39
4.1.5. NORMES CONCERNANT LA TENUE EN LIEU SUR DES ARCHIVES, DOCUMENTS ET DONNEES ELECTRONIQUES :	39
4.1.6. REGLEMENTATION D'APPLICATION PREVOYANT LES PROCESSUS ET LES PROCEDURES :	40
4.1.7. ACHATS PUBLICS DURABLES :	40

4.2. REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS ET LEGISLATION SUR LES CTD	40
4.3. MAUVAISES PRATIQUES ET DYSFONCTIONNEMENTS	41
4.3.1. ARCHIVAGE	41
4.3.2. PRELIMINAIRES	41
4.3.3. DOSSIERS DE CONSULTATION ET CCAG	41
4.3.4. ENREGISTREMENT DES OFFRES	41
4.3.5. ENTRAVES A UNE SAINTE CONCURRENCE	41
4.3.6. DEFALLANCE DU CONTROLE A PRIORI PAR L'OI	41
4.3.7. NON-CONFORMITE DES PROCES-VERBAUX DE SEANCE	42
4.3.8. MARCHES DE GRE A GRE	42
4.3.9. CONFLIT DE COMPETENCE	42
4.3.10. EXECUTION	42
V. ANNEXES	43
5.1. LES TERMES DE REFERENCE	44
5.2. LA METHODOLOGIE UTILISEE	53
5.2. METHODOLOGIE	54
5.2.1. PLANIFICATION DE LA MISSION	54
5.2.2. EXECUTION DE LA MISSION	55
5.3. ETAT DE RAPPROCHEMENT DES DOCUMENTS COMMUNIQUEES A L'AUDITEUR AVEC LES DONNEES DE LA BANQUE	57
5.4. ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS DISPONIBLES A LA BANQUE DES DONNEES AU DEMARRAGE DE L'AUDIT	110
5.5. ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES LE DEMARRAGE DE L'AUDIT	112
5.6. COLLECTE COMPLEMENTAIRE AUPRES DES MAÎTRES D'OUVRAGE	114
5.7. DOCUMENTS MANQUANTS AU TERME DE LA COLLECTE DE RATTRAPAGE	116

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

AC	Autorité Contractante
AG	Approvisionnements Généraux
AAO	Avis d'Appel d'Offres
AOIO	Appel d'offres International Ouvert
AONO	Appel d'Offres National Ouvert
AOIR	Appel d'Offres International Restreint
AONR	Appel d'Offres National Restreint
ARMP	Agence de Régulation des Marchés Publics
BD	Banque des données sur les marchés publics
CCAG	Cahier des Clauses Administratives Générales
CCCM	Commission Centrale de Contrôle des Marchés
CER	Comité d'Examen des Recours
CMP	Code des marchés publics
CNE	Certificat de non-exclusion des marchés publics
CPM	Commission de Passation des Marchés
DC	Demande de cotation
DTAO	Dossier-Type d'Appel d'Offres
DTDC	Dossier-type de Demande de Cotation
GG	Gré à gré
JDM	Journal des marchés publics
MAPS	Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés publics
MINDDEVEL	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local
MINMAP	Ministère Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics
MO	Maître d'Ouvrage
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Economiques
OI	Observateur Indépendant
OSD	Ordre de Service de Démarrage
SIGAMP	Structure Interne de Gestion Administrative des Marchés Publics
SND30	Stratégie Nationale de Développement 2020 - 2030
SPI	Services et Prestations Intellectuelles
TDR	Termes de référence
TRAV	Travaux

**A MONSIEUR LE COORDONNATEUR TECHNIQUE
PROJET D'AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE LA
DÉPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTÈME STATISTIQUE
(PEPS)
SISE A BASTOS, BP 660 YAOUNDE-CAMEROUN,
E-mail : Pepsgov.cm@gmail.com / toufo_s@yahoo.fr**

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Audit des marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) au titre de la gestion budgétaire 2019, 2020 et 2021.

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de la mission d'audit des marchés publics passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées au titre de la gestion budgétaire 2019, 2020 et 2021 qui nous a été confiée par le Projet d'Amélioration de l'Efficacité de la Dépense Publique et du Système Statistique (PEPS), nous avons l'honneur de vous transmettre pour observations le rapport de synthèse provisoire de ladite mission.

Ce document retrace les conditions de déroulement de la mission sur le terrain et rend compte des résultats des travaux effectués.

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements au personnel de l'ARMP pour son précieux concours à la réalisation de la mission.

Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire et vous prions de croire, **Monsieur le Coordonnateur**, en notre considération distinguée.

Bamako, le 21 décembre 2023

Le mandataire du groupement

Sekou DIARRA
Expert-Comptable Diplômé
Commissaires aux comptes
Inscrit au Tableau de l'Ordre National
des experts-comptables et Comptables Agréés

I. RÉSUMÉ DU RAPPORT DE LA MISSION

L'audit des marchés passés par les CTD au cours des trois exercices budgétaires 2019, 2020 et 2021, a porté sur un échantillon de **599 marchés** d'une valeur totale de **120 287 733 260 FCFA TTC**. Cependant, après correction d'un certain nombre d'erreurs d'imputation de montant dans la banque des données de l'ARMP d'un montant de **-1.628.594.973 F CFA TTC** (-188.748.000 en 2019, -899.876.970 en 2020, et -539.970.003 en 2021), la valeur globale des contrats de l'échantillon est plutôt de **118 659 138 287 F CFA TTC**. Les travaux ont été réalisés en conformité avec les TDR de la mission et de la réglementation en vigueur. Au terme de cette mission, les faits saillants suivants ont été constatés :

En ce qui concerne le suivi des recommandations des précédents audits, il sied de relever que l'audit des marchés des exercices 2019, 2020, et 2021 se déroulant au même moment, un plan d'actions de mise en œuvre des recommandations de l'exercice précédent ainsi que son suivi, ne peuvent se rapporter qu'à l'année 2013, objet du dernier rapport d'audit du système des marchés publics au Cameroun.

Nonobstant l'écart de cinq (5) ans entre ces deux périodes auditées, ainsi que le changement de Code des marchés publics intervenu dans l'intervalle, en l'occurrence, en 2018, les préoccupations liées à l'archivage et aux prestations des OI demeurent.

En effet, à la page 86 de son rapport, le cabinet AUDITEC FOIRIER Consulting, après avoir relevé que “les rapports des OI pour l'exercice 2013 sont restés quasi-introuvables”, avait notamment recommandé la conservation numérique des rapports et le rapprochement entre les OI et l'Auditeur Indépendant en vue d'une mutualisation et une bonne coordination des contrôles, au regard de l'importance des rapports des OI pour la réalisation du contrôle a posteriori. Bien plus, et contrairement à l'exercice 2013, bon nombre de procédures qui sont de la compétence de l'OI ne sont même pas couvertes par ce dernier.

A la page 90 du même rapport, les insuffisances du système d'archivage des documents sont relevées comme faisant partie des difficultés rencontrées par cet auditeur pour exercer sa mission, à l'instar de la présente.

Aussi, concernant la collecte des documents, leur archivage, et la banque des données, l'Auditeur recommande-t-il :

- la prise de sanctions à l'encontre des Maîtres d'ouvrage qui persistent dans la rétention des documents ;
- une rationalisation de la gestion des archives afin de s'assurer, notamment, de ce que tout ce qui y entre est effectivement consultable, et d'un regroupement des éléments par projet, y compris les actes de régulation et les rapports d'OI, les recours, dénonciations, demandes d'arbitrage et d'avis techniques ;
- une amélioration de la banque des données pour qu'elle puisse autant que faire se peut, refléter la situation de l'archivage physique avec des vérifications régulières de son contenu.

Quant au cadre réglementaire, il est resté stable durant les trois années sous revue, mis à part les bases d'un surcroit de transparence procurées au système des marchés publics par la mise en place effective d'un mécanisme indépendant de gestion des recours par arrêté n° 413/A/PR/MINMAP du 08 Décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l'examen des recours résultant des marchés publics, en application des dispositions de l'article 49(2) du CMP.

Par ailleurs, force est de constater que les évolutions et les innovations contenues dans le décret n° 2018/366 du 18 juin 2018 portant Code des marchés publics qui réglementent les marchés passés par les CTD, vont résolument dans le sens d'améliorer l'efficacité de leur passation.

Cependant, à l'aune des standards internationaux, et en droite ligne des objectifs nationaux de développement, dont la SND30, il serait indiqué pour le système d'examiner la possibilité de :

- (i) tendre vers un Code de la Commande publique, en général ;
- (ii) rattacher la nationalité d'un appel d'offres uniquement à celle des organes de publication ;
- (iii) intégrer les préoccupations liées au cycle de vie dans l'analyse des offres ;
- (iv) ouvrir les archives de l'ARMP au public ;
- (v) élaborer l'ensemble des outils de soutien et les mettre à jour régulièrement, ainsi que la réglementation d'application, notamment les clauses administratives générales des marchés ;
- (vi) rendre plus commode la maîtrise de la réglementation d'application par l'élaboration et la vulgarisation d'un document unique intégrant l'ensemble des textes y afférents ;
- (vii) s'engager résolument sur la voie d'un achat public durable, dans le droit fil des objectifs de la SND30, *“pour la transformation structurelle et le développement inclusif”*.

En outre, certains arrangements s'imposent afin de mettre en adéquation la réglementation des marchés publics et la législation sur les CTD.

Somme toute, il s'agit d'un cadre réglementaire plutôt solide mais nécessitant quelques ajustements pour renforcer la transparence, la responsabilité, et l'efficacité du système.

Quant aux dysfonctionnements et mauvaises pratiques révélés par l'analyse des processus, les recommandations y afférentes et qui sont de nature à avoir une incidence sur le cadre normatif ne pourront être formulées qu'après avoir pris connaissance des mesures prises par l'ARMP à travers ses actes de régulation, notamment.

Les recommandations découlant des conclusions relatives aux contrats audités révèlent de réelles préoccupations au niveau de l'archivage (physique et électronique), la programmation, la mise à jour des DTAO, du DTDC et des CCAG, l'enregistrement des offres, l'exercice d'une saine concurrence, le contrôle a priori par les OI, la conformité de certains procès-verbaux de séance des commissions, la manifestation d'un conflit de compétence entre l'ARMP et le MINMAP en matière de régulation opérationnelle, et l'exécution de prestations avant la signature du marché y afférent.

Pour autant, et de manière générale, il appert de l'évaluation des processus que la matérialisation du principe de séparation des fonctions qui s'opère sous l'emprise du nouveau CMP, a considérablement amélioré la fluidité du système.

Le fonctionnement du système de passation de marchés révèle des insuffisances notables, même si, assurément, le CMP imprime aux structures opérationnelles intervenant dans la chaîne de la contractualisation, un fonctionnement consacrant la fluidité, l'allègement, la cohérence et la rationalisation des procédures, dont : (i) la pleine responsabilisation des Maîtres d'Ouvrage ; (ii) la nette séparation des fonctions de passation, de contrôle externe et de régulation des marchés publics ; (iii) l'institution d'un mécanisme indépendant d'examen des recours des soumissionnaires. Certes, la programmation budgétaire d'un projet d'investissement public dans le cadre des dépenses à moyen terme et son inscription dans la loi de finances sont subordonnés au visa de maturité. Toutefois, aussi bien cette exigence que la mise à jour du plan de passation des marchés restent difficile à vérifier en raison de l'absence de leur collecte.

En outre, le contrôle a priori présente des défaillances significatives, avec un nombre substantiel de projets de la compétence de l'Observateur Indépendant, mais qui ne sont pas couverts par cet acteur, et ce, pour des raisons qui ne sont pas encore déterminées par l'Auditeur, en attente des rapports d'OI.

Le dysfonctionnement des instances de passation des marchés est manifeste, avec des commissions qui adoptent des dossiers non conformes à la réglementation, négligent les exigences de mise à jour de la programmation, et produisent des documents lacunaires, signalant ainsi un besoin pressant de renforcement des capacités. Ces déficiences compromettent la transparence et l'équité du processus, ainsi que la planification et l'exécution efficaces des marchés publics. Des actions immédiates, notamment des formations supplémentaires et sur mesure, sont recommandées pour remédier à ces lacunes et garantir un fonctionnement plus transparent et efficace des instances de passation des marchés.

La vérification du contrôle de l'exécution se trouve entravée par le nombre restreint de documents disponibles pour la phase d'exécution (à peine, un document par marché, en moyenne), retardant ainsi une évaluation exhaustive du contrôle interne et externe.

De manière similaire, le faible taux de documents disponibles, voire leur manque d'exhaustivité (**projets ayant fait l'objet de plaintes, de déperdition de procédure, ayant été couvert par un observateur indépendant**, etc.) obèrent, non seulement, une organisation efficace de la mission, mais aussi, la formulation de certaines recommandations.

Par ailleurs, **l'absence de données et de documents sur les sanctions des acteurs et des procédures** compromet notamment l'appréciation des suites réservées aux écarts relatifs aux conditions accompagnant la délivrance des autorisations de gré à gré (caducité en l'absence de notification du marché dans un délai de 45 jours, mise à jour préalable de la programmation, consultation d'au moins trois entreprises suivant le régime de l'article 109 c) du CMP).

De plus, **l'absence d'éléments sur le règlement des prestations** limite la capacité de l'Auditeur à formuler des observations complètes. Une action immédiate est recommandée pour remédier à ces déficiences.

L'évaluation de la performance des Maîtres d'Ouvrage dans la gestion des marchés publics, sur le plan du respect des normes lors du contrôle interne par les personnes qu'il accrédite (Chef de service, Ingénieur, et Maître d'œuvre, le cas échéant), n'est pas encore possible au regard du faible taux de collecte susvisé (à peine un document de la phase exécution, en moyenne, par marché).

Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de communiquer dans les meilleurs délais à l'Auditeur tous les documents attendus (passation, exécution, et paiement), ainsi que les actes de régulation et tout autre document pertinent (rapports d'OI, recours, dénonciations, désaccords, sanctions, déperditions de procédure) se rapportant aux procédures relatives aux marchés de l'échantillon.

II. MANDAT CONFIE À L'AUDITEUR

2.1. CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la dépense publique et du renforcement du système statistique au Cameroun, le gouvernement bénéficie d'un financement de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour le projet visant à améliorer l'efficacité de la dépense publique et du système statistique. Ce projet est structuré de quatre principales composantes :

(i). Réforme des Finances Publiques dans les Ministères Pilotes : Cette composante vise à consolider la réforme des finances publiques dans les ministères clés de la santé et de l'éducation. Elle soutiendra la mise en œuvre de la Circulaire du Premier Ministre de septembre 2016, préparera le troisième triennat du budget programme, et facilitera le déploiement du système intégré de gestion des ressources humaines et de la solde (SIGIPES II).

(ii). Amélioration de l'Efficacité de l'Investissement Public : Cette composante se concentrera sur l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public, notamment par le soutien à la mise en place du fonds de maturation, l'appui au suivi du Budget d'Investissement Public (BIP), et l'identification d'actions pour réduire les soldes engagées non décaissées en matière de financement extérieur.

(iii). Réforme des Marchés Publics : Cette composante vise à soutenir la réforme des marchés publics par l'introduction d'un système de rémunération axé sur les résultats pour les commissions de passation des marchés, le développement d'une application d'archivage et de suivi des marchés publics (e-tracking), et le renforcement des capacités des acteurs du système des marchés publics.

(iv). Renforcement du Système Statistique : La dernière composante a pour objectif de renforcer le système statistique à travers la mise en place d'infrastructures informatiques et de diffusion, l'appui à la collecte et à l'analyse des données sur la pauvreté, la collecte de données sur le commerce transfrontalier, et le soutien au financement du 4ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH).

La composante 3, axée sur la performance du système de passation des marchés, vise à améliorer son fonctionnement par des leviers d'efficacité, d'efficience et de rentabilité. Une évaluation approfondie de ce système est prévue, utilisant des audits pour évaluer l'efficacité, l'efficience, la rentabilité et la performance. Ces audits permettront également d'adresser des questions statistiques et d'évaluer le niveau de compétence des acteurs impliqués, identifiant ainsi les besoins en formation.

L'instauration d'audits dès l'exercice 2000 répondait déjà à ces préoccupations. Ces audits annuels, réalisés par des Auditeurs Indépendants recrutés par l'ARMP, constituaient une opportunité précieuse pour évaluer le système de passation des marchés au cours de la triennale 2019-2020-2021, alignée avec la mise en œuvre du PEPS.

2.2. OBJECTIFS ET ÉTENDUE DE LA MISSION

L'objet de la mission est de procéder à l'audit des marchés publics et de l'exécution physique des contrats conclus au titre de la gestion budgétaire 2019, 2020 et 2021.

2.2.1. OBJECTIF GLOBAL

L'objectif principal de cette mission consiste à examiner et évaluer les processus de passation et d'exécution des marchés publics conclus par les Collectivités Territoriales Décentralisées au cours des exercices 2019, 2020 et 2021. En résultat, émettre un avis professionnel sur ces procédures.

2.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

De façon spécifique, la réalisation de l'audit des marchés publics consiste à :

- arrêter la liste des marchés à auditer (exercices 2019, 2020 et 2021) choisis de manière aléatoire par une méthode d'échantillonnage bien détaillée et clairement expliquée
- procéder à l'examen de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées au cours des exercices budgétaires 2019, 2020, 2021 avec la réglementation en vigueur, y compris le cas échéant, avec les dispositions des accords de financement régissant les marchés sur financement extérieur ;
- évaluer la capacité de l'ARMP et des autres Acteurs à classer et archiver convenablement les documents relatifs à la passation, à l'exécution et au paiement des marchés publics;
- vérifier le respect des principes d'équité, de transparence, d'économie et d'efficacité ;
- identifier les cas de passation des marchés non conformes ;
- se prononcer sur l'effectivité et la qualité des travaux réceptionnés et des biens et services livrés ;
- procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées pour les marchés de travaux, fournitures et services de consultants par rapport aux clauses contractuelles de ces marchés afin de vérifier si les fonds ont été utilisés aux fins prévues ;
- examiner le traitement des réclamations, recours, requêtes, demandes d'arbitrages et dénonciations, tout en évaluant les sanctions aussi bien des procédures que des acteurs ;
- Évaluer la pertinence de la mission d'Observateur Indépendant, en vérifiant si les dysfonctionnements relevés ont été correctement rapportés dans leurs rapports ;
- faire une analyse qualitative et quantitative des faiblesses et des points forts du système actuel des marchés publics, sanctionnée par des recommandations en vue de son amélioration.

NB : Au regard des améliorations perceptibles dans la phase passation des marchés et de nombreuses défaillances relevées dans la phase exécution des marchés lors des audits antérieurs, un accent particulier devra être apporté à l'audit de l'exécution des marchés, notamment :

- ***le dispositif de suivi de l'exécution physique et financière mis en place par le Maître d'ouvrage ;***
- ***la pertinence et l'effectivité dudit suivi ;***
- ***le paiement effectif des prestations ;***
- ***la réception et la clôture des contrats ;***
- l. ***les carences observées et les recommandations pour une amélioration du suivi, de l'exécution et du paiement.***

III - CONCLUSIONS SUR :

3.0. LE CADRE REGLEMENTAIRE

Les TDR en leur point “2. Objectifs de la mission”, demandent au Consultant de “faire une analyse qualitative et quantitative des faiblesses et des points forts du système actuel des marchés publics, sanctionnée par des recommandations en vue de son amélioration”. Cette exigence conduit à une cohabitation entre l’audit à proprement parler et l’évaluation du système des marchés publics.

En ce qui concerne la passation, le travail d’audit est donc complété par celui d’évaluation par un outil harmonisé constitué par la MAPS de l’OCDE.

Sous ce rapport, les forces et les faiblesses du système en termes généraux, sont déterminées en se référant au pilier I de la MAPS, en l’occurrence, le cadre législatif, réglementaire et politique de la passation des marchés, notamment son système d’indicateurs et de sous-indicateurs qui, ensemble, procurent les critères nécessaires à une comparaison instantanée du système en vigueur par rapport aux principes énoncés, pour permettre à l’Auditeur-évaluateur de se donner la possibilité de formuler un jugement professionnel sur la passation des marchés. L’exécution, quant à elle, étant appréciée à l’aune de la pertinence du CCAG en vigueur.

Dans un premier temps, il s’est agi de recenser les règlements et les procédures officiels qui régissent la passation et l’exécution des marchés publics pour ensuite évaluer leur positionnement par rapport aux normes internationales.

3.0.1. Textes applicables aux marchés passés par les CTD

Outre la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD le cadre normatif est structuré en fonction de quatre éléments :

a) L’instrument juridique suprême régissant la passation des marchés :

C’est le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

b) Les réglementations et autres instruments de nature plus administrative :

- (i) Décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant création, organisation du MINMAP ;
- (ii) Décret n° 2014/0611/PM du 24 avril 2014 fixant les conditions de recours et d’application des approches à haute intensité de main d’œuvre ;
- (iii) Décret n° 2018/0001/PM du 05 Janvier 2018 portant création d’une plateforme de dématérialisation dans le cadre des Marchés Publics et fixant ses règles d’utilisation ;
- (iv) Décret n° 2018/0002/PM du 05 janvier 2018 fixant les conditions et les modalités de passation des Marchés Publics par voie électronique au Cameroun ;
- (v) Décret n° 2018/0998/PM du 21 Janvier 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d’investissement public ;
- (vi) Arrêté n° 033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers de Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ;

- (vii) *Arrêté n° 38 CAB/PM du 15 mai 2014 mettant en vigueur les Dossiers-Types d'Appels d'Offres pour la passation des marchés publics ;*
- (viii) *Arrêté n° 0101/A/MINMAP/CAB du 02 mai 2018 mettant en vigueur la charte d'utilisation de la plateforme de dématérialisation des Marchés Publics ;*
- (ix) *Arrêté n° 401/A/MINMAP/CAB du 21 Octobre 2019 fixant les seuils de recours à la maîtrise d'œuvre privée et les modalités d'exercice de la maîtrise d'œuvre publique ;*
- (x) *Arrêté n° 402/A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant la nature et les seuils des marchés réservés aux artisans, aux petites et moyennes entreprises, aux organisations communautaires à la base et aux organisations de la société civile et les modalités de leur application ;*
- (xi) *Arrêté n° 403 /A/MINMAP/CAB du 21 octobre 2019 fixant les plafonds des indemnités servies par les Maîtres d'Ouvrages Délégués aux présidents, membres et rapporteurs des commissions de réception, des commissions de suivi et de recette technique ;*
- (xii) *Arrêté n° 413/A/PR/MINMAP du 08 Décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l'Examen des Recours résultant des marchés publics ;*
- (xiii) *Arrêté n° 168/A/MINMAP du 11 Août 2021 fixant les conditions et les modalités de passation et d'exécution des marchés de conception-réalisation ;*
- (xiv) *Arrêté n° 212/A/MINMAP du 28 Septembre 2021 organisant le fonctionnement des structures internes de gestion administrative des marchés publics ;*
- (xv) *Arrêté n° 007/A/MINMAP du 31 Janvier 2022 fixant les modalités de passations et d'exécution des accords-cadres ;*
- (xvi) *Arrêté n° 166/A/MINMAP du 07 juin 2022 fixant les modalités de catégorisation des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics ;*
- (xvii) *Lettre-circulaire n° 0005/LC/MINMAP/CAB du 03 Juillet 2018 précisant les mesures transitoires à observer suite à la signature et à la publication du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;*
- (xviii) *Circulaire n° 00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du code des marchés publics).*

c) Les dispositions relatives à la passation des marchés dans d'autres législations ou réglementations nationales :

- (i) *Loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 fixant le régime général des contrats de partenariat ;*
- (ii) *Décret n° 2008/035 du 23 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat ;*
- (iii) *Décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques.*

d) Les obligations résultant d'accords Internationaux pour garantir l'uniformité et la cohérence des politiques :

Les obligations liées à la passation des marchés publics résultant d'accords internationaux sont clairement prises en compte dans le Code des marchés publics en son article 4(1) qui prévoit la primauté des engagements internationaux sur ses propres dispositions.

Le recensement susvisé des textes applicables aux marchés des CTD, intervenant en décembre 2023, ceux signés à partir de 2022, ne sauraient s'appliquer à la présente revue des marchés passés au cours des exercices 2019, 2020 et 2021.

3.0.2. Positionnement de la réglementation par rapport aux normes internationales et aux objectifs nationaux de développement

Les résultats de l'analyse sont récapitulés dans les tableaux qui suivent :

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
A. Conformité du cadre juridique de la passation des marchés publics aux principes convenus et respect des obligations en vigueur	a) Champ d'application et portée du cadre réglementaire	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il est bien codifié et organisé de façon hiérarchisée et l'ordre de préséance est clairement défini ; 2. Il prend en compte les biens, travaux et services, y compris les services de conseil, pour tous les marchés passés sur des fonds publics ; 3. Les législations, réglementations et politiques en vigueur sont publiées et facilement accessibles au public, sans frais. 	Les PPP, y compris les concessions, sont réglementés à part ;	Tendre vers un code unique de la Commande publique
	b) Méthodes d'acquisition	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les méthodes d'acquisition sont définies sans ambiguïté à un échelon hiérarchique approprié, ainsi que les conditions associées sous lesquelles il est possible de recourir à chacune des méthodes ; 2. Les méthodes d'acquisition prévues incluent des procédures d'acquisition concurrentielles et moins concurrentielles et offrent un éventail approprié de possibilités garantissant le rapport qualité/prix, l'équité, la transparence, la proportionnalité et l'intégrité ; 3. Le fractionnement des marchés destiné à restreindre la concurrence est interdit ; 4. Les normes appropriées pour les procédures concurrentielles sont spécifiées. 		
	c) Règles relatives aux avis et aux délais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cadre juridique fait obligation d'annoncer publiquement les projets de marchés à moins qu'il y ait une restriction expressément justifiée ; 2. La publication des avis d'appel d'offres accorde aux soumissionnaires potentiels un délai suffisant, (en accord avec la méthode, la nature et la complexité de l'acquisition) pour se procurer les documents et répondre à l'annonce. Les délais minimums pour la soumission des offres/propositions sont fixés pour chaque méthode d'acquisition et ces délais sont prolongés lorsqu'il est fait appel à la concurrence internationale ; 3. La publication des appels d'offres ouverts est imposée dans au moins un journal à large diffusion au niveau national ou sur un site Internet officiel unique où sont publiés tous les avis de passation des marchés publics. Cela doit être facilement accessible sans frais et ne doit pas comporter d'autres obstacles (par exemple, des obstacles technologiques) ; 4. Le contenu de la publication fournit suffisamment d'informations pour permettre aux soumissionnaires potentiels de déterminer leur aptitude et leur intérêt à soumettre une offre. 		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
A. Conformité du cadre juridique de la passation des marchés publics aux principes convenus et respect des obligations en vigueur	d) Règles concernant la participation	<ol style="list-style-type: none"> la participation des parties intéressées est équitable, fondée sur la qualification et conforme aux règles relatives à l'éligibilité et aux exclusions ; Il garantit qu'il n'existe aucun obstacle à la participation au marché des acquisitions publiques ; Il précise les critères d'éligibilité et prévoit des exclusions pour les activités criminelles ou de corruption, l'interdiction administrative conformément à la loi subordonnée à une procédure établie ou à l'interdiction des relations commerciales. ; Il établit des règles pour la participation des entreprises détenues par l'État qui promeuvent la concurrence équitable ; Il détaille les procédures qui peuvent être utilisées pour déterminer l'éligibilité d'un soumissionnaire et son aptitude à exécuter un contrat particulier. 	Le fait de restreindre un appel d'offres national aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun peut constituer un obstacle au marché des acquisitions publiques ;	Rattacher plutôt "national" aux moyens de publicité utilisés, les critères d'éligibilité et de qualification étant les mêmes pour tous
	e) Dossiers d'appel d'offres et spécifications techniques	<ol style="list-style-type: none"> Il définit le contenu minimal des dossiers d'appel d'offres et exige que le contenu soit pertinent et suffisamment détaillé pour que les fournisseurs répondent aux conditions requises. ; Il exige le recours à des spécifications neutres citant des normes internationales quand cela est possible et prévoit, si nécessaire, l'utilisation de spécifications fonctionnelles ; Il exige la reconnaissance de normes équivalentes en l'absence de spécifications neutres ; Les soumissionnaires potentiels sont autorisés à demander une clarification du dossier d'appel d'offres, et le maître d'ouvrage doit répondre en temps opportun et communiquer (par écrit) la clarification à tous les soumissionnaires potentiels. 		
	f) Critères d'évaluation et d'attribution	<ol style="list-style-type: none"> Les critères d'évaluation soient objectifs, en rapport avec l'objet du contrat, et soigneusement définis à l'avance dans les dossiers d'appel d'offres de sorte que la décision d'attribution soit prise uniquement sur la base des critères énoncés dans les documents d'appel d'offres ; La qualité est une considération de grande importance dans l'évaluation des propositions relatives aux services de conseil. Des procédures et méthodes claires d'évaluation des capacités techniques doivent être définies ; 	La considération du coût du cycle de vie n'est pas prévue afin de garantir des décisions objectives et rentables ;	Mieux intégrer les préoccupations autres que le prix dans les critères d'évaluation des offres

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
A. Conformité du cadre juridique de la passation des marchés publics aux principes convenus et respect des obligations en vigueur	f) Critères d'évaluation et d'attribution	<ol style="list-style-type: none"> 3. La manière dont les critères d'évaluation sont combinés et ont leur importance relative déterminée doit être clairement définie dans les dossiers d'appel d'offres ; 4. Pendant l'évaluation, les informations y afférentes ne sont pas divulguées. 		
	g) Soumission, réception et ouverture des offres	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouverture des offres selon une procédure définie et réglementée immédiatement après la date limite pour la soumission des offres ; 2. Des registres des séances d'ouverture des offres sont conservés et peuvent être consultés ; 3. La sécurité et la confidentialité des offres sont maintenues avant l'ouverture des offres et jusqu'après l'adjudication des contrats ; 4. La divulgation d'informations sensibles spécifiques est interdite conformément aux dispositions prévues ; 5. Le mode soumission et de réception des offres par le maître d'ouvrage est bien défini afin d'éviter le rejet inutile des offres. 		
	h) Droit de contester et de formuler un recours	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les participants aux procédures de passation des marchés ont le droit de contester les décisions ou actions prises par le maître d'ouvrage ; 2. Des dispositions permettent de répondre à une contestation à travers une révision administrative par un autre organe indépendant du maître d'ouvrage qui a le pouvoir de suspendre la décision d'attribution, d'accorder des réparations et d'instaurer le droit à une révision judiciaire ; 3. Des règles établissent les questions qui peuvent faire l'objet d'une révision/examen. 4. Des règles fixent les délais pour soumettre les contestations et recours et pour que l'institution chargée de la révision et l'organe d'appel indépendant rendent leurs décisions ; 5. Les décisions prises par l'organe d'appel indépendant peuvent faire l'objet d'un examen à un niveau supérieur (examen judiciaire). 	Les recours et les décisions ne sont pas publiés en des lieux facilement accessibles et dans les délais précisés conformément à la législation protégeant les informations sensibles	Publier systématiquement les recours et les décisions y afférentes dans le JDM (dispositions prises en 2020 par arrêté n° 413/A/PR/MINMAP du 08/12/20 portant organisation et fonctionnement du CER, en son article 19)

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
A. Conformité du cadre juridique de la passation des marchés publics aux principes convenus et respect des obligations en vigueur	i) Gestion des contrats	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les fonctions pour prendre en charge la gestion du contrat sont définies et les responsabilités sont clairement attribuées ; 2. Les conditions des amendements au contrat sont définies, garantissent la maîtrise des dépenses et ne limitent pas arbitrairement la concurrence ; 3. Il existe des processus efficaces et équitables pour résoudre les litiges rapidement pendant l'exécution du 4. Contrat ; 5. La décision finale issue d'un processus de règlement des conflits est exécutoire. 6. Pendant l'évaluation, les informations y afférentes ne sont pas divulguées. 		
	j) Passation électronique des marchés publics	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cadre juridique autorise ou impose des solutions d'acquisition électronique couvrant entièrement ou partiellement le cycle de passation des marchés publics ; 2. Le cadre juridique garantit l'utilisation d'outils et de normes qui permettent l'accès libre et complet au système, en tenant compte de la confidentialité, de la sécurité des données et de l'authentification ; 3. Le cadre juridique exige d'indiquer aux parties intéressées quelles phases des processus seront gérées électroniquement. 		
	k) Normes concernant la tenue en lieu sûr des archives, documents et données électroniques	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'établissement d'une liste complète des archives et documents de la passation des marchés relatifs aux transactions, y compris la gestion des contrats. Elle doit être maintenue au niveau opérationnel. 2. Il existe une politique de rétention des documents qui est compatible avec les règles de prescription en vigueur dans le pays en cas d'enquête et de poursuites pour fraude et corruption, ainsi qu'avec les cycles d'audit ; 3. Il existe des protocoles de sécurité établis pour assurer la protection des archives (matérielles et/ou électroniques). 	La gestion des archives n'indique pas ce qui est à la disposition du public aux fins de consultation, y compris les conditions d'accès.	Intégrer la possibilité pour le public de consulter les archives tenues à l'ARMP
	l) Principes de passation des marchés publics dans la législation spécialisée	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les principes et/ou les législations relatifs à la passation des marchés publics s'appliquent à la sélection et à la passation des contrats de Partenariats public-privé (PPP), y compris les concessions, le cas échéant. 2. Les responsabilités pour l'élaboration de politiques PPP, y compris des concessions, et pour soutenir leur mise en œuvre sont clairement attribuées. 	Le cadre juridique ne s'applique pas aux entités opérant dans des secteurs particuliers (PPP)	Tendre vers un code unique de la Commande publique

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
B. Disponibilité et qualité de la réglementation et d'outils d'application	a) Réglementation d'application prévoyant les processus et les procédures	1. La responsabilité relative à l'actualisation des réglementations est clairement déterminée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il existe des réglementations complétant et précisant les dispositions du décret portant Code des marchés publics et qui sont contraires à ce dernier ; 2. Les réglementations ne pas complètes et unifiées sous la forme d'un ensemble de réglementations facilement disponible dans un lieu unique et accessible. 3. Les réglementations ne sont pas régulièrement actualisées. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mettre à jour les CCAG (EXECUTION) qui datent de 2007, et les DTAO mis en vigueur en 2014, voire le Dossier-type de demande de cotation, alors que le Code date de 2018 ; 2. Elaborer un document unique contenant tous les textes d'application du CMP ; 3. Mettre à jour les réglementations et les outils de soutien.
	b) Modèles de dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition de biens, travaux et services	1. Au minimum, il doit exister un ensemble de dispositions et de modèles types et obligatoires qui reflètent le cadre juridique. Ces dispositions peuvent être utilisées dans les dossiers préparés pour les appels d'offres ou les procédures concurrentielles.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les modèles de DAO mis à la disposition des intervenants du système datent de 2014 (le nouveau CMP est de 2018) ; 2. Des manuels de procédures ne sont pas mis à la disposition des intervenants 	L'ARMP (élaboration) et le MINMAP (mise en vigueur) doivent s'accorder pour diffuser des réglementations d'application et des outils de soutien à jour.
	c) Conditions contractuelles types	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il existe des conditions contractuelles types pour les formes de contrats les plus courants et leur utilisation est obligatoire. 2. Le contenu des conditions contractuelles types est généralement conforme aux pratiques admises au plan international. 3. Les conditions contractuelles types font partie intégrante des DAO et sont à la disposition des intervenants. 		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
B. Disponibilité et qualité de la réglementation et d'outils d'application	d) Guide ou manuel de l'utilisateur pour la passation des marchés	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il existe un (des) manuel(s) de passation des marchés complet(s) qui énonce (nt) toutes les procédures pour la mise en œuvre correcte des réglementations et lois relatives à la passation des marchés. 2. La responsabilité de la tenue du manuel est clairement définie et le manuel est actualisé régulièrement. 		
	b) Modèles de dossiers d'appel d'offres pour l'acquisition de biens, travaux et services	<ol style="list-style-type: none"> 2. Au minimum, il doit exister un ensemble de dispositions et de modèles types et obligatoires qui reflètent le cadre juridique. Ces dispositions peuvent être utilisées dans les dossiers préparés pour les appels d'offres ou les procédures concurrentielles. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Des modèles de dossiers d'appel d'offres mis à la disposition des intervenants du système datent de 2014 alors qu'un nouveau Code de marchés publics existe depuis 2018 ; 4. Des manuels de procédures ne sont pas mis à la disposition des intervenants 	L'ARMP qui est chargée de l'élaboration et le MINMAP, de la mise en vigueur doivent s'accorder pour mettre à la disposition du système des réglementation d'application et des outils de soutien mis à jour régulièrement.
	c) Conditions contractuelles types	<ol style="list-style-type: none"> 4. Il existe des conditions contractuelles types pour les formes de contrats les plus courants et leur utilisation est obligatoire. 5. Le contenu des conditions contractuelles types est généralement conforme aux pratiques admises au plan international. 6. Les conditions contractuelles types font partie intégrante des DAO et sont à la disposition des intervenants. 		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	Indicateur	Point fort	Point faible	Recommandation
C. Développement durable et mise en œuvre des obligations internationales	a) Achats publics durables	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cadre législatif et réglementaire comprend des dispositions relatives à l'insertion de critères de durabilité dans la passation des marchés publics ; 2. Le cadre législatif et réglementaire permet d'intégrer des critères de durabilité (c'est-à-dire des critères économiques, environnementaux et sociaux) dans la passation des marchés publics ; 3. Les dispositions juridiques requièrent une application équilibrée des critères de durabilité pour garantir le rapport qualité/prix. 	Le Cameroun n'a pas encore adopté une politique et un plan de réalisation pour mettre en œuvre les Achats Publics Durables (APD) à l'appui des objectifs politiques nationaux ;	S'engager résolument dans une démarche vers l'achat public durable en droite ligne de la SND30 (transformation structurelle et développement inclusif).
	b) Obligations résultant d'accords internationaux	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les obligations liées à la passation des marchés publics résultant d'accords exécutoires internationaux contraignants sont : (a) clairement définies ; (b) systématiquement transcrites dans les lois et réglementations et reflétées dans les politiques relatives à la passation des marchés. 	<p>En son article 4, le Code des marchés publics prévoit :</p> <p>(1) Ses propres dispositions ne s'appliquent aux marchés conclus dans le cadre des conventions internationales ou de financement qui sont signés par l'Etat avec les partenaires techniques et financiers qu'en ses dispositions non contraires auxdites conventions.</p> <p>(2) Pour les marchés financés sur fonds d'aide extérieure, bilatérale ou multilatérale, les dispositions des accords de financement précisent, le cas échéant, les règles applicables.</p>	

En somme, les évolutions et les innovations contenues dans le décret n° 2018/366 du 18 juin 2018 portant Code des marchés publics, vont résolument dans le sens d'améliorer l'efficacité de la passation des marchés publics.

Cependant, à l'aune des standards internationaux, et au regard de certains objectifs nationaux de développement, notamment la SND30, il conviendrait d'examiner la possibilité de :

- (i) tendre vers un Code de la Commande publique ;*
- (ii) rattacher la nationalité d'un appel d'offres uniquement à celle des organes de publication ;*
- (iii) intégrer les préoccupations liées au cycle de vie dans l'analyse des offres ;*
- (iv) ouvrir les archives de l'ARMP au public ;*
- (v) élaborer l'ensemble des outils de soutien et les mettre à jour régulièrement, ainsi que la réglementation d'application, notamment les clauses administratives générales des marchés ;*
- (vi) rendre aisée la maîtrise de la réglementation d'application par l'élaboration et la mise à la disposition du public d'un document unique intégrant l'ensemble des textes y afférents ;*
- (vii) s'engager résolument sur la voie d'un achat public durable, dans le droit fil des objectifs de la SND30, "pour la transformation structurelle et le développement inclusif".*

3.0.3. Réglementation des marchés publics et loi portant Code Général des CTD

Un déphasage existe entre la législation sur la décentralisation (loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des CTD) et la réglementation des marchés publics, en ce qui concerne, notamment, la nomenclature des commissions de passation des marchés ainsi que celle des maîtres d'ouvrage, l'externalisation de certains services, la prise en compte des spécificités de l'entreprise publique communale, la maturation des projets locaux, et l'autorisation de certaines procédures dérogatoires.

1. Force est de constater que, la nomenclature des maîtres d'ouvrage retenue par la réglementation des marchés publics n'est pas en adéquation avec le cadre organique prévu par la législation sur les CTD. En effet, suivant cette législation, les gestionnaires et ordonnateurs des crédits locaux peuvent valablement être :
 - les maires ;
 - les présidents de conseils régionaux ;
 - les présidents de syndicats de communes ;
 - les directeurs généraux d'établissements publics communaux ;
 - les directeurs généraux d'entreprises publiques communales.

Sous ce rapport, ces responsables auraient dû bénéficier d'une commission de passation des marchés.

2. Le CMP assimile les délégations de services publics aux marchés de services non-quantifiables, alors que la loi sur la décentralisation prévoit l'externalisation de ces services au moyen de la concession, de l'affermage de la régie intéressée ou de la gérance.
3. Le décret n° 2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ne prend pas en compte les spécificités des entreprises publiques locales (entreprises publiques créées par une commune). En conséquence, ce texte leur est difficilement applicable.
4. La maturation des projets des autres maitres d'ouvrage donne lieu à la création de commissions internes de maturation, mais celle des projets des CTD se fait au moyen d'une conférence régionale de maturation, qui ne présage pas d'une maturation rigoureuse et méthodique.
5. La forte centralisation de la procédure de régie au niveau du Premier Ministre et du MINMAP, ne permet pas aux CTD de tirer le plus grand profit de cette procédure dérogatoire, notamment en termes de réactivité et de célérité.

3.1. LES CONTRATS AUDITES

3.1.0. Liste des marchés à auditer

Suivant l'extrait de la Banque des données de l'ARMP qui a été remis à l'Auditeur, la population statistique s'élève à 10.882 marchés par les CTD durant les exercices 2019, 2020, et 2021. L'échantillon arrêté pour servir de base à l'audit est constitué de 599 marchés présentant les caractéristiques suivantes :

Tableau 1 : Distribution des marchés suivant le mode de passation du marché

	Nombre		Valeur	
AOIO	4	1%	2 301 824 096	2%
AONO	282	47%	83 091 255 753	70%
AONR	22	4%	8 630 962 286	7%
GG	283	47%	23 407 120 897	20%
DC	8	1%	1 227 975 255	1%
	599	100%	118 659 138 287	100%

Figure 1 : Distribution en nombre de l'échantillon suivant le mode de passation du marché

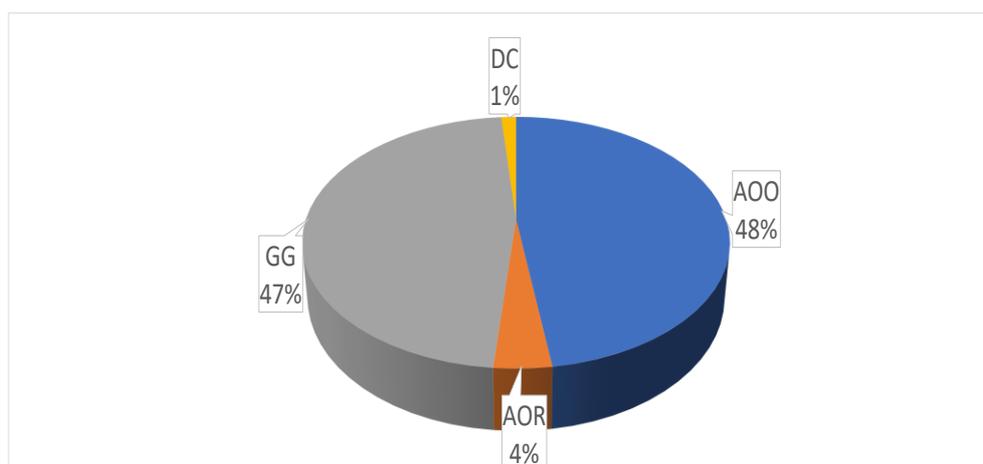


Figure 2 : Distribution en valeur de l'échantillon suivant le mode de passation du marché

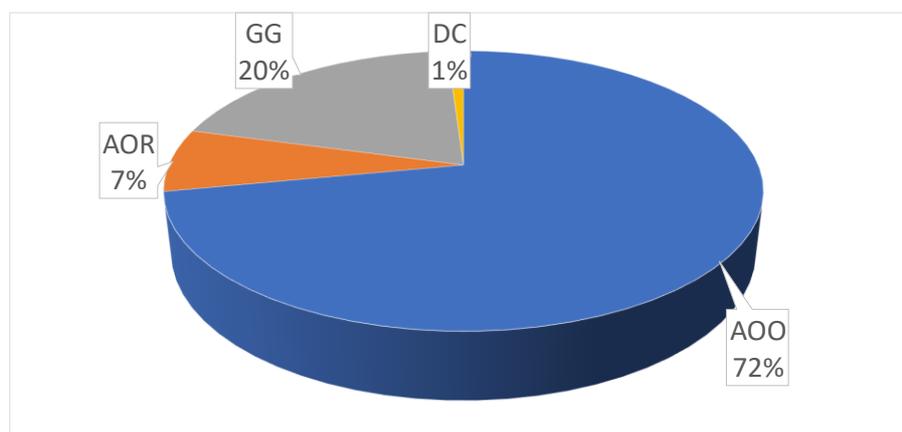


Tableau 2 : Distribution de l'échantillon par nature de prestations

	Nombre		Valeur	
TRAV	480	80%	84 966 613 785	72%
AG	74	12%	25 039 251 851	21%
SPI	45	8%	8 653 272 651	7%
	599	100%	118 659 138 287	100%

Figure 3 : Distribution en nombre de l'échantillon par nature de prestations


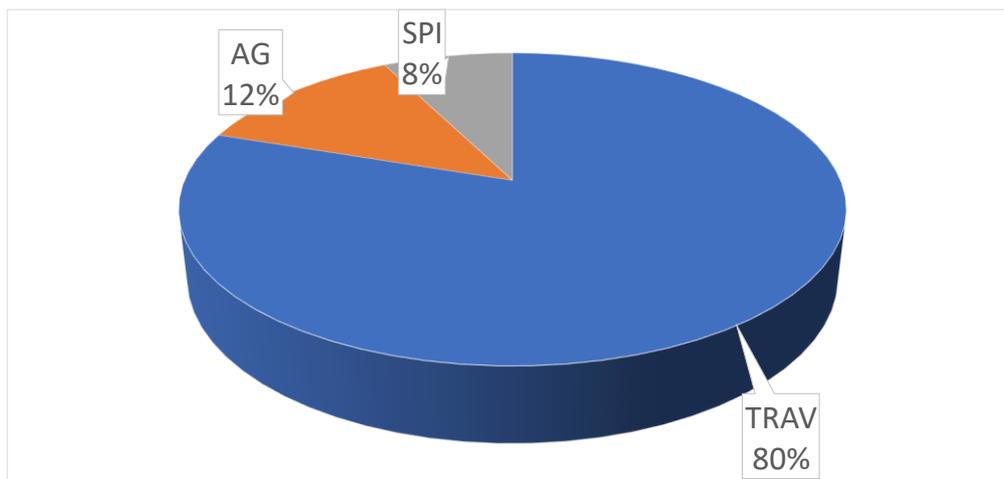


Figure 4 : : Distribution en valeur de l'échantillon par nature de prestations

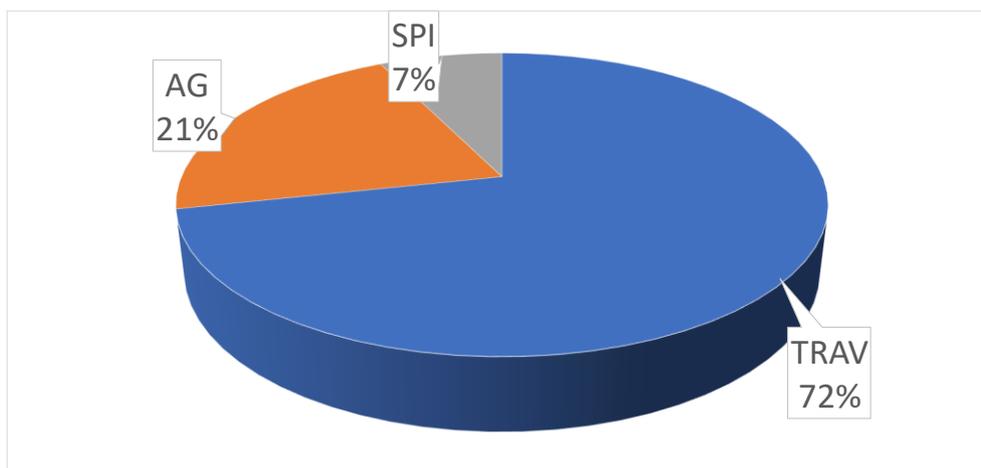

Conformément aux termes de référence, l'équipe d'audit a procédé à un examen exhaustif des différentes phases liées à la passation, à l'exécution et au paiement des marchés publics. Cette analyse s'est conformée au décret réglementant les marchés publics, ainsi qu'aux spécifications des dossiers d'appel d'offres. Les points de contrôle établis ont englobé :

- L'examen du niveau de prise en compte des préliminaires, notamment, l'étude préalable et la programmation de la passation et de l'exécution.
- La vérification des dossiers d'appel d'offres, des formalités de publicité, de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres, et le contrôle des marchés, de l'approbation à la notification des marchés.
- L'évaluation de la pertinence des missions des Observateurs Indépendants (OI) , avec une vérification minutieuse pour s'assurer que les anomalies constatées ont été correctement rapportées dans leurs rapports.
- L'analyse de l'exécution des marchés, mettant l'accent sur les preuves documentaires et les transactions financières liées.
- La vérification du respect des principes d'équité, de transparence, d'économie et d'efficacité tout au long des phases des marchés publics.
- L'évaluation de la capacité de l'ARMP et des autres Acteurs à classer et archiver convenablement les documents relatifs à la passation, à l'exécution et au paiement des marchés publics.
- L'examen du traitement des réclamations, recours, requêtes, demandes d'arbitrages et dénonciations, tout en évaluant les sanctions aussi bien des procédures que des acteurs.

Bien que la mise en œuvre de ces diligences reste tributaire de la disponibilité de l'ensemble des documents attendus, un certain nombre de constatations se dégagent néanmoins des éléments déjà exploités.

3.1.1. Collecte, archivage et banque des données

A) Etat détaillé des documents disponibles à la banque des données

Au démarrage de sa mission, l'Auditeur a reçu un état mentionnant le nombre de documents disponibles, en lieu et place d'un état détaillé des documents disponibles pour chaque marché.

En se référant à cet extrait de la banque des données, les 599 marchés de l'échantillon consolidé ont donné lieu à la collecte de 5 591 documents de la phase passation, et 347 de la phase exécution : soit en moyenne, respectivement, 9 et 1 document.

Il appert de l'examen des fiches de collecte de l'ARMP que les documents collectés sont répartis en deux catégories : essentiels et subsidiaires.

Etant donné qu'outre la phase de procédure, le nombre de documents à collecter dépend non seulement du mode de passation d'un marché, mais également de la nature de la prestation, des moyennes pondérées (par rapport à la structure de l'échantillon) ont été déterminées à partir des données des fiches de collecte, en tenant compte de la marginalité des procédures relevant des CCCM dans l'échantillon.

Tableau 3 : Détermination des moyennes pondérées des documents à collecter par marché


	Documents essentiels		Essentiels et subsidiaires	
	Passation	Exécution	Passation	Exécution
AOIO	18	12	29	28
AONO	18	12	29	28
AONR	26	9	37	24
GG	17	12	36	28
DC	12	12	24	28
Moyenne pondérée	18	12	33	28

En se référant à l'extrait de la banque de données qui a été communiqué à l'Auditeur, les taux moyens de documents collectés par marché de l'échantillon sont :

- En phase passation, de 9/18 (**50%**), pour les documents essentiels, et de 9/33 (**27%**), si l'on considère aussi bien les documents essentiels que subsidiaires ;
- En phase exécution, de 1/12 (**8%**), pour les documents essentiels, et 1/28 (**4%**), pour les documents essentiels et subsidiaires.

Quant aux taux moyens de documents communiqués à l'Auditeur et qui se rapportent à 212 marchés sur les 599 que comprend l'échantillon, soit 35% de l'effectif, il baisse de deux-tiers pour se situer à 3 pour la passation, mais reste stable à 1 pour l'exécution, en considérant uniquement les documents essentiels.

Figure 5 : Nombre moyen de documents par marché rapporté aux objectifs de collecte

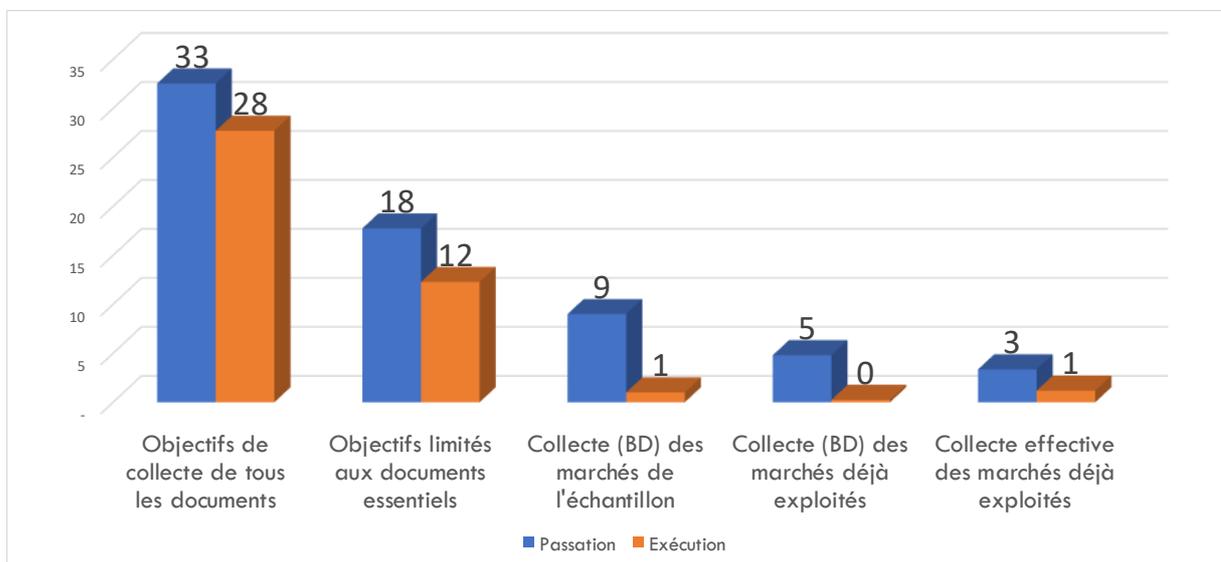

Alors que l'analyse des données révèle que les taux de disponibilité des marchés déjà communiqués à l'auditeur devraient être de 5 pour la passation et moins de 1 pour l'exécution, ils se situent plutôt à 3 et 1, respectivement.

En d'autres termes, des difficultés existent pour collecter les documents, mais aussi pour

accéder à ceux qui sont déjà conservés aux archives.

B) Etat détaillé des documents manquants dès le démarrage de l'audit

La liste détaillée des documents manquants au début de la mission, établie par l'ARMP est présentée en annexe.

C) Collecte complémentaire auprès des MO

Au terme des missions de rattrapage de la collecte qui ont été organisées par l'ARMP, la liste exhaustive et finale des documents obtenus auprès des Maîtres d'ouvrage pour compléter les documents manquants à la banque des données de l'ARMP, est présentée en annexe.

D) Documents manquants au terme de la collecte de rattrapage

Cette liste à produire par l'ARMP, découle de la situation de la banque des données avant et après la mission de rattrapage de la collecte auprès des maîtres d'ouvrage

E) De la liste des documents à collecter

L'exploitation des documents collectés révèle certaines omissions dans la liste des documents à collecter, voire une absence de conformité de certaines attentes par rapport au cadre normatif en vigueur.

A titre d'illustration, le CMP prévoit systématiquement qu'une note de présentation signée du Maître d'ouvrage, fasse partie de la liasse à transmettre à la Commission pour toutes les étapes de procédure, mise à part l'ouverture des plis : ce document n'est prévu ni dans aucune des listes de documents à collecter, ni ceux définis comme essentiels, ni ceux dits subsidiaires. Et ce, nonobstant le fait que l'élaboration de cette pièce qui incombe à la SIGAMP, constitue un des éléments d'évaluation de cette dernière. Sans compter les rapports devant être produits par chaque SIGAMP.

On pourrait également relever les pièces attestant de la disponibilité du financement ou de l'inscription budgétaire exigées pour l'adoption d'un DAO qui ne sont pas prises en compte, alors que certaines CTD, transmettent des autorisations de dépense à l'ARMP.

Par ailleurs, prévoir la collecte d'un décompte provisoire, voire final approuvés par le MINMAP, alourdit les objectifs de la collecte, étant donné que le MINMAP n'intervient qu'au niveau du décompte définitif.

Sous ce rapport, l'Auditeur recommande une mise à jour de la liste des documents à collecter s'impose Et à toutes fins utiles, il formulera une proposition concrète dans son rapport final.

3.1.2. Exploitation des documents communiqués à l'Auditeur


L'Auditeur a déjà pris connaissance de 212 marchés sur les 599 qui constituent l'échantillon à auditer, soit 35% de l'effectif. La répartition du nombre de documents communiqués à l'Auditeur par marché et suivant la phase de la procédure est présentée dans le tableau et le

graphique qui suivent.

Tableau 4 : Distribution du nombre de documents communiqués à l’Auditeur par marché

Nombre de documents	0	[1,5[[5,10[[10,15[[15,18[Ensemble
Passation (nombre de marchés)	111	33	37	28	3	212
Exécution (nombre de marchés)	131	65	14	2	-	212

Figure 6 : Distribution du nombre de documents communiqués à l’Auditeur par marché

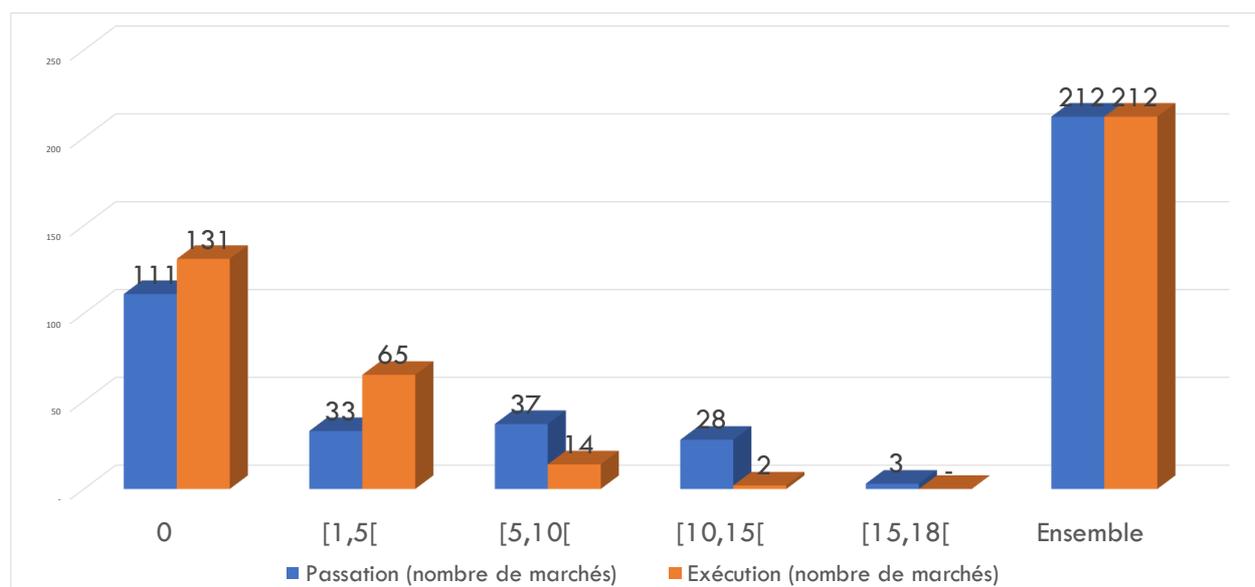

Il apparaît ainsi que le mode de la distribution susvisée est ‘0’, avec au moins la moitié des marchés communiqués à l’Auditeur sans aucune pièce se rapportant à ce marché, ou alors sans aucun document, soit de sa passation, soit de son exécution.

L’exploitation de ces documents, en quantité insuffisante pour se prononcer sur les procédures a néanmoins permis de déceler un certain nombre de dysfonctionnements et de mauvaises pratiques.

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

	2019	2020	2021	Observations
Archivage et banque des données				
1	✓	✓	✓	A revisiter et à mettre à jour (omissions et incohérences)
2	✓	✓	✓	Correction d'erreurs / Numérisation des rapports d'activités
3	✓	✓	✓	Application de sanctions aux MO concernés
Préliminaires				
4	✓	✓	✓	- SIGAMP à opérationnaliser - Renforcement des capacités (CIPM / SIGAMP) (sur les enjeux et objectifs de la programmation)
DAO				
5	✓	✓	✓	DTAO et DTDC à mettre à jour et à vulgariser
6	✓			Régulation ?
7	✓	✓		Régulation ?
Registre des offres				
8	✓	✓		Régulation ?
9		✓	✓	Régulation ?
Entraves à une saine concurrence				
10	✓	✓	✓	Réguler à l'ouverture des plis
11	✓	✓	✓	Réguler lors des journées de programmation
12		✓	✓	Réguler aux Journées de programmation
13	✓	✓	✓	Mesures à prendre par le MO
Marchés de gré à gré				
14	✓	✓	✓	Appliquer les sanctions
15	✓	✓	✓	Appliquer les sanctions
16		✓	✓	Régulation ?
Conflit de compétence				
17			✓	Régulation ?
Exécution				
18		✓	✓	Régulation ?

A) A propos de la qualité des documents

Dans l'ensemble, les documents physiques remis à l'Auditeur sont en bon état de conservation et de lisibilité. Cependant certains qui ont été numérisés posent un problème de lisibilité et ne correspondent pas au marché concerné.

La principale difficulté découle de ce que les documents sont transmis par vagues successives, ce qui obère une bonne organisation de leur exploitation, et donc du déroulement de la mission.

B) A propos de la conformité des procédures

Dans l'ensemble, les documents répondent aux prescriptions réglementaires. Plusieurs cas de dysfonctionnements et de mauvaises pratiques ont été relevés, néanmoins :

- La non-conformité des DAO aux DTAO, dans la mesure où ces derniers datent de 2014, bien avant le CMP, et leur défaut de mise à jour pour conséquence principale le fait que chaque CIPM adapte les différentes pièces du DAO.
- L'utilisation non-conforme du registre des offres qui se traduit notamment par l'absence de l'offre de l'attributaire dans ce registre, et le fait d'utiliser tout un feuillet pour chaque soumissionnaire.

Quant au registre des lettres-commandes qui est visé dans les TDR, il n'est plus utilisé, et ses extraits, encore moins collectés.

- Des procès-verbaux d'ouverture des plis rédigés sur feuilles volantes ou mentionnant tout juste la composition de la sous-commission d'analyse.
- Des cas d'exécution de travaux avant signature du marché, voire de réception provisoire avant notification de l'OSD.

C) A propos de l'efficacité du système

1. Les marchés non-programmés

L'exploitation de la banque des données de l'ARMP révèle les données suivantes sur les marchés non-programmés :

En 2019, 67 marchés sur un total de 154 ;

En 2020, 67 marchés sur 145 ;

En 2021, 153 sur 300.

En valeur relative, les cas de marchés non-programmés sont croissants durant la période sous revue : ils passent de 44% en 2019 à 46% en 2020, et à 53% en 2021.

Plus de la moitié des marchés qui n'ont pas été planifiés pour leur passation et leur exécution, ne va nullement dans le sens de l'efficacité du système, encore moins de son efficience.

En effet, une absence ou un défaut de mise à jour de la programmation couplés à son manque de suivi, ne permettent pas au système d'atteindre les objectifs visés par la

planification de la passation et de l'exécution des marchés, en particulier, **(i)** l'amélioration de la capacité d'exécution des budgets **(ii)** la diminution du coût des projets **(iii)** la réduction du coût de fonctionnement du système des marchés publics **(iv)** l'optimisation de la gestion de la trésorerie, et **(v)** l'assèchement de certains gisements de mauvaises pratiques.

2. Le ratio des procédures exceptionnelles

Les marchés passés par la procédure du gré à gré représentent :

- **47% en nombre** des marchés de l'échantillon, soit 283 marchés sur les 599 que comprend l'échantillon ;
- **20% en valeur**, soit 23.407.120.897 F CFA TTC sur 118 659 138 287.

A cet égard, il convient de relever qu'un nombre de procédures exceptionnelles qui correspond à près de la moitié de l'ensemble des procédures, constitue un point rouge pour le système, car, elles ne devraient pas excéder 10%.

3. La proportion de la fraude

Les éléments mis à la disposition de l'Auditeur jusqu'à présent, n'ont pas permis de relever des cas de fraude.

4. La proportion des résiliations

La banque des données de l'ARMP révèle une absence de déperdition de procédure consécutive à une résiliation de marché, en 2019 et 2020. En revanche sur les 300 marchés à auditer au titre de l'exercice 2021, 3 cas sont signalés, soit 1%, qui est un niveau acceptable.

5. La proportion des chantiers abandonnés

Les éléments mis à la disposition de l'Auditeur jusqu'à présent, n'ont pas permis de relever des cas de fraude.

6. La proportion des acteurs sanctionnés

Suivant la banque des données de l'ARMP, aucun acteur n'a été sanctionné durant la période sous revue, relativement aux 599 marchés de l'échantillon. Ceci constitue une source de préoccupation au regard des dysfonctionnements et mauvaises pratiques détectés.

7. Le niveau de consommation budgétaire

Cette partie de l'analyse de l'efficacité ne sera possible qu'au terme de l'exploitation des documents se rapportant au règlement des prestations des marchés de l'échantillon.

D) Effectivité et qualité des prestations réceptionnées

Le Maître d'ouvrage n'ayant pas encore pris les dispositions en vue de la réalisation de ce volet de la mission qui se déroulera sur le terrain, il n'est pas possible de rendre un avis professionnel sur l'effectivité et la qualité.

E) Recours, arbitrages, dénonciations et sanctions des procédures

Les TDR demandent à l'Auditeur d'examiner le traitement des réclamations, recours, requêtes, demandes d'arbitrages et dénonciations, tout en évaluant les sanctions aussi bien des procédures que des acteurs.

Seul un état de 132 recours de la période allant du 11 mai 2021 au 30 décembre 2021 a été transmis à l'Auditeur.

Outre les informations sur le MO, le recourant, l'objet du recours, sa date de dépôt, les renseignements sur le recourant, la référence de l'AAO, l'objet du marché, et l'attributaire, ce fichier présente l'état de traitement du recours en trois déclinaisons :

- En attente de la décision de l'Autorité chargée des marchés publics ;
- En cours d'instruction chez un rapporteur,
- Instruction achevée : consulter le JDM.

Visiblement, cet état ne contient pas le minimum d'informations nécessaires pour rendre un avis sur le traitement d'un recours, si l'on se réfère à l'arrêté n° 413/A/PR/MINMAP du 08 décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l'Examen des Recours résultant des marchés publics'. En effet, ce texte prévoit, notamment, en ses articles :

- (i) 11(1), que dès réception d'un recours, le Président du Comité le transmet à l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à la diligence du Coordonnateur du Secrétariat Technique dans un délai de 24 heures.
- (ii) 11(3), que l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics dispose d'un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa saisine pour émettre son avis technique au Comité. Cet avis technique doit ressortir les éléments de recevabilité et le cas échéant, le caractère fondé ou non du recours. Il ne lie pas le Comité.
- (iii) 16, que le Comité dispose d'un délai maximum de sept (07) jours calendaires, à compter de la réception de l'avis technique de l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour formuler sa proposition à l'Autorité chargée des Marchés Publics.
- (iv) 17, que l'Autorité chargée des Marchés Publics dispose d'un délai de sept (07) jours calendaires pour notifier sa décision au recourant, avec copie au Maitre d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission des marchés concerné au Comité et à l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.
- (v) 18(1), lorsque l'Autorité chargée des Marchés Publics n'approuve pas une proposition formulée par le Comité, elle lui retourne le dossier dans un délai de cinq (5) jours calendaires pour réexamen, assorti de ses observations.
- (vi) 18(2), que le Comité réexamine le dossier et lui formule à nouveau sa proposition dans un délai de cinq (5) jours calendaires.

F) Pertinence de la mission d'Observateur Indépendant

L'Auditeur a reçu 31 rapports d'OI, qui ne concernent pas les marchés de l'échantillon. Dans ces conditions, il n'a pas moyen de vérifier si les dysfonctionnements relevés ont été signalés dans les rapports d'OI.

Quoi qu'il en soit, il appert des documents de procédure déjà exploités que le contrôle a priori des procédures par l'OI est inexistant du fait de l'absence de ce dernier, sans que l'Auditeur puisse se prononcer sur les raisons qui président à cette absence : défaillance de l'OI ou refus de la CIPM de le convoquer ?

G) Défaillances persistantes au niveau de l'exécution (audit précédent)

Lors du précédent audit portant sur les marchés de 2013, l'Auditeur AUDITEC-FOIRIER avait formulé trois (3) recommandations spécifiques sur l'exécution :

- (i) La nécessité du paiement à temps des décomptes des travaux en cours d'exécution ;
- (ii) La nécessité de notifier à temps les OSD ;
- (iii) L'application effective des pénalités de retard.

Au regard de l'indisponibilité des documents relatifs au paiement des prestations et à l'application des pénalités de retard, il n'est pas encore possible à l'Auditeur de se prononcer sur les deux recommandations y afférentes.

En revanche, concernant le délai de notification de l'OSD, la tendance générale est à son respect, même si l'on déplore un cas où cette notification est intervenue après la réception provisoire des travaux.

3.2. LE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DE MARCHES

La mission a évalué le processus global de passation des marchés afin d'identifier des lacunes et de formuler des recommandations en vue d'améliorer l'efficacité et la transparence. Le système repose sur deux décrets régissant les marchés publics. Pour les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), c'est le Décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics qui s'applique. L'exécution est régie par les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Le système se compose de six volets :

- (i) Conduite de la passation et planification par le MO ou le MOD.
- (ii) Contrôle des procédures par les CCCM et l'Observateur Indépendant.
- (iii) Contrôle de l'exécution par le MO ou le MOD, le Ministère, l'auditeur indépendant, et les organes de contrôle de l'État.
- (iv) Régulation opérationnelle par l'ARMP, couvrant la gestion des recours, la conservation des documents et le traitement des plaintes.
- (v) Régulation stratégique par le MINMAP et le Premier Ministre.
- (vi) Règlement des prestations à deux niveaux : national (Trésor Public, Fonds Routier, budgets autonomes) et international (CAA).

Les constatations suivantes ont été relevées à la suite de cette démarche d'audit.

3.2.1. VERIFICATION DU NIVEAU DE MATURETE DES PROJETS

L'absence de collecte du visa de maturité des projets prévu par le décret n° 2018/0998/PM du 21 janvier 2018 fixant les règles régissant le processus de maturation des projets d'investissement public, crée une lacune cruciale dans l'appréciation du degré de maturation des projets. De plus, l'absence d'éléments confirmant la mise à jour de la programmation, conformément à l'article 59(5) du Code des marchés publics, entrave une vision exhaustive.

3.2.2. CONTROLE A PRIORI PAR L'OBSERVATEUR INDEPENDANT

Un nombre considérable de projets relevant de la compétence de l'Observateur Indépendant ne sont pas couverts par celui-ci, suscitant des interrogations sur les causes possibles de ce dysfonctionnement, qu'il s'agisse d'un défaut de convocation par la Commission ou d'une défaillance de l'OI.

3.2.3. CONTROLE DE L'EXECUTION - LIMITATION DES DOCUMENTS DISPONIBLES

Le nombre limité de documents de la phase d'exécution, en particulier l'ordre de service de démarrage, retarde une évaluation complète du contrôle interne et externe de l'exécution des marchés.

3.3. LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE PASSATION DES MARCHES

À ce stade, la mission d'audit a évalué les instances impliquées dans la passation des marchés, en offrant des recommandations visant à optimiser leur fonctionnement. Pour la conduite des opérations, le MO ou le MOD bénéficie de l'appui de deux structures, à savoir :

- La structure interne de gestion administrative des marchés publics (SIGAMP) qui vise à optimiser ses attributions. Cette structure centralise tous les documents générés au cours de la passation et de l'exécution des marchés publics, facilitant ainsi les audits internes ou externes. Etant donné que l'arrêté n° 212/A/MINMAP du 28 septembre 2021 régissant le fonctionnement des SIGAMP intervient pratiquement à la fin de la période sous revue, les situations ex-ante, et ex-post, seront comparées, en termes de leur performance au stade de la maturation, de la passation et de l'exécution des projets, notamment les livrables prévus par le CMP en son article 8.
- La commission de passation des marchés, organe d'appui technique pour la passation des marchés publics. À la clôture de chaque séance, le Président de la commission transmet, dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures, à l'ARMP l'ensemble de la documentation relative aux dossiers traités, en vue de leur exploitation et archivage. L'évaluation des offres repose sur une sous-commission d'analyse composée d'experts agréés par l'ARMP pour leurs compétences et leur expérience dans le domaine de la consultation.
Son évaluation nécessite des données relativement au respect des préalables à la passation d'un marché, à la convocation systématique de l'OI pour tout projet relevant de la compétence de ce dernier, aux délais de procédure, à leur contribution au respect des principes fondateurs du Code des marchés publics, à l'instar du nombre de séances requises pour adopter un dossier.

Les constatations suivantes ont été relevées à la suite de cette démarche d'audit.

L'analyse des documents déjà exploités met en lumière le fait que certaines commissions de passation des marchés ne s'acquittent pas efficacement de leur rôle en tant qu'organe d'appui technique du maître d'ouvrage dans le processus de passation des marchés. Plus précisément, ces lacunes se manifestent de la manière suivante :

Tout d'abord, des dossiers de consultation des entreprises non conformes à la réglementation sont adoptés, compromettant ainsi l'intégrité du processus de passation des marchés. Cette non-conformité aux normes établies soulève des préoccupations quant à la transparence et à l'équité du processus.

Deuxièmement, les exigences de mise à jour de la programmation ne sont pas systématiquement prises en compte. Ce manquement peut entraîner des incohérences dans la planification des projets, compromettant ainsi la bonne exécution des marchés publics.

Enfin, certains documents produits par ces instances, tels que le procès-verbal de séance de dépouillement qui se limite à la composition de la sous-commission d'analyse, ou les rapports d'analyse de dossiers de consultation des offres qui omettent une analyse approfondie des offres, révèlent un besoin criard de renforcement des capacités. Il y'en a même qui proposent au MO d'attribuer le marché à un soumissionnaire dont l'offre n'a pas été enregistrée régulièrement.

3.4. LES MAITRES D'OUVRAGES

A cette étape, notre équipe d'audit a entrepris d'évaluer la performance des Maîtres d'Ouvrage dans la gestion des marchés publics, en vue de formuler des recommandations visant à améliorer leur rôle. L'objectif principal était d'apprécier le respect des normes lors de l'exécution de la mission de contrôle interne par les personnes morales ou physiques accréditées par le MO (Chef de service, Ingénieur, et Maître d'œuvre, le cas échéant).

IV. RECOMMANDATIONS SUR L'AMELIORATION DU SYSTEME

Les recommandations découlent, d'une part, de l'analyse du cadre réglementaire, en y intégrant certains éléments d'adéquation avec la législation sur les CTD, d'autre part, du souci de prendre en charge les dysfonctionnements et mauvaises pratiques révélés par les processus. Toutefois, ce deuxième volet est tempéré par le fait que les actes de régulation ayant pris en charge les faits décriés, n'ont pas encore été mis à la disposition de l'Auditeur.

4.1. Adaptation aux standards internationaux et aux objectifs nationaux

Les recommandations y afférentes se rapportent aux points ci-après :

4.1.1. Champ d'application et portée du cadre réglementaire :

La démarche de rationalisation qui est en cours devrait se poursuivre pour tendre vers un Code unique de la Commande publique.

4.1.2. Règles concernant la participation :

Il s'agit de faire évoluer la définition d'un appel d'offres national, qui, suivant le CMP en son article 74(1) le restreint aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social au Cameroun, vers un peu plus de concurrence en rattachant plutôt "national" aux moyens de publicité utilisés, les critères d'éligibilité et de qualification étant les mêmes pour tous. La préférence nationale pouvant être activée, le cas échéant.

4.1.3. Critères d'évaluation et d'attribution :

La recommandation vise à sortir de la dictature du prix, en intégrant des considérations liées au coût du cycle de vie afin de garantir des décisions objectives et rentables, dans la mesure où une amélioration de la qualité des dépenses d'investissement découlerait du privilège accordé au meilleur rapport qualité/prix estimé pour la durée de vie du produit, du service ou des travaux achetés.

4.1.4. Droit de contester et de formuler un recours :

La publication systématique des recours et des décisions y afférentes dans le JDM est de nature à briser certaines blocages qui limitent ce droit.

Il convient de préciser que des dispositions ont été prises dans ce sens en 2020 par l'arrêté n° 413/A/ PR/MINMAP du 08/12/20 portant organisation et fonctionnement du CER, en son article 19.

4.1.5. Normes concernant la tenue en lieu sûr des archives, documents et données électroniques :

En application des principes de bonne gouvernance, notamment la transparence et la participation, il serait indiqué que la gestion des archives indique ce qui est à la disposition du public aux fins de consultation, y compris les conditions d'accès.

4.1.6. Réglementation d'application prévoyant les processus et les procédures :

L'Auditeur recommande trois actions :

- Mettre à jour les CCAG (EXECUTION) qui datent de 2007, et les DTAO mis en vigueur en 2014, voire le Dossier-type de demande de cotation, alors que le Code date de 2018.
- Elaborer un document unique contenant tous les textes d'application du CMP.
- Mettre à jour régulièrement les réglementations et les outils de soutien.

Ce qui suppose que l'ARMP, chargée de l'élaboration de la réglementation et le MINMAP, de la mise en vigueur s'accordent pour la diffuser, sans oublier les outils de soutien mis à jour.

4.1.7. Achats publics durables :

En droite ligne de la SND30 qui vise la transformation structurelle et le développement inclusif, s'engager résolument dans une démarche vers l'achat public durable.

La recommandation vise à aller bien plus loin que le cadre normatif en vigueur qui prévoit juste que les considérations du développement durable soient prises en compte dans les conditions d'exécution des marchés publics, en s'arrimant aux préoccupations de la SND30.

A titre d'exemple, concernant la création et de la préservation des emplois décents dans les grandes entreprises, la SND30 prévoit que la politique en la matière visera notamment à "mieux exploiter et valoriser les gisements d'emplois qu'offrent les économies « verte » et « bleue »". Dans le cadre de cette approche, on pourrait utilement intégrer les invitations ou incitations notamment à l'innovation frugale.

Ce, d'autant plus que, dans un contexte politique marqué par une décentralisation qui accorde certains pouvoirs aux régions, d'énormes possibilités s'ouvrent pour l'instrumentalisation des marchés publics pour atteindre les objectifs du développement durable, notamment, les marchés communautaires.

4.2. Réglementation des marchés publics et législation sur les CTD

- (i) Etendre le statut de maître d'ouvrage aux présidents de syndicats de commune et aux directeurs généraux d'établissements et d'entreprises locaux ;
- (ii) Mieux segmenter pour les projets locaux, marchés publics et délégations de services publics ;
- (iii) Encadrer la spécificité des marchés passés par les entreprises publiques locales et qui traiteraient beaucoup plus avec les organisations communautaires à la base ;
- (iv) Renforcer le niveau d'exigence de la maturation des projets locaux, en instituant des commissions internes de maturation dans les CTD ;
- (v) Déconcentrer le régime de la régie, en responsabilisant l'organe délibérant ou à défaut le Ministère chargé de la décentralisation, comme organe autorisant la régie, en lieu et place du Premier Ministre et du MINMAP.

4.3. Mauvaises pratiques et dysfonctionnements

Sous réserve des mesures de régulation prises, le cas échéant, par l'ARMP, qui, en sa qualité de surveillant et de facilitateur du système, suit les acteurs et les forme, notamment, les recommandations portent sur :

4.3.1. Archivage

- (i) La prise de sanctions à l'encontre des Maîtres d'ouvrage qui persistent dans la rétention des documents.
- (ii) Une rationalisation de la gestion des archives afin de s'assurer, notamment, de ce que tout ce qui y entre est effectivement consultable, et d'un regroupement des éléments par projet, y compris les actes de régulation et les rapports d'OI, les recours, dénonciations, demande d'arbitrage et d'avis technique ;
- (iii) Une amélioration de la banque des données pour qu'elle puisse autant que faire se peut, refléter la situation de l'archivage physique, avec des vérifications régulières de son contenu.

4.3.2. Préliminaires

- (iv) Rendre les SIGAMP opérationnelles.
- (v) Renforcer les capacités des SIGAMP et des CIPM sur les enjeux et objectifs de la programmation des marchés publics.

4.3.3. Dossiers de consultation et CCAG

- (vi) Adapter les DTAO et le DTDC au cadre normatif en vigueur.
- (vii) Renforcer les capacités des SIGAMP et des CIPM sur le DAO.

4.3.4. Enregistrement des offres

- (viii) Renforcement des capacités des SIGAMP et des CIPM.
- (ix) Prise de sanction, le cas échéant.

4.3.5. Entraves à une saine concurrence

- (x) Juguler la prolifération des consultations à unique soumissionnaire par une régulation proactive à l'ouverture des plis.
- (xi) Permettre à l'ARMP de prendre une part active aux Journées Nationales de Programmation afin de réguler de manière proactive le recours abusif à la procédure du gré à gré et au dévoiement de celle de demande de cotation.

4.3.6. Défaillance du contrôle a priori par l'OI

- (xii) Donner la possibilité à l'auditeur de se prononcer sur la pertinence de la mission d'OI en mettant à sa disposition les documents toujours attendus.

- (xiii) le rapprochement entre les OI et l’Auditeur Indépendant en vue d’une mutualisation et une bonne coordination des contrôles
- (xiv) Apporter des solutions urgentes aux raisons qui président au défaut de contrôle a priori par l’OI de bon nombre de projets de sa compétence.
- (xv) Mettre à profit la plateforme PrideSoft en vue d’une transmission en ligne des rapports d’OI.

4.3.7. Non-conformité des procès-verbaux de séance

- (xvi) Réguler systématiquement.
- (xvii) Renforcer les capacités des CIPM sur la tenue du Registre infalsifiable.

4.3.8. Marchés de gré à gré

- (xviii) Réguler au niveau opérationnel et stratégique en vue du respect du délai de caducité des autorisations de gré à gré et de l’obligation de consulter au moins trois soumissionnaires sous le régime de l’article 109 c).

4.3.9. Conflit de compétence

- (xix) Veiller au respect des sphères de compétence de la régulation opérationnelle et stratégique.

4.3.10. Exécution

- (xx) Appliquer des sanctions aux acteurs qui exécutent des prestations avant signature du marché, voire réceptionnent provisoirement des travaux avant de signer et notifier un OSD, deux jours après

V. ANNEXES

5.1. LES TERMES DE REFERENCE

5.2. LA METHODOLOGIE UTILISEE

**5.3. L'ETAT DE RAPPROCHEMENT DES DOCUMENTS COMMUNIQUEES A L'AUDITEUR
AVEC LES DONNEES DE LA BANQUE**

**5.4. L'ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS DISPONIBLES A LA BANQUE DES DONNEES AU
DEMARRAGE DE L'AUDIT**

5.5. L'ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES LE DEMARRAGE DE L'AUDIT

5.6. LA COLLECTE COMPLEMENTAIRE AUPRES DES MAÎTRES D'OUVRAGE

5.7. LES DOCUMENTS MANQUANTS AU TERME DE LA COLLECTE DE RATTRAPAGE

5.1. LES TERMES DE REFERENCE

1. Contexte et justification de l'Audit

En vue de contribuer à l'amélioration de la qualité de la dépense publique et au renforcement du système statistique, le Gouvernement de la République du Cameroun bénéficie d'un financement de l'Association Internationale pour le Développement (IDA) pour la réalisation du projet d'amélioration de l'efficacité de la Dépense Publique et du système statistique.

Le projet comporte quatre principales composantes à savoir : (i) la consolidation de la réforme des finances publiques dans deux ministères pilotes clés à savoir la santé et l'éducation. Il sera en outre question dans cette composante d'appuyer la mise en œuvre de la Circulaire du Premier Ministre de septembre 2016, de préparer le troisième triennat du budget programme et de faciliter le déploiement du système intégré de gestion des ressources humaines et de la solde (SIGIPES II ; (ii) l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public notamment à travers l'appui à la mise en place du fonds de maturation, l'appui au suivi du BIP (application de suivi du BIP, implémentation du suivi axé sur les résultats et suivi citoyen), l'identification de la mise en œuvre des actions à entreprendre pour réduire le niveau des soldes engagées non décaissées en matière de financement extérieur ; (iii) l'appui à la réforme des marchés publics à travers l'introduction d'un système de rémunération axé sur les résultats pour les commissions de passation des marchés, le développement et le déploiement d'une application d'archivage et de suivi des marchés publics (le e-tracking), le renforcement des capacités des acteurs du système des marchés publics et la professionnalisation ; (iv) ; le renforcement du système statistique à travers la mise en place d'infrastructures informatiques et de diffusion dans le nouveau bâtiment de l'INS, l'appui à la collecte et à l'analyse des données sur la pauvreté (carte de pauvreté, ECAM5), la collecte de données sur le commerce transfrontalier, la mise en place d'un dispositif pérenne de collecte de données sur l'emploi et l'appui au financement du 4^{ème} RGPH.

La composante 3 orientée sur la performance du système de passation des marchés, s'est-elle donné pour objectif d'améliorer le fonctionnement dudit système à travers les leviers de l'efficacité, de l'efficience et de la rentabilité. Le but étant, in fine, le renforcement des compétences du personnel chargé de la passation des marchés et l'élargissement des capacités des principales institutions pour mener à bien leurs missions. Cette perspective commanderait de faire un état des lieux sans complaisance du système actuel sous le prisme de l'efficacité, de l'efficience, de la rentabilité et de la performance.

Mais, pour atteindre ses objectifs, la composante 3 souhaite procéder à une évaluation du système des marchés publics dont les nombreuses controverses a priori montrent à suffisance la pertinence d'un tel besoin. **L'un des outils les plus efficaces d'évaluation d'un système est l'audit qui permet en même temps ; d'apprécier le comportement du système à l'aune des standards internationaux ; d'adresser les questions statistiques comme celles relatives au volet de la prise en compte des femmes dans le système des marchés publics et celles des délais réels des procédures de passation des marchés. Egalement d'évaluer le niveau réel de compétence des acteurs impliqués et ressortir les besoins en formation desdits acteurs par segment de métier.**

L'institution des audits dès l'exercice 2000 répondait donc déjà au même souci visé par le projet. En effet, le principe du contrôle a posteriori des procédures de passation et d'exécution des marchés publics au travers des audits réalisés annuellement par des Auditeurs Indépendants, recrutés par l'ARMP, est consacré par le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et l'audit constitue une réelle opportunité d'évaluer ledit système au cours de la triennale 1999-2020-2021 ; une période coïncidant par ailleurs, avec celle de la mise en œuvre du PEPS.

2. Objectifs de la mission

L'objectif général de cette prestation est de recruter un consultant (Auditeur Indépendant) pour procéder à l'audit des procédures de passation et d'exécution des marchés publics passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées au cours des exercices 2019, 2020, 2021 et exprimer une opinion professionnelle sur lesdites procédures.

De façon spécifique, la réalisation de l'audit des marchés publics consiste à :

- arrêter la liste des marchés à auditer (exercices 2019, 2020 et 2021) choisis de manière aléatoire par une méthode d'échantillonnage bien détaillée et clairement expliquée ;
- procéder à l'examen de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées au cours des exercices budgétaires 2019, 2020, 2021 avec la réglementation en vigueur, y compris le cas échéant, avec les dispositions des accords de financement régissant les marchés sur financement extérieur ;
- évaluer la capacité de l'ARMP et des autres Acteurs à classer et archiver convenablement les documents relatifs à la passation, à l'exécution et au paiement des marchés publics ;
- vérifier le respect des principes d'équité, de transparence, d'économie et d'efficacité ;
- identifier les cas de passation des marchés non conformes ;
- se prononcer sur l'effectivité et la qualité des travaux réceptionnés et des biens et services livrés ;
- procéder à la réconciliation et à la comparaison des dépenses réellement effectuées pour les marchés de travaux, fournitures et services de consultants par rapport aux clauses contractuelles de ces marchés afin de vérifier si les fonds ont été utilisés aux fins prévues ;
- examiner le traitement des réclamations, recours, requêtes, demandes d'arbitrages et dénonciations, tout en évaluant les sanctions aussi bien des procédures que des acteurs ;
- évaluer la pertinence de la mission d'Observateur Indépendant en vérifiant si les dysfonctionnements relevés ont été signalés dans leurs rapports ;
- faire une analyse qualitative et quantitative des faiblesses et des points forts du système actuel des marchés publics, sanctionnée par des recommandations en vue de son amélioration.

Par conséquent, l'Auditeur devra dans l'exercice de la mission sus indiquée justifier :

- d'une intégrité (probité et honnêteté) établie ;
- d'une expérience avérée dans les audits ;
- d'une bonne connaissance du système des marchés publics camerounais.

NB : Au regard des améliorations perceptibles dans la phase passation des marchés et de nombreuses défaillances relevées dans la phase exécution des marchés lors des audits antérieurs, un accent particulier devra être apporté à l'audit de l'exécution des marchés, notamment :

- ***le dispositif de suivi de l'exécution physique et financière mis en place par le Maîtres d'ouvrage ;***
- ***la pertinence et l'effectivité dudit suivi ;***
- ***le paiement effectif des prestations ;***
- ***la réception et la clôture des contrats ;***
- ***les carences observées et les recommandations pour une amélioration du suivi, de l'exécution et du paiement.***

3. Résultats attendus

Au terme de la mission du consultant, les principaux résultats attendus du consultant sont :

a. Au plan documentaire

Le consultant doit produire :

- i. la liste exhaustive et finale des marchés concernés par l'audit et faisant partie de l'échantillon ;
- ii. la liste exhaustive et finale des documents attendus dès le démarrage de l'audit pour chaque marché inscrit dans l'échantillon de l'Audit ;
- iii. un état détaillé des documents disponibles à la banque des données de l'ARMP dès le démarrage de la mission d'audit pour chaque marché ;
- iv. un état détaillé des documents manquants dès le démarrage de l'audit ;
- v. une liste exhaustive des documents obtenus auprès des Maîtres d'ouvrages pour compléter les documents manquants à la banque des données de l'ARMP;
- vi. une liste des documents manquants même après rattrapage de la collecte auprès des maitres d'ouvrages ;
- vii. Un état de l'exploitation de chaque document suivant le modèle présenté en annexe.

b. Au plan des analyses

L'Auditeur produira dans ses rapports une section détaillée des analyses distinguant d'une part, la qualité et la conformité des procédures de passation et d'exécution et d'autre part, une analyse de l'efficacité du système des marchés publics effectuée sur la base des données exploitées.

- i. A propos de la qualité, l'Auditeur doit formuler une appréciation sur la qualité des documents exploités, leur état de conservation, leur lisibilité, leur complétude, etc.
- ii. A propos de la conformité, l'Auditeur doit vérifier si les documents répondent aux prescriptions réglementaires à savoir :
 - la conformité des DAO aux DAO types
 - l'utilisation conforme des registres (offres et lettres-commandes)
 - la disponibilité des procès-verbaux d'ouverture des offres
 - le respect de la réglementation lors des séances d'ouverture des offres
 - le respect de la réglementation lors de l'évaluation des plis
 - le respect de la réglementation lors de la l'attribution des marchés
 - le respect de la réglementation dans les projets de marchés
 - le respect de la réglementation lors du démarrage de l'exécution
 - le respect de la réglementation durant l'exécution des prestations
 - le respect de la réglementation pendant la réception des prestations
- iii. A propos de l'efficacité du système, l'auditeur devra analyser les grands indicateurs de performance du système.
 - La proportion des marchés non programmés
 - Le ratio des procédures exceptionnelles
 - La proportion de la fraude
 - La proportion des résiliations
 - La proportion des chantiers abandonnés
 - La proportion des acteurs sanctionnés
 - Le niveau de consommation budgétaire

Pour la conduite de ces missions, l'auditeur devra se référer à toute la documentation disponible ainsi qu'à ses expériences propres. Il fondera ses analyses et appréciations sur la base des éléments objectivement vérifiables.

4. Livrables

Les livrables sont les différents rapports d'étapes ci-après produits par l'Auditeur Indépendant :

i. un rapport de démarrage de la mission

Le rapport de démarrage de la mission fait ressortir :

- la liste des marchés à auditer ;
- le projet d'exécution ;
- l'approche méthodologique ;
- le cadrage de la mission ;
- l'identification des principaux interlocuteurs ;
- le calendrier de production des livrables attendus de la mission.

Ce rapport sera **pré-validé par l'équipe projet mise en place à laquelle peuvent se joindre d'autres experts si nécessaires et validé par la suite par la commission de suivi et de recette technique.**

ii. un rapport provisoire d'audit des marchés

A la fin de sa mission, le consultant présentera ses premières conclusions et recommandations sous forme d'un rapport provisoire d'audit. Ledit rapport sera présenté par l'Auditeur et pré-validé par l'équipe projet mise en place élargie à d'autres acteurs et experts si nécessaires, y compris ceux de la Banque Mondiale. Il sera validé par la commission de suivi et de recette technique.

iii. un rapport final

Après la prise en compte des amendements apportés et validés sur le rapport provisoire par l'équipe projet ou la commission de suivi et de recette technique en charge du suivi technique et stratégique de l'étude, le consultant produira un rapport final.

Le rapport final d'audit engage la responsabilité du consultant et ne représente que les opinions de celui-ci. Le rapport final d'audit mettra en évidence les conclusions et recommandations de l'Auditeur, les détails de la méthodologie et des procédures suivies et les éléments qui soutiennent ses conclusions. Les précisions sur les recommandations seront traitées dans les annexes.

Le consultant devra ainsi animer les réunions de validation des rapports de démarrage de la mission, provisoire ainsi que de validation du rapport final d'audit.

Sauf justification contraire du consultant, la structure du rapport final sera la suivante :

1. Résumé des conclusions et recommandations rédigé sous forme de note.
2. Description de l'audit
 - a. Objectifs ;
 - b. Contexte, étendue, approche et type d'audit.
3. Conclusions sur :
 - a. Les contrats audités ;
 - b. Le fonctionnement du système de passation de marchés ;
 - c. Le fonctionnement des instances de passation des marchés ;
 - d. Les Maîtres d'Ouvrage ;
 - e. L'analyse statistique des anomalies et points forts ;
 - f. Les sanctions appliquées ;
 - g. Considérations générales.
4. Recommandations sur l'amélioration du système.

Les Annexes comprendront entre autres :

1. Les Termes de Référence.
2. la liste des marchés audités
3. La méthodologie utilisée.
4. Les résultats de l'Audit (par Maître d'ouvrage et par contrat) incluant les détails de toutes les conclusions de l'Auditeur avec les éléments justifiant chaque conclusion, les tableaux et les graphiques illustrant l'analyse détaillée réalisée durant l'audit. **Un accent devra être mis pour faire apparaître clairement les résultats de l'exécution physique et ceux de l'exécution financière.**

Tous les rapports seront rédigés en français ou en anglais.

5. Approche méthodologique

Pour la réalisation de sa mission, l'auditeur s'appuiera sur une collecte de documents, d'informations et/ou données qui seront disponibles (MINMAP, ARMP, MO/MOD, Commissions de Passation des Marchés).

L'auditeur s'appuiera sur sa lettre de mission pour avoir accès aux sources d'information dont il aura besoin. Il devra rester ouvert à toutes les opinions, de manière à recueillir et à intégrer les points de vue de tous les acteurs.

Pour garantir la réussite de la mission d'audit et en assurer l'atteinte des objectifs escomptés, le PEPS assurera la coordination des différentes activités.

Chaque Autorité Contractante prendra connaissance du rapport provisoire d'audit (la partie relevant de sa compétence), en examinera toutes les conclusions et recommandations et fera part de ses commentaires sur ce document. L'Auditeur n'est pas tenu de modifier ses conclusions ou d'intégrer les commentaires du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué. En cas de désaccord entre les recommandations du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué et celles de l'Auditeur, il devra indiquer la position du Maître d'Ouvrage, textuellement, en précisant dans le rapport que c'est la position du Maître d'Ouvrage à ce sujet.

6. Délai d'exécution

Le délai prévisionnel pour l'exécution de l'audit des marchés passés par les Collectivités Territoriales Décentralisées au cours des exercices 2019, 2020 et 2021 est de **90 jours ouvrables** y compris les délais d'approbation à partir de la date de notification de l'Ordre de Service prescrivant le démarrage des prestations.

7. Profil de l'Auditeur

L'auditeur sera un cabinet d'audit disposant d'au moins cinq (05) années d'expériences avérées dans l'audit des marchés publics ou commande publique.

L'auditeur mobilisera une équipe minimale de coordination composée comme suit :

- **un (01) Coordonnateur/Chef de la mission** ayant le profil ci-après :
 - - une formation de niveau au moins Bac+5 en Marchés Publics, Audit, Droit, Economie, Ingénierie ou tout autre diplôme équivalent ;
 - dix ans au moins d'expérience générale de travail dans un cabinet d'Audit ;
 - avoir participé comme chef de mission à au moins trois (03) missions d'audit, durant les sept (07) dernières années ;
 - d'une expérience de conduite en tant que chef d'équipe d'au moins une (01) mission d'audit des marchés publics ;
- **deux (02) auditeurs seniors** de niveau minimum bac+5 en Marchés Publics ou en Audit et comptabilité, ayant chacun une expérience d'au moins cinq ans dans l'audit ou l'évaluation des organisations ou des réformes administratives.
- **deux (02) experts en marchés publics ayant le profil ci-après** de niveau Bac+4 au moins en Passation des Marchés, science juridique, en science économique, en ingénierie ou en administration publique ou sciences sociales. Ils devront justifier chacun d'au moins huit (08) années d'expérience professionnelle comme acteur dans la passation des marchés publics au cours des dix (10) dernières années.

- il devra aussi disposer d'un personnel d'appui composé de deux cadres et un chauffeur ;
- le cabinet devrait enfin justifier de la disponibilité du matériel de travail (un véhicule tout terrain, au moins trois ordinateurs portables, une imprimante, un photocopieur, un vidéo projecteur et un groupe électrogène de secours en cas d'indisponibilité d'énergie).

8. Modalités de paiement

Livrables valant paiement	Pourcentage du montant hors taxes de la rémunération du consultant
Rapport de démarrage de la mission validé par la commission de suivi et de recette technique	20% du montant hors taxes du marché concernant la rémunération du consultant
Rapport provisoire validé par la commission de suivi et de recette technique, suite à la prise en compte des recommandations	60% du montant hors taxes du marché concernant la rémunération du consultant
Rapport final validé par la commission de suivi et de recette technique, suite à la prise en compte des recommandations issues du rapport provisoire	20% du montant hors taxes du marché concernant la rémunération du consultant

NB : Le paiement des prestations effectuées à l'auditeur devra être lié à la fourniture des livrables sus évoqués après validation et prise en compte des réserves de la Commission par le consultant.

5.2. LA METHODOLOGIE UTILISEE

5.2. METHODOLOGIE

Notre approche d'audit associe la qualité à l'efficacité et nous permet de nous adapter aux besoins particuliers de chaque Maître d'ouvrage. Elle est conforme aux normes de l'Organisation Internationale des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI) dans ses lignes directrices sur les audits de conformité associés aux audits d'états financiers et celles relatives aux audits de performance et aux procédures contenues dans les Termes de Références relatifs à la mission. Il reste entendu que cette organisation a intégralement internalisé les normes ISA édictées par la Fédération Internationale des Comptables (International Federation of Accountants). Elle est également fondée sur des techniques conçues et développées à partir d'expérience cumulée lors de multiples travaux pour une grande variété d'organisations.

Dans le cadre de la présente intervention, notre approche méthodologique comportera les phases suivantes :

- Planification de la mission,
- Exécution de la mission,
- Présentation des rapports.

5.2.1. PLANIFICATION DE LA MISSION

Cette première phase permettra de prendre connaissance des maîtres d'ouvrage objet de la mission et d'avoir une connaissance suffisante de leur environnement, du cadre juridique et institutionnel de la passation, de l'exécution et de règlement des marchés publics pour une meilleure conduite de notre audit.

Au cours de cette étape, nous nous assurerons auprès de l'ARMP, du MINMAP, et du CER de l'existence effective des documents ou informations requis pour l'élaboration de l'échantillon, un préalable à une planification opérationnelle.

Pour ce faire, nous procéderons à la collecte et à la revue des principaux documents de référence et à une évaluation de l'organisation et de l'environnement de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés publics.

i. Collecte et revue des textes de référence

Elle consiste à collecter les données et informations de base devant constituer le dossier permanent de l'audit. Nous nous évertuerons à consulter systématiquement les documents importants et à procéder à leur revue.

ii. Analyse du cadre institutionnel de la gestion des marchés publics

Elle consiste à analyser l'organisation institutionnelle mise en place pour la gestion des marchés publics. Il s'agira d'évaluer les procédures de contrôle interne mises en place pour gérer efficacement la commande publique.

Nous regrouperons et analyserons les documents importants suscités en plus de la liste des marchés passés par les CTD collectée auprès de l'ARMP. Ces analyses nous permettront d'appréhender les Personnes Responsables des Marchés, les Commissions et Sous-Commissions des marchés, les bénéficiaires etc.

iii. Entretiens d'information

Les rencontres seront organisées en format physique ou virtuel, impliquant la participation des parties suivantes:

- L'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP),
- Le PEPS,
- Le MINMAP,
- Les Chefs des exécutifs municipaux,
- Les membres et secrétaires des Commissions Internes de Passation des Marchés (CIPM),
- Les collaborateurs des maîtres d'ouvrage responsables des marchés publics (chef de service, Ingénieur des marchés et Maître d'œuvre des marchés publics),
- Le personnel impliqué,
- Les partenaires techniques et financiers concernés,
- Tous les autres acteurs du secteur et de l'environnement du système des marchés publics.

Elles permettront d'identifier les attentes, les contraintes ainsi que les besoins de chacune des entités impliquées dans la gestion des marchés publics.

Ces travaux préliminaires nous permettront de déterminer de façon exhaustive le volume des marchés passés sur la période sous revue, suite à la collecte effectuée auprès de l'ARMP. En rapport avec les exigences de l'ARMP qui est le Maître d'ouvrage et de ses représentants désignés, en l'occurrence le Chef de service du marché et l'ingénieur de notre marché, nous procéderons à déterminer l'étendue de la mission conformément aux Termes de Référence.

5.2.2. EXÉCUTION DE LA MISSION

Nos travaux ont porté sur l'échantillon validé par le MO.

Dans cette phase et conformément aux TDRs, nous avons dressé la liste complète des actes, formalités et étapes constitutifs pour chaque type de marchés à analyser. Les procédures et marchés à auditer ont été analysés à la lumière de cette liste, notamment depuis l'élaboration du plan de passation jusqu'à l'exécution du marché, y compris l'exercice du contrôle à priori.

Les diligences requises ont été mises en œuvre dans le but de couvrir les objectifs spécifiques assignés à la mission. Elles ont porté principalement sur la vérification des marchés réalisés par les MO au titre des périodes sous revue. Elles ont consisté à vérifier l'application de la réglementation en vigueur dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés. La formulation de recommandations tant au niveau du système qu'au niveau de la passation et de l'exécution des marchés est également effectuée. A l'entame de la mission, une liste des documents à exploiter a été adressée aux MO.

Audit de conformité des procédures de passation des marchés publics

Cette étape a consisté à vérifier la correcte mise en œuvre de toutes les étapes de la passation des marchés conformément aux dispositions et procédures édictées par la réglementation en vigueur. Nous avons ensuite formulé des recommandations appropriées et proposer les correctifs à apporter pour l'amélioration du système de gestion des marchés.

Nous nous sommes assurés à ce niveau du respect strict de toutes les dispositions du système de passation des marchés national en matière de préparation, de publicité, de mise en concurrence et de la gestion de l'attribution des marchés. Nous avons examiné pour chacun des marchés objet de notre revue, la conformité de la méthode de passation choisie avec les dispositions de la réglementation en vigueur. Les cas de non-conformité ont fait l'objet de formulation des recommandations pour une meilleure application des modalités de leur mise en œuvre.

Toutes indices de fraude et de corruption ou d'autres pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, manœuvres obstructives) telles qu'elles sont définies dans le cadre du système de passation des marchés national, ses textes d'application et autres dispositions pénales pertinente ont été examinées avec la plus grande attention.

La Norme ISSAI définit les responsabilités de l'auditeur concernant la fraude lors de l'audit d'un État Financier. L'application de cette norme a été adaptée à l'audit des marchés publics pour couvrir les risques de fraude et de corruption sus-indiqués.

Audit des procédures d'exécution et de règlement des marchés

L'audit des procédures d'exécution et de règlement des marchés a permis de présenter une opinion professionnelle sur la conformité de ces procédures par rapport à la réglementation en vigueur. Nous nous sommes assurés que ces marchés ont été exécutés sur la base des obligations contractuelles.

Évaluation des acteurs et du système de la commande publique

Dans ce cadre, nous avons analysé l'organisation en général des structures (hommes, procédures, système de suivi et de contrôle) intervenant dans le processus de passation et d'exécution des marchés en particulier. Également, nous avons analysé la qualité, la transparence et l'efficacité des opérations de passation des marchés du MO, de même que son organisation institutionnelle pour la gestion des marchés.

Suivi de la mise en œuvre des recommandations

Nous avons procédé à la vérification de la mise en œuvre des recommandations de l'audit précédent le cas échéant et leur application par la structure, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette structure.

**5.3. ETAT DE RAPPROCHEMENT DES DOCUMENTS COMMUNIQUEES A
L'AUDITEUR AVEC LES DONNEES DE LA BANQUE**

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maître d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles		Documents communiqués à	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
1	002/M/MO/CIPM/C-TIB/2019	Quartier Mamassi: Adduction et extension du réseau d'eau potable (BIP)	TRAV	ETS KAMGANG JEAN SIMPLICE	C_TIBATI	AD	AONO	BIP	100 000 000	13	-	-	-
2	06/M/R-AD/D-FD/C-GT/SG/SIGAM/2019	Eclairage public des carrefours et artères de la ville de Galim-Tignère (31 panneaux solaires) et 09 villages de la commune de Galim-Tignère (01 Assawé, 02 Lompta, 02 Mayo Dankali, 02 Mbabo)	TRAV	ETS EGETRA	C_GALIM_TIGNERE	AD	DC	BIP	100 000 000	9	-	-	-
3	01/M/CNY/SG/ST/CIPM/2019	Achat d'un tracteur avec accessoires complet	AG	ETS EGETRA	C_NYAMBAKA	AD	AONO	BIP	100 000 000	11	1	-	-
4	002/M/CIPM/CAN3/2019	Travaux de construction d'une mini-cité municipale au Quartier Universitaire de DANG	TRAV	LE DISTRIBUTEUR COMPANY LTD	C_NGAOUNDERE_III	AD	AONO	FEICOM	371 980 469	11	-	-	-
5	01/M/C.KTCHA/CIPM/SG/2019	Construction de l'hôtel de ville de KONTCHA	TRAV	INTERNATIONAL ASSOCIATE CONSULTING (INASCO CONSEIL)	C_KONTCHA	AD	AONO	FEICOM	129 501 874	12	1	-	1
6	015/M/CMBE/CDPM-VINA/2019	Travaux de construction de 29 unités de logements dans la Commune de MBE	TRAV	INTERNATIONAL ASSOCIATE CONSULTING (INASCO CONSEIL)	C_MBE	AD	AONO	FEICOM	455 553 321	14	-	-	-
7	001/M/R-AD/D-M°BYO/C-BKM/CIPM/2019	Travaux de construction de l'Hôtel de Ville de BANKIM	TRAV	INTERNATIONAL ASSOCIATE CONSULTING (INASCO CONSEIL)	C_BANKIM	AD	AONO	FEICOM	129 498 771	13	-	9	-
8	02/M/CB/CIPM/2020	Travaux d'entretien des voiries revetues dans la ville de BELEL	TRAV	SOTRACAM SARL	C_BELEL	AD	AONO	BIP	189 995 062	12	-	6	-
9	013/M/CAN1ER/SG/2019	Travaux de construction de 24 logements de types T3 au quartier BEKA MATARI dans la Commune de NGAOUNDERE 1er	TRAV	BUILD AFRICA CORPORATION	C_NGAOUNDERE_I	AD	AONO	FEICOM	354 215 129	12	-	3	-
10	02/M/ST/C-NGAOUNDAL/CIPM/2019	Travaux de construction de 02 ponts sur la rivière Mbilol phase 2 de l'aménagement du lotissement de NGAOUNDAL	TRAV	ETS ROMECAM	C_NGAOUNDAL	AD	AONO	FEICOM	220 051 369	13	-	-	-
11	17/M/ST/COMMUNE NGAOUI/CIPM/MBERE/2019	Construction de l'Hôtel de Ville dans la Commune de NGAOUI	TRAV	LE DISTRIBUTEUR COMPANY LTD	C_NGAOUI	AD	AONO	FEICOM	337 383 806	12	3	-	-
12	10/M/C-MARTAP/CIPM/2019	Travaux de réhabilitation de la route communale TCHABBAL-MANDOUROU-Cascade de FARO	TRAV	ETS AHB	C_MARTAP	AD	GG	FR	140 300 852	9	-	2	-
13	03/M/C-NGANHA/SG/CIPM/2019	Construction d'un pont sur le MAYO-OUVER dans la Commune de NGANHA	TRAV	ETS MASSA	C_NGANHA	AD	GG	FR	127 337 535	10	2	-	-
14	02/M/CNGANHA/SG/CIPM/2019	Construction d'un pont sur la rivière MAYO-BEKA dans la Commune de NGANHA	TRAV	ETS MASSA	C_NGANHA	AD	GG	FR	145 057 751	10	-	-	-
15	03/M/CAN1ER/SG/CAN1ER/2020	Travaux de lotissement de 50 hectares de terrain à BEKA MATARI dans la Commune de NGAOUNDERE 1	TRAV	LE DISTRIBUTEUR COMPANY LTD	C_NGAOUNDERE_I	AD	DC	FEICOM	237 264 228	12	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
16	011/LC/AONO/CIPM/COKI/2019	Travaux d'achèvement de la salle polyvalente de MOUKO dans la Commune de KIIKI	TRAV	LEBES SARL	C_KIIKI	CE	AONO	BIP	200 000 000	12	1	3	1
17	003/M/CIPM//2019	Réhabilitation de la route Mbakok-Melane-ndélé-nyabewo'o(70 km) et construction des infrastructures d'accompagnement à Olembé	TRAV	GROUPEMENT VIATIQUE COMPANY/ETS DITEX	C_AYOS	CE	AONO	BIP	123 523 453	12	3	10	-
18	28/M/CUY/CIPM/2019	Construction d'une clôture au Rond-Point Bastos (Ecole Publique). Delai : 6 mois	TRAV	CENTRALE D'ETUDE ET DE TRAVAUX PUBLICS SARL	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	139 820 625	11	-	-	-
19	33/M/CUY/CIPM/2019	Travaux d'entretien courant et de réhabilitation des réseaux d'éclairage public dans la ville de Yaoundé.	TRAV	CEGELEC S.A	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	1 000 000 000	11	-	-	-
20	135/LC/V.Y/CIPM/2020	Acquisition de deux (2) camions CANTER. Delai : 6 mois	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	140 000 000	12	1	-	-
21	27/M/CUY/CIPM/2019	Fourniture et pose des illuminations des fêtes de fin d'année 2019.	TRAV	CEGELEC S.A	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	449 903 513	12	1	-	-
22	24/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE SIGNALÉTIQUE URBAINE DANS LA VILLE DE YAOUNDE (1ère tranche)	TRAV	ETS MAYGA	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	178 385 435	12	-	-	-
23	20/M/CUY/CIPM/2020	Exécution des travaux de réhabilitation et d'entretien des feux tricolores dans la ville de Yaoundé	TRAV	CEGELEC S.A	CU_YAOUNDE	CE	AONO	BA	399 864 830	12	-	-	-
24	25/M/GG/CUY/CIPM/2019	Travaux d'entretien des voiries revêtuës dans la ville de Yaoundé. Delai : 12 mois	TRAV	EQUATORIAL BUSINESS AND MARKETING	CU_YAOUNDE	CE	GG	BA	949 998 477	9	-	-	-
25	20/M/CUY/CIPM/2019	FOURNITURE D'UN CAMION CITERNE À EAU A LA CUY	AG	SOCIETE BIA CAMEROUN SA	CUY	CE	AONO	BA	112 880 858	10	1	-	-
26	001/M/C/ND/CIPM/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ÉQUIPEMENTS DU PROJET D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DANS LA VILLE DE NDIKINIMEKI	TRAV	NANGA CIE II SARL U	C_NDIKINIMEKI	CE	AONO	FEICOM	181 653 525	11	1	9	1
27	004/M/CAY5/CIPM/2019	MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE YAOUNDÉ V	SPI	ETS ENSERBAT TP	CAY5	CE	AONR	FEICOM	156 227 040	16	1	2	-
28	003/M/CAY5/CIPM/2019	CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE YAOUNDÉ V	TRAV	SIKABAT BTP	CAY5	CE	AONO	FEICOM	2 170 494 036	13	-	13	2
29	02/M/CAKGA/SG/CIPM/19	TRAVAUX D'ENTRETIEN D'UNE VOIRIE TRONCON EUCALYPTUS INTERSECTION PETIT MARCHÉ + BRETELLE	TRAV	ETS KENFACK & FILS	C_AKONOLINGA	CE	AONO	BIP	238 336 031	12	2	-	-
30	16/M/GG/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA RUE JOSEPH ESSONO ELA TRONCON SONEL CENTRAL - PALAIS DE JUSTICE MINFI- ROND POINT MINESEC	TRAV	RAZEL CAMEROUN SA	CUY	CE	GG	BA	608 309 911	8	-	-	-
31	02/M/CO/CIPM/2019	ENTRETIEN D'UNE VOIRIE DE LA COMMUNE D'OKOLA	TRAV	ETS BATRAPAS	C_OKOLA	CE	AONO	BIP	149 999 989	11	2	7	1
32	005/LC/CNTK/SG/CDPM-BAF/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET DE PARACHÈVEMENT DE L'HOTEL DE VILLE DE NITOUKOU	TRAV	ETS DECENT HIGHLAND	C_NITOUKOU	CE	AONO	FEICOM	110 783 250	13	1	13	2

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
33	02/M/CAY5/CIPM/2019	pour exécution des travaux d'entretien d'une voirie de la CAY5	TRAV	GROUPE FIXIT SARL	CAY5	CE	AONO	BA	199 626 885	12	-	-	-
34	30/CUY/CIPM/2019	PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA PLATE-FORME MULTIMODALE D'OLEMBÉ À YAOUNDÉ	TRAV	CENTRALE D'ETUDE ET DE TRAVAUX PUBLICS SARL	CUY	CE	AONO	BIP	298 000 000	11	-	-	-
35	003/M/C-YKO/CIPM/2019	Construction du Centre culturel de Yoko	TRAV	SOCIETE AFRIBAT BTP SARL	C_YOKO	CE	AONO	FEICOM	136 875 000	11	2	3	-
36	23/M/GG/CUY/CIPM/2019	PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU TALUS ET DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT À LA RUE 1343 (CHAPELLE KONG-SAPEUR MIMBOMAN	TRAV	ETS CHRIST & FILS	CUY	CE	GG	BA	224 579 465	9	-	-	-
37	13/M/CUY/CIPM/2020	FOURNITURE DE DEUX MINI CAMIONS BENNE À LA CUY	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CUY	CE	AONO	BA	145 000 000	12	1	-	-
38	11/M/RC/RCE/DMI/COBAF/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE BAFIA	TRAV	BUREAU D'AFFAIRE ET DE TRAVAUX (BAT)	C_BAFIA	CE	AONO	FEICOM	483 341 259	12	1	6	1
39	013/M/AONO/CIPM/CMENGANG/2019	travaux de rehabilitation de la route ndele akolo mesa nkolseng dans la commune de mengang	TRAV	ETS MANKO	C_MENGANG	CE	AONO	BIP	158 006 194	12	1	7	1
40	05/M/CIPM/C.MGME/2019	TRAVAUX DE RÉFECTION DE 4 PALET AGES SUR LES RIVIÈRES MVA MEBOT NKOL EBAE BILON OSSOEGAN	TRAV	ETS GRACE & KEVIN CORPORATION	C_MENGUEME	CE	AONO	FR	146 544 024	15	-	1	4
41	0020/CMENGANG/CIPMMG/2020	TRAVAUX DE DONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS DU PROJET D'ECLAIRAGE PUBLIC PAR 100 LAMPADAIRES SOLAIRES DANS LA COMMUNE DE MENGANG PU	TRAV	CAMEROON FACTORING & DEVELOPMENT SARL	C_MENGANG	CE	AONO	FEICOM	114 990 826	13	1	6	1
42	295/M/CUY/CIPM/2020	Travaux d'entretien des fosses septiques de 56 toilettes publiques et bâtiments communaux de la ville de Yaoundé	TRAV	GROUPEMENT ANGE EXPRESS ETHYGIENE ET SERVICE/SAINTE EMMANUEL VIDANGE/SUD DEPECHE	CUY	CE	AONO	BA	235 424 364	11	-	-	-
43	10/DC/CDPM/C/C-KY/2019	Travaux d'entretien de certains tronçons de routes communales dans la Commune de Kon Yambetta	TRAV	ETS GENER CONSTRUCTION CAMEROUN	C_KON-YAMBETTA	CE	GG	FR	160 429 172	7	-	-	-
44	0014/M/V.Y/CIPM/2020	Travaux de construction d'une clôture aux alentours de l'espace vert situé entre le carrefour Etoudi et le carrefour du Palais à Yaoundé	TRAV	NGAMA SARL	CUY	CE	AONO	BA	104 569 431	12	-	-	-
45	027/M/CUY/CIPM/2019	FOURNITURE ET POSE DES ILLUMINATIONS DES FETES DE FIN D'ANNEE 2019 DANS LA VILLE DE YDE	TRAV	ETS TOYS LAND	CUY	CE	AONO	BIP	449 903 513	12	-	9	-
46	020/LC/CUY/CIPM/2019	FOURNITURE DES SERVICES DE GARDIENNAGE	SPI	ETS TOYS LAND	CUY	CE	AONO	BIP	396 719 460	12	2	-	-
47	020/M/CUY/CIPM/2019	FOURNITURE D'UN CAMION CITERNE A EAU A LA CUY	AG	SOCIETE BIA CAMEROUN SA	CUY	CE	AONO		142 880 858	-	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
48	015/LC/C.MORA/CIPM/2019	Réhabilitation de la route Igawa- Meme Mangave- Yanouss	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_MORA	EN	AONO	BIP	277 777 000	12	1		
49	005/M/C-MAGA/CIPM	Pour l'éclairage Public par l'énergie Solaire	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_MAGA	EN	AONO	BIP	118 978 706	12	-		
50	0003/M/CUM/CIPM-TR/2019	Travaux de bitumage et de construction des équipements d'éclairage public sur l'axe Hopital Régional vers Douanes (deuxième phase)	TRAV	ETS MOUDJOUR	CU_MAROUA	EN	AONO	BA	134 900 000	12	-		
51	007/M/K/SG/CRPM-EN/MOD/SDB/2019	Réalisation de trente (30) forages dans trente (30) villages de l'arrondissement du LOGONE BIRNI Département du LOGONE ET CHARI	TRAV	ETS AL-AZIZA	C_LOGONE_BIRNI	EN	AONO	BIP	220 800 000	12	-		
52	003/M/C.TOK/CIPM-ROUTE/2019	Travaux d'aménagement des routes communales: Ouro HASSANA-WAILA MAYO -TINDIRME (10,5 km) lot 2 GG	TRAV	ETS KODJI SENI	C_TOKOMBERE	EN	GG	FEICOM	124 045 555	7	-		
53	01/M/C.DARGALA/CIPM/2019	Travaux d'extension du réseau électrique de Dargala Centre-Roufirdé, Roufirdé-Gassayel, Gassayel- quertagalwo	TRAV	GROUPE MAZAL & ASSOCIES SARL	C_DARGALA	EN	AONO	PNDP,PNDP	101 521 177	12	-		
54	008/LC/RE/DHN/C.NKA/CIPM/2019	Electrification rurale : Electrification du centre urbain de NGUELEMENDOUKA par énergie solaire photovoltaïque (Construction mini-centrale solaire ; transport et distribution ; pose de 100 lampadaires solaires)	TRAV	ETS LEADER GRAPHIC	C_NGUELEMENDOUKA	ES	AONO	BIP	611 383 042	11	-	10	3
55	01/M/VDB/C2D-CR/CSPM/CLS-BERT/2020	Travaux d'aménagement des espaces publics de la Ville de BERTOUA dans le cadre du programme urbain capital régional	TRAV	ETS DOUANLA ET FILS	CU_BERTOUA	ES	AONO	AFD	1 512 658 470	10	-	7	-
56	010/LC/C.MMA/CIPM/2019	Travaux de construction de trois min-réseaux d'adduction d'eau potable par pompage solaire à MBOMA, NGOAP et ZOUME dans la Commune de MBOMA	TRAV	BENZ CAM ENERGY EFFICIENCY SERVICE AFRICA	C_MBOMA	ES	AONO	FEICOM	193 424 060	13	-	-	-
57	MARCHE N° 01/M/C.AM/CIPM/2019	Travaux d'entretien de la voirie d'ABON-MBANG, tronçon Abattoir Municipal-Marché Municipale B (950 ML + bretelle 350 ML), Commune d'ABONG-MBANG	TRAV	GLOBAL TRADING COMPANY	C_ABONG-MBANG	ES	AONO	FR	194 937 975	11	-		
58	017/M/CB-OYA/SG/CIPM/2019	Travaux de construction de l'Hôtel de Ville de la Commune de BETARE-OYA	TRAV	WALTER SARL	C_BETARE-OYA	ES	AONO	FEICOM	301 254 186	12	1	1	-
59	006/M/RES/DK/P.BTRI/CDPM/2019	Travaux de construction à l'Ecole Publique de BAKOMBO dans la Commune de BATOURI	TRAV	DOUANLA ET FRERES	C_BATOURI	ES	GG	BIP	102 397 755	9	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
60	022/M/CBO/CIPM/2019	Travaux de construction de trois(03) blocs de deux (02) logements de type T4 dans la Commune de BETARE-OYA	TRAV	ZION CONSTRUCTION COMPANY	C_BETARE-OYA	ES	AONO	FEICOM	103 876 848	12	-	-	-
61	003/M/SG/ST/C.MNA/CIPM/2019	Travaux d'entretien de la route NKONZALT Carrefour MALEN III (23.00 KM) avec ouverture sur 01 KM à KABILONE et construction de deux ouvrages à PK 2+400 et PK 4+200 linéaire total 24KM dans la Commune de MESSAMENA	TRAV	GROUPEMENT MAKO'O CONSTRUCTION ET BOFAS SARL	C_MESSAMENA	ES	AONO	BA	125 899 875	13	3		
62	020/M/CBO/CIPM/2019	Acquisition d'une niveleuse pour la Commune de BETARE-OYA	AG	DOUANLA ET FRERES	C_BETARE-OYA	ES	DC	BA	189 998 998	12	1	12	-
63	021/M/CBO/SG/CIPM/2019	Travaux d'entretien et d'exploitation du bac de tauran sur le fleuve	TRAV	ETS DREAM LAND	C_BETARE-OYA	ES	DC	FR	125 076 555	12	-	10	-
64	002/AC/C.LOMIE/CIPM/SG/2019	Construction d'un pont définitif sur le tronçon LOMIE-MEPALE-ALAT MAKAY vers DJOUM (Rivière de MEPALE)	TRAV	ETS RIDLEX SERVICES	C_LOMIE	ES	GG	FR	117 985 000	8	-	7	1
65	02/M/AONO/CSPM/C2D/CLS/2019	Aménagement et sécurisation des îlots en espace vert et la construction de quelques boutiques sur certains sites face Cathédrale	TRAV	ETS LA REGIONALE DES TRAVAUX ET SERVICES	CU_BERTOUA	ES	AONO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	218 659 352	14	-	-	-
66	002/LC/CY/CDPM-NKAM/2019	Rehabilitation du Tronçon Malende-Bonabake, avec réhabilitation du pont	TRAV	ETS BEN SAMOU ET FILS	C_YABASSI	LT	AONO	BIP	250 004 951	11	2	-	3
67	Mn°013/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	L'étude du schéma directeur d'assainissement des déchets solides de la ville de Douala	SPI	ETS ERA - CAMEROUN	CUD	LT	DP	BA	376 582 218	11	-		
68	002/M/C.NDOB/CIPM/2019	Travaux de construction de l'hôtel de ville + salle des fêtes dans la commune	TRAV	EMERGENCE ENTREPRISE	C_NDOBIAN	LT	AONO	BIP	209 804 746	8	3	4	-
69	06/LC/C.NDOB/CIPM/2019	Travaux de réhabilitation du réseau électrique au centre urbain de Ndobian phase 2	TRAV	SOCIETE FOTS-ELEC	C_NDOBIAN	LT	AONO	BIP	20 972 498	9	1	-	2
70	Mn°009/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Les travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certains artères de Douala Lot:3ème	TRAV	CATRASCO SARL	CUD	LT	AONR	BA	200 000 000	12	-		
71	Mn°006/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Les travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certains artères de la ville de douala lot2: DOUALA 2ème	TRAV	NOUDICAM PLUS SARL	CUD	LT	AONR	BA	298 697 400	12	-		
72	Mn°008/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Les travaux réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certains artères de la ville de Douala lot1: DOUALA 1er	TRAV	ELECPLOMB-SC SARL	CUD	LT	AONR	BA	409 528 350	12	-		
73	Mn°029/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2019	Illumination festives des fêtes de fin d'année 2017 2018 et 2019	TRAV	NOUDICAM PLUS SARL	CUD	LT	AONO	BA	120 925 463	11	-		
74	021/M/CUD/SG/DIE/SDMAP/2019	Souscription de la police d'assurance maladies	SPI	ZENITHE INSURANCE S.A	CUD	LT	AONR	BA	650 003 426	12	2		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
75	Mn°010/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Acquisition du matériel didactique lot1 équipements du cycle de l'eau	AG	ELWE TECHNIK CAMEROUN	CUD	LT	AOIO	BAD	202 908 940	12	-		
76	Mn°011/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Acquisition du matériel didactique lot équipements béton sol et RDM	AG	ELWE TECHNIK CAMEROUN	CUD	LT	AOIO	BAD	174 984 727	12	-		
77	Mn°033/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2019	La souscription de la police d'assurance automobile	SPI	NSIA ASSURANCES	CUD	LT	AONR	BA	229 564 002	12	-		
78	022/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2020	Travaux de curage et calibrage de certains drains dans la ville de Douala. Lot 1 Curage des exutoirs du drais TONGO'OA BASSA (Denver, Mounoumé) et la vallée MALANGUE-LOGPOM	TRAV	SECA	CUD	LT	AONR	BA	204 879 258	15	-		
79	Mn°007/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	CONTROLE DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS DES OPERATEURS CHARGES DE LA GESTION DES ORDURES MENAGERES DANS LA VILLE DE DOUALA. Lot 2 : Contole et supevision de l'aménagement et de l'exploitation de la décharge de NGOMBE	SPI	"CERRID SARL" CENTRALE D'ETUDES , DE RECHERCHES D'INGENIERIE ET DU DEVELOPPEMENT DURALE SARL	CUD	LT	AONR	BA	554 999 934	13	1		
80	01/M/CAN3/SG/SIGAMP/20	Travaux d'achèvement de construction de l'hôtel de ville	TRAV	LE DISTRIBUTEUR COMPANY LTD	C_NKONGSAMBA_I II	LT	AONO	FEICOM	278 915 238	13	-		
81	015/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Travaux de curage et calibrage de certains drains dans la ville de Douala.Lot 2 : Curage des exutoires aux drains SODIKO ville, BONOMATOUMBE ville et MABANDA dans la CAD 4 et BOBONGO , NDOGPASSI III , NGODI-BAKOKO dans CAD 3	TRAV	ETS SERAYIM	CUD	LT	AONR	BM	320 037 188	13	-		
82	Mn°015/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Travaux de curage des caniveaux et des réseaux en terres de la ville de Douala Lot 3 : DEIDO , BEPANDA , NDOKOTI et NDOGBONG	TRAV	SECA	CUD	LT	AONR	BA	180 549 893	12	-		
83	Mn°014/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Travaux de curage des caniveaux et des reseaux en terres de la ville de Douala. Lot 1 : BONAPRISO , BALI et BONANJO	TRAV	SECA	CUD	LT	AONR	BA	185 960 623	12	-		
84	01/M/C/LDO/CIPM/2019	Electrification de seize localités dans la Commune de Lagdo LOT 1 DJALINGO KAPSIKI DINGALE ET BESSOUM 37097	TRAV	ETS LUMIERE	C_LAGDO	NO	AONO	BIP	370 977 091	11	1		
85	05/M/LDO/CIPM/2019	Travaux d'électrification de 16 localités dans la commune de lagdo BOUMEDJE,DJOLLA BAME ,BAME OURO LABBO III,	TRAV	ETS MOBEL TECHNOLOGY	C_LAGDO	NO	AONO	BIP	340 636 367	12	-		
86	04/M/C/LDO/CIPM/2019	Travaux d'électrification de 16 localités NELBI, KAIWANG I, KAIWANG II, TONGO	TRAV	ETS HAFI CONCEPT	C_LAGDO	NO	AONO	BIP	296 947 171	12	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
87	02/M/C/LDO/CIPM/2019	Travaux d'électrification de 16 localités dans la commune de Iagdo LOUGOL BAME ,MAYO LADDE BAME,OURO BOGNO	TRAV	ETS ZAKAR ET FRERES	C_LAGDO	NO	AONO	BIP	221 158 941	12	-		
88	03/M/C/LDO/CIPM/2019	Travaux d'électrification de 16 localités dans la commune de Iagdo département de la Bénoué Région du Nord BAKONA 2,MEIDJADOU,	TRAV	GENERALE DES PRESTATIONS DE SERVICES (GEPSE)	C_LAGDO	NO	AONO	BIP	352 236 476	12	-		
89	02/M/RN/D47/CIPM/C-TCH/2020	Construction de l'hôtel de ville de TCHOLLIRE.	TRAV	ETS ADIS	C_TCHOLLIRE	NO	AONO	FEICOM	309 193 200	12	-		
90	001 /M/CRB/SG/2020	Travaux de construction de 24 boutiques au marché de REY-BOUBA.	TRAV	ETS ADIS	C_REY BOUBA	NO	AONO	FEICOM	108 312 999	10	-		
91	004/LC/CUG/CIPM/2019	CONTROLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION D'EPURATION TYPE LAGUNAGE A GAROUA	TRAV	ETS Hafa CONCEPT	CU_GAROUA	NO	AONO	BIP	162 000 000	12	1		
92	002/C/B.IIIC/B.IIICITB/2019	REHABILITATION OF SOME ROADS IN BAMENDA III COUNCIL	TRAV	BIG ANDRE SERVICE	C_BAMENDA_III	NW	AONO	BIP	277 773 325	11	-		
93	12/LC/C MDA/CIPM/2019	Elaboration du Plan d'occupation des sols (POS) de MBOUDA	SPI	LE COMPETING	C_MBOUDA	OU	AONR	BIP	108 849 702	15	-		
94	002/M/CPB/SG/CIPM-AG/2019	Construction de 35 unités de logements sociaux (FEICOM)	TRAV	GROUPE SERPOFRA SARL	C_PETE_BANDJOUN	OU	AONO	FEICOM	599 998 880	13	4		
95	02/LC/MINDDEVEL/C.BASSAMBA/CDPM/-NDE/2019	Case communautaire de BASSAMBA: Achèvement travaux de construction	TRAV	NGWATRA ENTERPRISE LTD	C_BASSAMBA	OU	AONO	BIP	349 999 383	12	1		
96	02/M/C.BYGAM/SG/SIGAM/CDPM/2019	Exécution des travaux de réhabilitation, entretien courant et/ou périodique de certaines routes Communales dans le Département du Koung-Khi.	TRAV	NEBAN ENTERPRISE	C_BAYANGAM	OU	AONO	BIP	356 595 064	12	-		
97	01/M/C/BFG/CIPM-TBEC/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS IMMEUBLES DE HUIT LOGEMENTS CHACUN DANS LA COMMUNE DE BAFANG	TRAV	ETS ECODIS CAMEROUN	C_BAFANG	OU	AONO	FEICOM	512 829 888	11	-		
98	001/gg/minddevel/c/baham/cdpmotbec/2019	ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE L'HÔTEL DE VILLE DE BAHAM DANS L'ARRONDISSEMENT DE BAHAM, DÉPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX, RÉGION DE L'OUEST	TRAV	SIKABAT BTP	C_BAHAM	OU	GG	FEICOM	264 980 830	6	2		
99	01/M/CIPM/C.TGA/2019	Pour les travaux de construction de l'hôtel de ville de la Commune de Tonga	TRAV	EGC GRAPHICS SARL	C_TONGA	OU	AONO	FEICOM	296 296 000	13	-		
100	02/M/CU/BFM/CIPM/2020	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU PARC DE LOISIRS DE LA VILLE DE BAFUSSAM DANS LE CADRE DU PROGRAMME URBAIN CAPITALES REGIONALES	TRAV	ETS 2 EC	CU_BAFUSSAM	OU	AONO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	538 425 844	12	5		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
101	003/M/CU/BFM/CIPM/2020	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET LA CONSTRUCTION DE CINQ EQUIPEMENTS MARCHANDS DE LA VILLE DE BAFOUSSAM DANS LE CADRE DU PROGRAMME CD2 URBAIN CAPITALES REGIONALES	TRAV	SOCIETE BUNS SARL	CU_BAFOUSSAM	OU	AOIO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	755 771 658	11	-		
102	004/M/CU/BFM/CIPM/2020	TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE CONSTRUCTION DE CINQ EQUIPEMENTS MARCHANDS DE LA VILLE DE BAFOUSSAM DANS LE CADRE DU PROGRAMME C2D URBAINS CAPITALES REGIONALES	TRAV	SOCIETE BUNS SARL	CU_BAFOUSSAM	OU	AOIO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	1 168 158 771	12	-		
103	01/M/CU/BFM/CIPM/2019	ELABORATION EN URGENCE DU PLAN DE SECTEUR DE KOUEKONG DE BAFOUSSAM 1	SPI	HUMAN TECHNOLOGY RESOURCES CAMEROON ..	CU_BAFOUSSAM	OU	AONR	BIP	145 891 881	12	5		
104	01/M/C-BANGOU-RTE/2019	EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES COMMUNALES DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANGOU DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX REGION DE L'OUEST LONGUEUR 14300 km LOT 1	TRAV	EDGE	C_BANGOU	OU	GG	FR	333 504 925	7	1		
105	002/M/CB/SG/CIPM/2019	exécution des travaux de construction des ouvrages de franchissement (04 ponts) dans la commune de Bamendjou LOT1	TRAV	ETS MUNALO	C_BAMENDJOU	OU	GG	FR	186 394 261	7	4		
106	001/M/MINDDEVEL/C-BAH/CIPM/SG/ST/2019	EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES TRONÇONS DE ROUTES DANS LA COMMUNE DE BAHAM	TRAV	HEZ	C_BAHAM	OU	GG	FR	223 039 607	8	4		
107	001/C.FE/CIPM/2019	CONSTRUCTION D'UN PONT DÉFINITIF SUR LA RIVIÈRE TALEP LAP CARREFOUR LINGANG-LAP ZINKEM	TRAV	ETS ANUTEMEH JOHNSON FRU	C_DSCHANG	OU	GG	FR	124 314 038	11	1		
108	12/M/C-FE/CIPM/2019	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONCON D ROUTE COMMUNALE TOUFFAN FOTCHOUFFEU-BANDOUM-NDOUNDE(11KM) ET CONSTRUCTION D'1 PONT DÉFINITIF DE PORTE 6ML SUR LA RIVIÈRE MBOUH DANS L'ARRONDISSEMENT DE FOKOUE	TRAV	ETS ANUTEMEH JOHNSON FRU	C_FOKOUE	OU	GG	BIP	264 488 147	11	-		
109	02/M/C-NK.ZEM/CIPM/2019	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CINQ TRONÇONS DE ROUTES EN TERRE DE LA COMMUNE (LOT 01) ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DE 5,00mm DE PORTÉE SUR LA RIVIÈRE FONDOUNLAH AU PK 1+500 DU TRONÇON MARCHÉ MAYABALEFE ET CONSTRUCTION D'UN DALOT SUR LE COUR D'EAU PANTSIS(LOT 02)	TRAV	ETS STEVEN & CO	C_NKONG_ZEM	OU	GG	FR	127 482 046	10	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
110	002/M/CAB/M/SG/CIPM/CMP/C-ZOE/2019	Equipement de l'hôtel de ville de Zoétélé en matériel et mobilier de bureaux	AG	ETS GENERATION NUMERIQUE	C_ZOETELE	SU	AONO	BIP	119 595 825	8	-		
111	016/DA/RS/DDL/CMYSLA/CIPM/STECH/2019	Réhabilitation de certaines routes communales	TRAV	SDR CAM- SARL	C_MEYOMESSALA	SU	AONO	BIP	1 262 792 198	8	-		
112	009/M/RS/DDL/C-MYSLA/CIPM/2019	Réhabilitation de la voirie urbaine Commune de Meyomessala	TRAV	TRUST CONTRACTORS AND ENGINEERS	C_MEYOMESSALA	SU	AONO	BIP	250 000 000	9	-		
113	004/M/C-BBANE/CIPM/2019	réhabilitation de certaines routes en terre dans le département de la mvila, arrondissement de biwong bane	TRAV	ETS FIRST PRINT SERVICE	C_BIWONG BANE	SU	AONO	FR	154 006 665	12	-		
114	009/M/C-BBULU/CIPM/2019	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA ROUTE NKPWAELSAE-ONDONDO NGOE DANS L ARRONDISSEMENT DE BIWONG BULU	TRAV	ETS FIRST PRINT SERVICE	C_BIWONG BULU	SU	AONO	FR	161 620 000	12	-	-	-
115	017/DA/RS/DDL/C-MYSLA/CIPM/2019	SURVEILLANCE ET CONTRÔLE RÉHABILITATION DE CERTAINES ROUTES COMMUNALE	SPI	INA3GES	C_MEYOMESSALA	SU	AONO	BIP	130 000 000	8	-		
116	010/M/CS/CIPM-CS/2019	CONSTRUCTION 10 HANGARS COMMUNAUTAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE SANGMELIMA	TRAV	ETS LE BATI	C_SANGMELIMA	SU	AONO	FEICOM	119 049 157	11	-	2	-
117	N°019/M/CS/CIPM-CS/2019	ACQUISITION INSTALLATION ET MISE EN EXPLOITATION DES EQUIPEMENT D'IMAGERIE MEDICALE A L'HOPITAL DE REFERENCE DE SANGMELIMA	TRAV	JACO SA.	C_SANGMELIMA	SU	AONO	BIP	212 442 500	12	1	3	-
118	N001/C/KCC/SWR/KCCITB/19	FOR THE CONSTRUCTION OF A GRAND STAND IN THE KUMBA CITY COUNCIL MUNICIPALITY	TRAV	ETS HIKLASS GROUP	CU_KUMBA	SW	AONO	BIP	149 999 999	13	-		
119	23/LC/GG/CUY/CIPM/2019	MAÎTRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE LA RUE JOSEPH ESSONO ELA TRONÇON SONEL CENTRAL - PALAIS DE JUSTICE MINFI-ROND POINT MINESEC	SPI	ICE CAMEROUN	CUY	CE	GG	BA	42 000 000	8	-	-	-
120	19/LC/CUY/CIPM/2019	MAÎTRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA BLOC A DE QUATRE BÂTIMENTS DE 10 BOUTIQUES	SPI	CABINET D'INGENIEURS ASSOCIES DU CAMEROUN	CUY	CE	GG	BA	26 016 718	10	2	7	2
121	17/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA BLOC A DE QUATRE BÂTIMENTS DE 10 BOUTIQUES (LOT4)	TRAV	ETS LE FIROME ENTREPRISE	CUY	CE	GG	BA	79 623 704	10	1	-	-
122	21/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA BLOC A DE QUATRE BÂTIMENTS DE 10 BOUTIQUES (LOT2)	TRAV	ETS LE CONSTRUCTEUR	CUY	CE	GG	BA	79 931 751	10	1	-	-
123	18/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA BLOC A DE QUATRE BÂTIMENTS DE 10 BOUTIQUES (LOT1)	TRAV	EDITIONS AJEANUL BM	CUY	CE	GG	BA	79 705 806	10	1	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
124	19/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA BLOC A DE QUATRE BÂTIMENTS DE 10 BOUTIQUES (LOT3)	TRAV	SODIREC SARL	CUY	CE	GG	BA	75 708 995	10	1	-	-
125	22/LC/GG/CUY/CIPM/2019	MAÎTRISE D'ŒUVRE DU PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU TALUS ET DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT À LA RUE 1343 (CHAPELLE KONG-SAPEUR MIMBOMAN	SPI	ICE CAMEROUN	CUY	CE	GG	BA	15 000 000	9	-	7	-
126	30/LC/CUY/CIPM/2019	SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE PAR LA CUY	SPI	SUNU ASSURANCES IARD CAMEROUN	CUY	CE	GG	BA	39 500 673	7	-	-	-
127	013/LC/CAK/SG/CIPM/MAK/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP BILINGUE D'AKONO	TRAV	ETS GROUPE POLYVALENT	C_AKONO	CE	GG	BIP	16 500 000	7	-	-	1
128	03/M/CM/FEICOM/CIPM/2019	EQUIPEMENT EN MOBILIER DE BUREAU DE L'HOTEL DE VILLE DE MONATELE	AG	ETS SYLTHILAU	C_MONATELE	CE	GG	BIP	63 990 845	12	3	6	1
129	008/LC/C-NDI/CIPM/2019	EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CANTONNAGE DU TRONÇON DE ROUTE BITUMÉE	TRAV	ETS BEAUX ARTS	C_NDIKINIMEKI	CE	GG	FR	7 214 625	7	1	5	-
130	009/M/C-NDI/CIPM/2019	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE INTER N4 (CSI BOUTOUROU) - NEPETA D'UN LINÉAIRE TOTAL DE 8.50KM	TRAV	ETS DECENT HIGHLAND ENTERPRISE	C_NDIKINIMEKI	CE	GG	FR	92 618 748	8	1	-	-
131	017/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA A YDE LOT 4	TRAV	ETS TOYS LAND	CUY	CE	GG	BIP	79 623 704	-	1	-	-
132	011/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA A YDE LOT 3	TRAV	TOYS LAND SARL	CUY	CE	GG	BIP	79 705 806	-	-	-	-
133	021/M/CUY/CIPM/2019	TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA A YDE LOT 2	TRAV	ETS TOYS LAND	CUY	CE	GG	BIP	79 931 751	-	-	-	-
134	030/LC/GG/CUY/CIPM/2019	SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE PAR LA CUY	SPI	AGENT GENERALE SAAR ASSURANCE	CUY	CE	GG	BIP	39 500 000	-	-	-	-
135	019/LC/CUY/CIPM/2019	MO DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU MARCHÉ D'ÉLIG EDZOA A YDE	SPI	CABINET INGENIEURS ASSOCIES	CUY	CE	GG	BIP	26 016 718	-	-	-	-
136	023/LC/C.TOK/CIPM-ROUTE/2019	Travaux d'aménagement des routes communales: makalingai-Gogare (5,70 km) lot 1 GG	TRAV	TARMAK BUSINESS SARL	C_TOKOMBERE	EN	GG	FR	26 287 375	7	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
137	001/LC/C.MMA/CIPM/2019	Réalisation de deux forages équipés en PMH dont un à KAGNOL (Village BANGACHOU) et un à BENGEND (Village SHIAFOUM) dans la Commune de MBOMA	TRAV	ETS MB & FILS	C_MBOMA	ES	GG	BIP	15 995 909	6	-	6	-
138	MARCHE N° 001/M/C.LMIE/CIPM/2019	Construction d'un pont définitif sur le tronçon LOMIE-MEPALE-ALAT MAKAY (Rivière de MIENNE)	TRAV	ETS RIDLEX SERVICES	C_LOMIE	ES	GG	FR	68 710 000	7	-	8	1
139	018/M/C/MROU/CIPM/2019	Construction d'une digue sur la rivière BITOUMO, située au PK 15+500 du tronçon NOH EKON - MAYANG dans la Commune de MINDOUROU	TRAV	MAFRA GUY SARL	C_MINDOUROU	ES	GG	FR	74 894 716	8	-		
140	008/LC/CY/CDPM/NKAM/2019	Lampadaires solaires à SOLLE	TRAV	ETS BEN SAMOU ET FILS	C_YABASSI	LT	GG	BIP	15 000 000	12	-	-	3
141	015/LC/C.PENJE/SG/2019	Travaux de construction d'un centre multifonctionnel pour la promotion des jeunes de NJOMBE-PENJA	TRAV	ETS KUNDUNA	C_PENJA	LT	GG	BIP	49 996 040	7	-	-	-
142	019/M/C.DOM/SG/2019	Entretien du tronçon de route NDEBI-BIKO`O-IBONG (16km)	TRAV	ETS BG & FRERES	C_NDOM	LT	GG	FR	80 370 923	7	-	3	-
143	012/LC/C.DIBA/SG/2019	Travaux de réhabilitation du réseau NKOM - POUT NJOUMA	TRAV	ETS AWAH	C_DIBAMBA	LT	GG	BIP	8 989 342	6	-	7	2
144	001/LC/C/BATIE/SG/CDPM-RTE/2019	Réhabilitation des routes communales	TRAV	ETS BATILUX	C_BATIE	OU	GG	BIP	27 777 700	8	7		
145	07/LC/CABAF2/CIPM/BEC/2019	CMA de TYO : Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment (R+1)	TRAV	GROUPE NACHEB	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	BIP	49 999 500	7	1		
146	004/M/CABAF3/CIPM/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE MBANG LOT3	TRAV	ETS MP3	C_BAFOUSSAM_III	OU	GG	FR	62 625 546	11	1		
147	002/M/CABAF3/CIPM/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT SUR LA RIVIERE MEWOU LOT2	TRAV	NGWATRA ENTERPRISE LTD	C_BAFOUSSAM_III	OU	GG	FR	79 364 011	12	1		
148	003/M/CABAF3/CIPM/2019	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE TCHIPOU LOT 1	TRAV	ETS ERBA.T.P	C_BAFOUSSAM_III	OU	GG	FR	46 998 446	12	1		
149	0004/M/MINMAP/DRO/DDN DE/CIPM-BASSAMBA/C-BASSAMBA/2019	pour l'exécution des travaux d'entretien de certaines routes communales dans la commune de Bassamba	TRAV	GROUPE GALANT & FRIEND SARL	C_BASSAMBA	OU	GG	FR	99 944 861	6	-		
150	001/M/C-BANGOU-RTE/2019	TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES ROUTES COMMUNALES DANS L'ARRONDISSEMENT DE BANGOU DEPARTEMENT DES HAUTS PLATEAUX REGION DE L'OUEST LONGUEUR 1000 km LOT 2	TRAV	EDGE	C_BANGOU	OU	GG	FR	83 455 920	7	1		
151	010/M/CB/SG/CIPM/2019	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT (03 DALOTS ET QUATRE PONTS) DANS L'ARRONDISSEMENT DE BAMENDJOU	TRAV	ETS POWER AND SON	C_BAMENDJOU	OU	GG	FR	41 693 020	9	2		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
152	07/LC/MINDEVEL/C-BAH/SG/ST/CIPM/2019	Travaux d'aménagement des sites touristiques (Fovu, Kanmanli, Vac-vac) en procédure d'urgence	TRAV	ETS TEKA	C_BAHAM	OU	GG	BIP	30,000,000	9	4		
153	08/LC/C/BATIE/SG/CIPM-TBEC/2019	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école publique de Banagou II (lot 2)	TRAV	ETS NZALI	C_BATIE	OU	GG	BIP	16,000,000	7	6		
154	007/LC/C/BATIE/SG/CIPM-TBEC/2019	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'école maternelle de Batié-Col (lot 1)	TRAV	ETS WILLIAM CONSTRUCTION	C_BATIE	OU	GG	BIP	15,999,987	5	5		
155	003/LC/DDMP-MB/CDPM/C-DIR/CDPM/2020	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'Ecole Publique de Goro	TRAV	ETS KL.	C_DIR	AD	AONO	BIP	17,700,125	12	1	2	2
156	001/LC/DDMP-MB/CDPM/C-DIR/CDPM/2020	Ecole Publique de Malingara : Construction d'un bloc de 2 salles de classe	TRAV	ETS KL.	C_DIR	AD	AONO	BIP	17,700,125	12	1	2	2
157	002/LC/CIPM-DJ/C-DJ/2020	EM de Yamba : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	ETS VINA EXPRESS	C_DJOHONG	AD	AONO	BIP	179,995,000	12	1	-	-
158	09/LC/C-MGA/CIPM/2020	COMMUNE DE MEIGANGA : Construction Poste agricole de Gunbela	TRAV	ETS SOULEYMANOU H.	C_MEIGANGA	AD	AONO	BIP	19,997,443	12	2	1	1
159	001/M/AONO/C.MGA/CIPM/2020	Travaux d'entretien de la voirie urbaine des tronçons Hôpital Ecole Privée Catholique et Carrefour Parquet-Vedette long de 02 KM (Phase I)	TRAV	GENERALE DES PRESTATIONS DE SERVICES (GEPSE)	C_MEIGANGA	AD	AONO	FR	139,870,710	12	1	-	-
160	002/M/C-MGA/CIPM/2020	Travaux de construction d'un pont sur le fleuve LOM à WAKASSO	TRAV	ETS ALVINE COMPAGNY	C_MEIGANGA	AD	AONO	BIP	212,462,954	12	-	2	-
161	03/M/R-AD/C-MGA/CIPM/2020	Exécution des travaux de construction d'un marché moderne à NGASSIRI dans la Commune de MEIGANGA	TRAV	ETS IBM	C_MEIGANGA	AD	AONO	OFID	44,588,178	12	-	-	-
162	001/M/CAY1ER/SMP/2020	Réhabilitation du tronçon de route Hopital Déo GraciaAbal Yeye et bretelles	TRAV	GROUPE FIXIT SARL	C_YAOUNDE_I	CE	AONO	BA	238,922,228	12	-		
163	0003/M/CAY2/CIPM/SMP/2020	Travaux d'aménagement des voies de mobilité et de connectivité au quartier Etetack	TRAV	ETS REGAL SHOP	C_YAOUNDE_II	CE	AONO	BA	220,997,797	12	-	-	-
164	002/M/CAY2/CIPM/SMP/2020	Travaux d'aménagement du quartier Nkomkana I	TRAV	ERICO & BROTHERS COMPANY SARL	C_YAOUNDE_II	CE	AONO	BA	198,993,668	11	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
165	09/LC/C.DZENG/CIPM/2020	Construction et équipement des cases touristiques et construction des miradors	TRAV	ETS AFU ET FRERES	C_DZENG	CE	AONO	BIP	119,889,381	15	4	-	-
166	001/M/J12/SEAF/CDPM/2020	achèvement des travaux d'aménagement de la route N3 (station green oil)- carrefour zoatoupsi - hôpital d'ekanga -carrière eloumden l-inter N22 et bretelles dans l'arrondissement de mbankomo	TRAV	ETS LE FIROME ENTREPRISE	C_MBANKOMO	CE	AONO	BIP	249,975,171	12	-	-	-
167	009/M/RCE/DNK/CESEKA/2020	TRAVAUX D'ADDUCTION EN EAU POTABLE DANS CERTAINS LOCALITES DE L'ARRONDISSEMENT D'ESEKA	AG	ETS MBEKE & FILS	C_ESEKA	CE	AONO	BIP	197,477,404	14	1		
168	23/M/V.Y/CIPM/2020	ACQUISITION DU VÉHICULE DE FONCTION POUR LE CHEF DE exécutif ET DES véhicules DE SERVICES POUR LA MAIRIE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CUY	CE	AONO	BA	173,000,000	10	1		
169	23/M/VY/CIPM/2020	ACQUISITION DU VÉHICULE DE FONCTION POUR LE CHEF DE exécutif ET DES véhicules DE SERVICES POUR LA MAIRIE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CUY	CE	AONO	BA	173,000,000	9	1		
170	02/M/C-MBNA/CIPM/2020	Achèvement de l'hôtel de ville de Mbangassina	TRAV	ETS DIM'S AQUINAL	C_MBANGASSINA	CE	GG	FEICOM	136,595,333	9	-	-	1
171	001/M/C.SOA/CIPM/2020	TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES A SOA	TRAV	ETS HEDC	C_SOA	CE	AONO	BIP	139,661,390	13	1		
172	08/M/C.EBDA/CIPM/20	ENTRETIEN DE CERTAINES ROUTES EN TERRE EBEBDA EBOMZOUT NKOLELOUGA POLO BRETELE CR MBILMANA 2 MBIMANA 1	TRAV	ETS TDP & CIE	C_EBEBDA	CE	GG	BIP	135,082,315	12	-		
173	001/M/CAK/SG/CIPM/2020	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN PONT DEFINITIF SUR LA RIVIERE OSSOE KOBOK DE PORTEE NEUF METRE LINEAIRE (9ml)	TRAV	ETS LE FIROME ENTREPRISE	C_AKONO	CE	AONO	BIP	109,500,120	12	-		
174	498/LC/V.Y/CIPM/2020	TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE l'éclairage PUBLIC DANS LA VILLE DE YAOUNDÉ	TRAV	CEGELEC S.A	CUY	CE	AONO	BM	219,996,206	12	-		
175	87/M/V.Y/CIPM/2020	TRAVAUX d'éclairage PUBLIC DANS LA VILLE DE YAOUNDE	TRAV	INDUSTRIAL FORESTRY CORPORATION (I.F.C SARL)	CUY	CE	AONO	BA	850,000,000	12	-		
176	03/M/CAYOS/CIPM/2021	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L ECLAIRAGE PUBLIC EN LAMPADAIRES SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES AUTONOMES DANS LA COMMUNE D AYOS	TRAV	BATRATTEL SARL	C_AYOS	CE	AONO	BIP	183,578,873	14	1		
177	100/M/V.Y/CIPM/2020	CONSTRUCTION DE HANGARS AU MARCHE SHO A YAOUNDÉ	TRAV	ETS LE PRINTEMPS	CUY	CE	AONO	BA	160,000,000	10	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
178	009/M/MINDDEVEL/RCE/DHS/CNKO/SG/20	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ADDUCTION EN EAU POTABLE AU CENTRE VILLE DE NKOTENG	TRAV	ETS MBIAKOP & FILS	C_NKOTENG	CE	AONO	FEICOM	557,059,865	13	-		
179	002/M/CKOBD/SG/CIPM/2021	TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC DE CERTAINES ARTERES DE LA VILLE DE KOBDOMBO PAR LA FOURNIURE ET INSTALLATION DE 100 LAMPADAIRES SOLAIRES ALL IN ONE PU	TRAV	ETS DEVITKO	C_KOBDOMBO	CE	AONO	FEICOM	139,301,691	11	2		
180	002/M/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/2021	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BAC DE 60 TONNES A MBANKOMO	TRAV	UNDERWATER PROFESSIONALS	C_MBANDJOCK	CE	AONO	FR	349,168,819	10	-	-	-
181	01/M/AONO/CIPM/COKI/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE LA C-KIIKI	TRAV	YOUNG BRIGHT SARL	C_KIIKI	CE	AONO	BA	257,557,748	12	-		
182	421/M/V.Y/CIPM/2020	FOURNITURE DES VÉHICULES DE SERVICES A LA MAIRIE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CUY	CE	AONO	BA	231,000,000	11	-		
183	16/LC/AC/CIPM/CMNE-GDG/R/2020	CONSTRUCTION DE DEUX DALOTS QUADRUPLES DANS LOCALITÉ GUEGO	TRAV	ETS SADJO BABA	C_GUIDIGUIS	EN	AONO	BIP	114,528,544	6	-		
184	004/M/C.MERI/CIPM/TR/2020	Travaux d'entretien du tronçon de route TCHERE-GARE-KATCHOUNGA-DOGBA MOULVOUNG (11,300KM) dans la Commune de Méri	TRAV	TARMAK BUSINESS SARL	C_MERI	EN	GG	FR	103,079,670	9	-		
185	01/M/K23/CDPM/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DE CERTAINES VOIES D'ACCES AU SIEGE DU PROLAC, AU QUARTIER RESIDENTIEL A KOUSSERI	TRAV	ETABLISSEMENT AHMAT TOM	C_KOUSSERI	EN	AONO	BIP	340,000,000	12	-		
186	009/LC/CDKO/M/SG/ST/2020	COMMUNE DE DIMAKO: Construction de l'auberge municipale de DIMAKO	TRAV	ISIR SARL	C_DIMAKO	ES	AONO	BIP	100,000,000	12	3	12	3
187	12/M/CGB/CIPM/SG/ST/2020	Aménagement et valorisation du site Ecotouristique dénommé Source de la Kadey	TRAV	ETS SAIBOU ALIOU	C_GAROUA-BOULAI	ES	AONO	BIP	199,358,643	12	1		
188	001/LC/C.LOMIE/CIPM/2020	Travaux d'entretien de la voirie dans le cadre des projets transférés aux CTD Fonds Routiers dans la Commune de LOMIE	TRAV	ETS OUMBA	C_LOMIE	ES	AONO	FR	245,394,439	11	-		
189	007/M/C.AM/CIPM/2020	Entretien de la voirie dans le cadre des projets transférés aux CTD Fonds Routiers 2020 de la Commune d'ABONG-MBANG	TRAV	ETS GLOBAL TRADING	C_ABONG-MBANG	ES	AONO	BIP	166,954,770	12	-		
190	03/M/CUB/CSPM/C2D-CR/CLS/2020	Travaux d'aménagement des voies piétonnes au marché central de BERTOUA	TRAV	AMBA GROUPE SARL	CU_BERTOUA	ES	AONO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	109,244,703	14	-		
191	02//M/CUB/CSPM/C2D-CR/CLS/20	Travaux d'aménagement des voies piétonnes au marché central de BERTOUA Lot2 : Rue marché historique-Sous-Préfecture Bertoua 2	TRAV	ETS SALEOMIR SERVICES	CU_BERTOUA	ES	AONO	BIP	238,181,934	13	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
192	006/M/CBO/SG/CIPM/2020	Acquisition d'une niveleuse de type 921 pour la compte de la Commune de BETARE-OYA	AG	TRACTAFRIC EQUIPMENT CAMEROUN	C_BETARE-OYA	ES	GG	BA	140,000,000	7	2	16	7
193	006/M/SG/ST/C.ATOK/CIPM/2020	Travaux de construction des VRD et construction de la clôture de l'hôtel de Ville d'ATOK	TRAV	ETS LA REGIONALE DES TRAVAUX ET SERVICES	C_ATOK	ES	AONO	FEICOM	113,705,346	13	-		
194	008/M/C-ATOK/SG/CIPM/2020	Travaux de construction d'un pont sur le bras mort du NYONG à ATOK MAKAKA avec renforcement de la digue y compris l'aménagement de l'accès au site des travaux dans la Commune d'ATOK	TRAV	J & H SARL	C_ATOK	ES	AONO	FR	259,324,630	12	-		
195	003/M/SG/ST/C.NKA/CIPM/2020	Travaux de construction de l'auberge municipale de la Commune de NGUELEMENDOUKA	TRAV	ETS TALMA	C_NGUELEMENDOUKA	ES	AONO	FEICOM	165,632,832	11	-		
196	018/M/CNGRA/SG/CIPM/2020	Travaux d'entretien et d'exploitation d'un bac de capacité 60 tonnes sur le fleuve KADEY à COLOTNINE dans la Commune de NGOURA	TRAV	ETS ASONA	C_NGOURA	ES	AONO	FR	346,542,215	12	-	10	1
197	0014/LC/CAD2/CIPM/ST/2020	CONSTRUCTION MAISON DE LA JEUNE FILLE DE DOUALA 2ème PHASE 2	TRAV	CSR - CAMEROUN SERVICES & REALISATIONS	C_DOUALA_II	LT	AONO	BA	290,000,000	9	-	-	4
198	08/LC/CIPM/C.BARE/20	Ancienne route bitumée (Eboum-Village BAREHOCH (chefferie 5Km) : Ouverture de la piste agricole	TRAV	ETS WAYIT	C_BARE_BAKEM	LT	AONO	BIP	118,218,657	11	1	-	-
199	024/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2020	Illuminations festives des fêtes de fin d'année	AG	CATRASCO SARL	CUD	LT	AONO	BA	130,869,959	10	-		
200	Mn°018/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	Réhabilitation des espaces de parkings dans la ville de Douala	TRAV	SMAR SARL	CUD	LT	AONO	BA	279,786,753	11	-		
201	Mn°016/M/CUD/SG/DIE/SDP MAP/2020	MISE EN FONCTIONNEMENT DE LA CENTRALE D'EMULSION DE BITUME DE BONAMOISSADI ET LA VIBILISATION DU SITE . Lot 1 Mise en fonction de la Centrale d'émulsion de bitume de Bonamoussadi	TRAV	CAMEROUN EMULSION SARL	CUD	LT	AONO	BA	129,659,684	9	-		
202	016/LC/CY/DN/CIPM/2020	Travaux de réhabilitation de l'axe NKOLBONG-MASSOUMBOU village dans la commune de YABASSI	TRAV	ETS BEN SAMOU ET FILS	C_YABASSI	LT	AONO	BIP	276,244,999	12	-	-	3
203	006/M/RLT/DSM/CBA/CIPM/2020	Construction d'un pont sur la rivière WEMAKOULOU sur la bretelle RN3-Logbadjeck	TRAV	ETS JOHN VAN SHIP BUSINESS	C_DIBAMBA	LT	AONO	BIP	152,799,795	10	-		
204	01/M/CTD-MANJO-FEICOM/SG/2020	Les travaux de construction de cinq blocs de douze boutiques au marchés central de MANJO	TRAV	ETS 5 A ENTREPRISE	C_MANJO	LT	AONO	FEICOM	141,063,776	13	-	-	4
205	MARCHE N°04/M/CAN 1ER/SG/ST/2021	Les travaux de réhabilitation du tronçon de la route carrefour boîte de boulogne-ekang mbeng-ngalmoa	TRAV	ROU'D'AF SA	C_NKONGSAMBA_I	LT	AONO	FR	164,985,578	12	-	11	2

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
206	MARCHE N°03/M/CAN1ER/SG/ST/2021	Les travaux de réhabilitation de la voirie revetue dans la commune d'arrondissement de nkongsamba 1: tronçon de la route carrefour jean sa' a-carrefour quartier 6	TRAV	ROUTD'AF SA	C_NKONGSAMBA_I	LT	AONO	FR	109,695,416	12	-	4	-
207	MARCHE N°02/M/CAN1er/SG/ST/2020	Les travaux d'achèvement de construction de l'hotel de ville de NOKONGSAMBA 1 ER	TRAV	CSR - CAMEROUN SERVICES & REALISATIONS	C_NKONGSAMBA_I	LT	AONO	FEICOM	429,979,725	12	-	4	3
208	001/M/C/EBONE/SG/2020	Les travaux d'entretien du tronçon de route communal ebone-mangamba-balong-banalebe	TRAV	ETS KABIRO	C_EBONE	LT	AONO	FR	160,545,977	12	-	-	8
209	017/LC/CA-GRA1/CIPM/2020	Construction CSI de LOMODOU type II	TRAV	ETS MIYETI ALLAH	C_GAROUA_I	NO	AONO	BIP	346,251,222	12	2		
210	007/M/C-GASCHIGA/CIPM/2020	Construction de l'hôtel de ville de Gaschiga	TRAV	ETS ABOU	C_GASHIGA	NO	AONO	FEICOM	337,197,887	12	-	1	-
211	LC/RN/D42/COMMUNE-GUIDER/SCPM/2020	Construction de la clôture du Marché Central de Guider	TRAV	ETS HB	C_GUIDER	NO	AONO	BIP	399,523,000	12	1	1	-
212	006/LC/RN/D47/C-TBRO/CIPM-TBRO/SG/2021	Construction de 01 forage à énergie solaire à NOG-NAH, MBAKA, NGOUMI, DJACKONE, LOUNDJONGUE et GOLOMBALI (lot 4).	TRAV	ETS ABOU	C_TOUBORO	NO	AONO	FEICOM	105,000,000	10	-		
213	001/M/CA-GRA1er/CIPM	Travaux d'entretien de la voirie prioritaire de Garoua 1er (TROCON MORGUE HRG-CARREFOUR 3 EGLISES-CARREFOUR SOWETO-ALIMENTATION LES BOURGEOIS)	TRAV	ETS KESSOUM	C_GAROUA_I	NO	AONO	BIP	523,750,981	12	-		
214	04/JO/MINDDEVEL/MEZAM/B AFUT/BCITB/2020	CONSTRUCTION OF A BLOCK OF TWO CLASSROOMS AT GS TABEWE	TRAV	ETS CHESI CHENWI AFANWI	C_BAFUT	NW	AONO	BIP	166,184,255	12	-		
215	08/LC/SG/CBKOU/CIPM-TBEC/2020	Renforcement de l'éclairage public avec les lampadaires (Bakou-Komako)	TRAV	ETS KOLE	C_BAKOU	OU	AONO	BIP	100,000,003	11	1		
216	01/LC/SG/CBKOU/CIPM/2020	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE TRONCON INTER R061 FONDJANTI-BAKAMBE (6,4km)MISSION CATHOLIQUE BAKOU-BALACK-LOUL 2 (7,0 KM)	TRAV	ETS KOLE	C_BAKOU	OU	AONO	BIP	276,999,999	11	1		
217	001/M/CPB/SG/CIPM-BEC/2020	Construction d'un centre commercial de 34 boutiques en contrebas de la gendarmerie	TRAV	NGWATRA ENTERPRISE LTD	C_BANDJOUN	OU	AONO	BIP	100,000,000	12	3		
218	09/LC/CABAF3/CIPM/2020	REHABILITATION DE LA ROUTE CARREFOUR SCS (KAMKOP-SOUS PREFECTURE BAMOUGUOM-LIMITE BASSOSSA) AVEC CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ARTS (LOT 1)	TRAV	ETS PROFAJOCAM	C_BAFOUSSAM_III	OU	AONO	BIP	125,442,256	13	5		
219	002/LC/2020C.BGRAIN/SG	Extension électrique MT/BT des quartiers Manki et Njipaghah (LOT1)	TRAV	ETS MOUCHILI	C_BANGOURAIN	OU	AONO	BIP	393,666,772	11	4		
220	09/LC/R-OU/D-NOUN/C.FBOT/CIPM-TBEC/2020	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPB Kouonja (LOT2)	TRAV	NSANKA ENGIN SARL	C_FOUMBOT	OU	AONO	BIP	169,999,600	12	1		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
221	03/M/PR/MINMAP/DRO/DD NDE/C-BGTE/SPM/CIPM/2020	pour l'entretien des voiries dans le cadre des projets transférés aux CTD Fonds Routiers MINH DU 2020	TRAV	SOGEMARCAM SARL	C_BANGANGTE	OU	AONO	FR	491,983,726	12	-		
222	003/M/CPB/SG/CIPM-RIR/2020	EXECUTION DES TRAVAUX DE BITUMAGE ECONOMIQUE EN ENDUIT BICOUCHE DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR SIM DZEDZE-CARREFOUR SIMKE LONG DE 1500ML DANS LA COMMUNE DE PETE BANDJOUN.	TRAV	ETS BETTER BUILDING	C_PETE_BANDJOUN	OU	AONO	BIP	197,701,236	12	4		
223	04/M/C-MLT/CIPM/2020	TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU D'ADDUCTION D'EAU DANS LA VILLE DE MALANTOUEN	TRAV	ETS EXCEL-CO	C_MALENTOUEN	OU	AONO	FEICOM	197,310,933	13	-		
224	03/M/CIPM/CABAF2/2020	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART LOT 3	TRAV	STE GFTI SARL	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	109,251,308	7	-		
225	02//M/CIPM/CABAF2/2020	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART LOT 1 PONT SUR LA ROUTE INTER CARREFOUR TATET NDA'A BAPI-BADENG SUR LA RIVIERE SEKIEH ET SUR CELLE DE NGALEU RELIANT CHEFFERIE BALENG-LYCEE TECHNIQUE DE TCHADA	TRAV	ETS ECOBAT & TP	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	114,626,039	7	-		
226	13/LC/CBNA/CIPM/RTE/2020	TRAVAUX DE BITUMAGE DU TRONCON CHEFFERIE-AXE BAFANG DANS LA COMMUNE DE BANA (2eme phase Quartier famgoua-Axe bafang	TRAV	GROUP GALANT & FRIEND SARL	C_BANA	OU	AONO	BIP	358,777,812	12	1		
227	04/M/PR/MINMAP/DRO/DD NDE/SPM/CIPM-BGTE/2020	POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT EXTERIEUR DE L'HOTEL DE VILLE DE BANGANGTE	TRAV	ETS. ATELEWA	C_BANGANGTE	OU	GG	FEICOM	140,000,000	11	-		
228	11/LC/CBNA/CIPM RTE/2020	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE DANS LA COMMUNE DE BNA	TRAV	GROUP GALANT AND FRIENDS	C_BANA	OU	AONO	FR	137,000,917	12	1		
229	05/M/CS/CIPM-CS/2020	Réhabilitation des routes communales de la ville de Sangmelima : carrefour Meyomadjom - carrefour Nkoldongo - Nyazanga (16 KM) . Melok - carrefour Nkoldongo	TRAV	BRIMINE AFRICA	C_SANGMELIMA	SU	AONO	BIP	145,000,003	12	-	-	-
230	01/M/RS/DD/C-MYSLA/CIPM/CIGAM/2020	Réhabilitation du tronçon BIDJONG - MINKO'O	TRAV	STE QLEAR SARL	C_MEYOMESSALA	SU	AONO	BIP	128,426,019	13	-		
231	01/M/CUE/CIPM/2020	Fourniture et pose de lampadaires solaires photovoltaïque à la Communauté Urbaine d' Ebolowa.	TRAV	SOPROCIT SARL	CU_EBOWA	SU	AONO	AIMF,AIMF	153,363,750	14	1		
232	0062LC/DVNT/CKO/CIPM/2020	Réhabilitation des voiries en terre dans la ville de Kye-ossi (lycee Bilingue-MEMIA-Ecole Moineau-Kye)	TRAV	SOGICAM SARL	C_KYE-OSSI	SU	AONO	BIP	249,581,010	10	1		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
233	002/M/MO/C-MVGAN/CIPM/2020	Travaux de construction de 05 minis adductions d'eau potable dans certaines localités de la commune de Mvangan	SPI	ETS EGETRA	C_MVANGAN	SU	GG	FEICOM	299,999,998	9	-		
234	004/M/MO/C-MVGAN/CIPM/2020	Travaux de construction d'un bac de 60 tonnes à MANG dans la Commune de Mvangan,	TRAV	SCORB SARL	C_MVANGAN	SU	AONO	BIP	345,818,740	12	-		
235	N03/C/KUMBA II/COUNCIL/MEME/ITB/20	Support for the Implementation of investment projects for Local development	TRAV	ETS T MICHELAM	C_KUMBA_II	SW	AONO		100,000,000	14	-		
236	15/LC/JO3.04/SG/CIPM/20	Adduction d'Eau Potable par energie solaire Ebanga (Elig Mama)	TRAV	ACC SARL	C_OKOLA	CE	GG	BIP	40,000,000	12	5	-	-
237	12/LC/CO/CIPM/20	Equipement de deux (02) CSI dans la Commune d'OKOLA : Lot : 1 CSI D 'ELIG-ONANA : Equipement en matériel médical	AG	ETS JECO	C_OKOLA	CE	GG	BIP	7,500,000	11	5	-	-
238	13/LC/CO/CIPM/20	Equipement de deux (02) CSI dans la Commune d'OKOLA : Lot : 2 CSI DE MINSOA : Equipement en matériel médical	AG	ETS LA PROVIDENCE	C_OKOLA	CE	GG	BIP	7,500,000	11	7	-	-
239	11/LC/CO/CIPM/20	Réhabilitation du tronçon routier MVA'A – AYOS - NKOLPOBLO (12 km)	TRAV	ETS COGECI	C_OKOLA	CE	GG	BIP	27,699,999	11	2	-	-
240	09/LC/CO/JO3/CIPM/20	Réhabilitation des pistes dans la Commune d'Okola : Lot : 1 Réhabilitation de la piste EBOUGSI-BISSOGO (4km)	TRAV	ETS SEBAGO	C_OKOLA	CE	GG	BIP	25,000,000	12	5	-	-
241	10/LC/CO/CIPM/20	Réhabilitation des pistes dans la Commune d'Okola : Lot : 2 Réhabilitation de la piste ENOBITA – Poste forestier (2km) avec pose d'un dalot	TRAV	ETS COGECI	C_OKOLA	CE	GG	BIP	18,049,985	12	2	-	-
242	06/LC/CO/CIPM/20	EPB d'OKOLA : Construction d'un bloc de 02 salles de classes	TRAV	ETS GLOBAL AFFAIRS TRAINING	C_OKOLA	CE	GG	BIP	16,441,761	14	5	-	-
243	14/LC/CO/CIPM/20	EP d'ELIG-ONANA : Réhabilitation	TRAV	ETS DAMARIS	C_OKOLA	CE	GG	BIP	13,241,087	11	5	-	-
244	08/LC/CO/CIPM/20	Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classes dans certaines localités de la Commune d'Okola : Lot : 1 EP de MEKAK : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	NEW TECHNOLOGIES FOR AFRICA SARL	C_OKOLA	CE	GG	BIP	16,500,000	14	2	-	-
245	15/LC/C.OKOLA/CIPM/20	Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classes dans certaines localités de la Commune d'Okola : Lot : 2 EP de NKOL-DJOBÉ : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	ETS GLOBAL AFFAIRS TRAINING	C_OKOLA	CE	GG	BIP	16,441,761	15	6	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
246	07/LC/CO/CIPM/20	Construction de trois (03) blocs de deux (02) salles de classes dans certaines localités de la Commune d'Okola : Lot : 3 EP de BISSOGO : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	ETS GLOBAL AFFAIRS TRAINING	C_OKOLA	CE	GG	BIP	16,441,761	14	7	-	-
247	09/LC/C.EBEBDA/CIPM/20	CONTROLE ET SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE EBEBDA EBOMZOUT NKOL ELOUGA POLO	TRAV	DIDON CONSEILS SARL	C_EBEBDA	CE	GG	FR	8,111,705	9	-	-	-
248	003/LC/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/2020	EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE GARE VOYAGEUR-BERGES DE LA SANAGA DANS LA COMMUNE DE MBANDJOCK	TRAV	ETS CEDUC BTP	C_MBANDJOCK	CE	GG	BIP	74,993,343	12	2	-	-
249	008/LC/MINDDEVEL/RCE/DHS/CMBA/SG/2020	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN ABATTOIR EQUIPE DES RAILS AERIENS DANS LA COMMUNE DE MBANDJOCK	TRAV	AUMI SARL	C_MBANDJOCK	CE	GG	BIP	59,999,799	11	-	1	1
250	06/M/CE/MAIRE/SG/2020	ENTRETIEN ROUTIER DU TRONCON EKOUDOU OVENG TAP DANS LA COMMUNE D'ENDOM	TRAV	ESCOM SARL	C_ENDOM	CE	GG	FR	89,034,435	6	1	-	-
251	011/LC/C.KTA/CIPM/2020	Construction de deux forages pastoraux a énergie solaire dans les localités de AMCHIDE (PRODEL)	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	PRODEL	30,338,041	5	-	-	-
252	0010/LC/C.KTA/CIPM/2020	Réalisation d'un forage PMH à BIA 1 ET BIA 2	TRAV	ETS LE PALMIER	C_KOLOFATA	EN	GG	BA	15,999,773	6	-	-	-
253	009/LC/C.KTA/CIPM/2020	Réhabilitation de la route communale : axe Kolofata - Gadero	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	27,700,000	6	-	-	-
254	010/LC/C.KTA/CIPM/2020	COMMUNE DE KOLOFATA : Réalisation d'un forage équipé de PMH à Amchidé et Kerawa	TRAV	ETS LE PALMIER	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	15,999,773	6	-	-	-
255	008/LC/C.KTA/CIPM/2020	Construction et pose de 30 lampadaires solaires dans certaines localités de la commune de Kolofata	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	39,843,346	6	-	-	-
256	007/LC/C.KTA/CIPM/2020	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à Kerawa	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	23,971,064	5	-	-	-
257	006/LC/C.KTA/CIPM/2020	EP Tolkomari II : Construction d'un bloc de deux salles de classe	TRAV	ETS AICHA TRADING COMPANY	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	18,998,195	6	-	-	-
258	004/LC/C.KTA/CIPM/2020	EP Bilingue Kolofata : Construction d'un bloc de deux salles de classe	TRAV	SAMOA COMPANY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	18,900,767	6	-	-	-
259	005/LC/C.KTA/CIPM/2020	EP Amchidé IB : Construction de deux blocs de salles de classe (04)	TRAV	ETS ABDOLAYE ALI	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	38,000,000	6	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
260	002/LC/C.KTA/CIPM/2020	EP Gouzoudou : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	ETS HACHIMI ET FILS	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	18,999,387	7	-		
261	003/LC/C.KTA/CIPM/2020	EP Kouyapé : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	TRAV	GROUPEMENT ETS HMB & ETS LE FROMAGER	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	18,966,802	7	-		
262	011/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2020	CZV DE BOUNDERI : Construction	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_MORA	EN	GG	BIP	29,999,438	8	-		
263	010/LC/C.MORA/CIPM-TR/2020	Réhabilitation de la route Doublié - Kossa sur environ 10 Km	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_MORA	EN	GG	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	27,700,000	6	-		
264	012/LC/C.KTA/CIPM-AI/2020	Réalisation d'un forage pastoral équipé de PES dans certains aires de pâturage: Talkomari	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	PRODEL	30,397,666	6	-		
265	001/LC/C.KTA/CIPM/2020	Fourniture du materiel pédagogique scolaire aux EPP de la commune de kolofata	AG	KABBOTIRAL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	12,862,450	7	2		
266	029/LC/C.MORA/CIPM-TR/20	travaux de mise en forme et rechargement de certaines artères de la ville de Mora	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	BA	24,999,999	8	-		
267	028/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2020	rehabilitation de certaines écoles de la commune de mora	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	FOND SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTRE CONTRE LE COVID ET SES REPERCUSSIONS ECONOMIQUES	39,796,000	8	-		
268	027/LC/C.MORA/CIPM-AI/2020	Travaux de CONSTRUCTION DES EQUIPEMENTS d'éclairage public dans certaines chefferies de la commune de Mora	TRAV	ETS WANDALA	C_MORA	EN	GG	BA	11,999,996	7	-		
269	026/LC/C.MORA/CIPM-TR/2020	Travaux de rechargement de la route tronçon 1 carrefour lycée classique de mora - domicile HASSANA MADI	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_MORA	EN	GG	BA	19,999,847	5	-		
270	025/LC/C.MORA/CIPM-TR/20	Travaux d'extension canalisation carrefour stade municipal	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	BA	25,999,934	7	-		
271	024/LC/C.MORA/CIPM-TR/20	Réalisation de la canalisation carrefour stade municipal (lieu dit Borne fontaine) jusqu'au radier lycée technique	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	BA	34,998,945	7	-		
272	008/LC/CBTA1/2020	Réhabilitation de certains tronçons Communales dans la Commune de BERTOUA I	TRAV	ETS KADIRI & FILS	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	27,668,359	7	-	4	4

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
273	002/LC/CBTA1/SG//20	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif (plan type PNDP) à l' EPB de MOKOLO 2 Lot 5	TRAV	ETS YAYA BAKARI	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	24,449,756	10	2		
274	004/LC/CBTA/2020	Construction d'un bloc maternel à l'EM DE NYANGANZANG	TRAV	ETS KM	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	24,989,970	9	2		
275	007/LC/BTA1/2020	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EP de NKOLBIKON 3 Lot 2	TRAV	FEUDJO KAMTO ET FILSS	C_BERTOUA_I	ES	GG	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	19,999,710	9	2	7	7
276	089/2020/D/CBTA1/SG	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EPB de BONIS Lot 1	TRAV	ETS YAN DECOR	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	19,952,838	9	2	7	7
277	006/LC/CBTA1/2020	Construction d'une clôture à l'École Publique de MOKOLO SEMBE Gp 3 Lot 9	TRAV	ETS KENFACK DESIRE BRUNO	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	19,416,690	8	2	11	3
278	003/LC/CBTA1/2020	Construction d'un bloc maternel à EM de MBANGO Lot 10	TRAV	ETS ESPERANCE	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	24,999,510	9	2		
279	009/LC/CBTA1/2020	Construction d'une clôture au CPFF de BERTOUA Lot 8	TRAV	ENTREPRISE CAMEROUNAISE SPECIALISEE EN BATIMENT (E.C.S.B)	C_BERTOUA_I	ES	GG	BIP	20,600,000	9	2	11	4
280	16/LC/CBO/CIPM/2020	Recrutement d'un BET en vue de la maîtrise d'oeuvre (suivi et contrôle) des travaux de construction d'une cité municipale à BETARE-OYA	SPI	ETS INGENIERIE CONSEIL	C_BETARE-OYA	ES	GG	FEICOM	25,750,000	9	1	11	1
281	02/LC/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES EN 4 TRONCONS	TRAV	C.P.N CONSTRUCTORS SARL	C_BANKA	OU	GG	BIP	27,697,152	16	1		
282	03/LC/SG/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE INTER-BABOATE-BAGONDACK TRONCON ENTREE FUH LATUH-CHI FINDAH(1,00) CHATEAU D'EAU	TRAV	C.P.N CONSTRUCTORS SARL	C_BANKA	OU	GG	BIP	16,918,612	14	1		
283	05/LC/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DES FÊTES DE LA VILLE DE BANKA	TRAV	ETS CHAPY SERVICES	C_BANKA	OU	GG	BIP	30,993,531	14	1		
284	04/LC/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES DE CLASSE A L'EP DOMGA GROUPE 3	TRAV	ETS CHAPY SERVICES	C_BANKA	OU	GG	BIP	15,800,000	8	1		
285	10/LC/CBKA/CIM/2020	EQUIPEMENT MATERIEL MEDICAL AU CENTRE DE SANTE INTEGRE DE BANFEKO	AG	ETS MADAKES	C_BANKA	OU	GG	BIP	8,000,000	11	2		
286	09/LC/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE AU MARCHE BANKA	TRAV	ETS CHAPY SERVICES	C_BANKA	OU	GG	BIP	7,999,290	15	1		
287	07/LC/CBKA/CIPM/2020	TRAVAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE MANILA	TRAV	ETS PASSO BUSINESS EX CHANGER	C_BANKA	OU	GG	BIP	33,155,817	12	1		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
288	06/LC/SBKA/CIPM/52020	TRAVAUX D'ELECTRIFICATION DE LA LOCALITE DE BAPOUFEN	TRAV	ETS C.G.E & BTP	C_BANKA	OU	GG	BIP	49,920,328	15	1		
289	07/LC/C-BANGOU/2020	Travaux d'achèvement de l'Hôtel de ville de Bangou, arrondissement de Bangou, Département des Hauts-Plateaux	TRAV	ETS ESIP SERVICES	C_BANGOU	OU	GG	FEICOM	72,536,794	7	3		
290	01/M/CIPM/CABAF2/2020	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART LOT2 PONT DEFINITIF AU PK+520 DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR BAYE TCHIDA FAMTCHOUET DANS LA COMMUNE DE BAFOUSSAM2	TRAV	ETS GNADENEU & FILS	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	88,790,120	8	1		
291	01/LC/CIPM/CABAF2/2020	CONTROLE TECHNIQUE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART DANS LA COMMUNE DE BAFOUSSAM2	SPI	ETS GECID'AF	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	12,496,649	7	1		
292	23/LC/PR/MINMP/DRO/DDN DE/SPM/CIPM-BGTE/2020	POUR LE CONTRÔLE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'aménagement EXTÉRIEUR D L HÔTEL DE VILLE DE BANGANGTE	TRAV	ETS EEMOGES	C_BANGANGTE	OU	GG	FEICOM	9,800,000	8	1		
293	08/LC/C-BANGOU/CIPM/2020	Travaux d'alimentation en eau potable du village Bapa (phase 1)	TRAV	ETS KTS	C_BANGOU	OU	GG	BIP	35,879,940	7	1		
294	08/LC/CBKA/CIPM/2020	FOURNITURE DU PEDAGOGIQUE ET SCOLAIRE OU PAQUET MINIMA DANS LES ECOLES DE LA COMMUNE DE BANKA	AG	ETS NEW-LINE CONCEPTIONS	C_BANKA	OU	GG	BIP	5,756,483	-	-		
295	007/LC/C-MVANGAN/SG/CIPM/2020	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de 05 minis adductions d'eau potable dans certaines localités de la commune de Mvangan	SPI	ETS DJAMIRA	C_MVANGAN	SU	GG	FEICOM	20,993,963	9	-		
296	011/LC/C/CPO/CIPMP/2020	Travaux de construction d'un Centre culturel à CAMPO	TRAV	ETS JF GALACTICK SERVICES	C_CAMPO	SU	GG	BIP	30,000,000	5	-		
297	013/LC/C/CPO/CIPMP/2020	Réhabilitation et équipement case éco-touristique de Nkoelon dans l'arrondissement de Campo	TRAV	INFINITY SARL	C_CAMPO	SU	GG	BIP	25,000,000	5	-		
298	012/LC/C/CPO/CIPMP/2020	Réhabilitation de l'Auberge municipale de Campo	TRAV	ETS JF GALACTICK SERVICES	C_CAMPO	SU	GG	BIP	35,000,000	5	-		
299	014/LC/CPO/CIPM/2020	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP bilingue de Campo	TRAV	INFINITY SARL	C_CAMPO	SU	GG	BIP	17,000,000	5	-		
300	05/M/CMBE/SG/ST/CIPM/2021	Acquisition d'une benne pour le compte de la commune de Mbé	AG	ETS MASSA	C_MBE	AD	AONO	BIP	100,000,000	12	2	-	-
301	06/M/CANERT/CIPM/20221	Réhabilitation de 05 allées et construction d'un mur de soutènement dans le marché de Banfil	TRAV	ETS FATIMA	C_NGAOUNDERE_I	AD	AONO	BIP	100,000,000	12	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
302	12/M/CANII/CIPM/2021	Travaux de construction et d'équipement de 04 boukarous au site touristique du lac MBALANG DJALINGO	AG	ETS EDWING	C_NGAOUNDERE_II	AD	AONO	BIP	109,997,870	12	-		
303	01/M/CNY/CIPM/2021	Achat d'un camion benne et accessoires	AG	ETS MASSA	C_NYAMBAKA	AD	AONO	BIP	100,000,000	12	2	-	-
304	18/M/C-MTP/SG/ST/CIPM/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE MARTAP, DANS LA COMMUNE DE MARTAP, DÉPARTEMENT DE LA VINA, RÉGION DE L'ADAMAOUA. (NON PROGRAMME) EN PROCÉDURE D'URGENCE	TRAV	ETS BOGNO BUSINESS	C_MARTAP	AD	AONO	FEICOM	279,994,193	12	-		
305	02/M/C-NG/SG/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE YAFOUNOU-BAFOUCK-NGAOUI-MINIM 66KM	TRAV	INTERNATIONAL ASSOCIATE CONSULTING(IN ASCO CONSEIL)	C_NGAOUI	AD	AONO	FR	199,964,591	12	-		
306	25/M/CD/CIPM/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ADDUCTION D'EAU AVEC CHATEAU DE 70M3 + 10 BORNES FONTAINES ET UNE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE	TRAV	ETS STEPH	C_DJOHONG	AD	AONO	PNDP,PNDP	319,896,147	12	-		
307	06/M/CNG/CIPM/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION ET D'EXTENSION DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE PAR L'ALIMENTATION DE LA STATION SCANWATER SUR UN LINEAIRE DE 9500 ML+ CONSTRUCTION DE 33 BORNES FONTAINES + UN RESERVOIR DE 50M3 ET D'UN CHAMP SOLAIRE DE 252 KW	TRAV	SOLAIRE DU CAMEROUN SARL	C_NGAOUI	AD	AONO	PNDP,PNDP	249,997,162	12	-		
308	008/M/RA/CRA/SG/2021	ACQUISITION D'UN VEHICULE DE TYPE STATION WAGON 4X4 LAND CRUISER VX D'UN VEHICULE DE TYPE STATION WAGON 4X4 PRADO VX TURBO ET DE (05) CINQ VEHICULES DE TYPE STATION WAGON 4X4 FORTUNER DSL	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_AD	AD	GG	BA	336,000,000	11	-		
309	10/M/C-MGA/CIPM/2022	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE DE MEIGANGA ALLANT DE ROND-POINT NARRAL VOYAGE-LYCEE BILINGUE-CARREFOUR ZAIR-TERMINUS RUE 24 PAR LA MISE EN FORME SUR 04 KM LA CONSTRUCTION DES CANIVAUX SUR 4900 ML ET LA CONSTRUCTION DE 06 DALOTS DE SECTION 1*1*6 SUR 70 ML DANS LA VILLE DE MEIGANGA	TRAV	GRPE STEPH	C_MEIGANGA	AD	AONO	PNDP,PNDP	263,482,875	-	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
310	05/M/C-BYO/SG/STADU/CIPMP/2021	CONSTRUCTION D'UN MARCHÉ CENTRAL A BANYO	TRAV	TS CONSTRUCTION ENTERPRISE	C_BANYO	AD	AONO	FEICOM	423 289 515	6	-		
311	11/LC/AONO/CIPM/COKI/2021	Equipement de la salle polyvalente de MOUKO	AG	BM AND PARTNERS CONSULTING	C_KIIKI	CE	AONO	BM	119 999 985	12	1		
312	015/LC/C/OMB/SG/SPM/CI PM/2021	Construction du marché moderne d'Ombessa	TRAV	TURKISH CONSTRUCTION CAMEROON SARL	C_OMBESSA	CE	AONO	BIP	399 564 895	9	-		
313	003/M/C-NTUI/SG/CIPM/2021	Construction des équipements d'éclairage public	TRAV	LAPI ENTERPRISE	C_NTUI	CE	AONO	BIP	100 000 000	13	1		
314	001/M/RC/CNG/CIPM-CNG/2021	Travaux de réfection du palais municipal de N'gomou et Annexes	TRAV	GENERFOP SARL	C_NGOMOU	CE	AONO	FEICOM	117 165 246	12	-	-	-
315	0002/M/SG/CIPM/CAFAN/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE EKOUKOUT ETOH-CARREFOUR MEDIMIKOUM	TRAV	ADS SARL	C_AFANLOUM	CE	AONO	BIP	106 914 542	12	-		
316	01/M/C.OLG/SG/CIPM/20221	Travaux d'Entretien de la route communale NKOLTOP inter 10 Olanguina et des bretelles 1.5km	TRAV	ETS WORLD GLOBAL ACTIVITIES	C_OLANGUINA	CE	AONO	BIP	148 671 891	12	-		
317	04/M/C-SOA/BMP/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALES T1 BOUCLE DESSONG MINTSANG 9.00KM ET T2 EBOGO.....	TRAV	AIR FORAGE SARL	C_SOA	CE	AONO	BIP	100 100 000	10	-		
318	001/M/RCE/DNK/CMAKAK/2021	Construction de l'hôtel de ville à Makak	TRAV	ETS ASANZO BTP	C_MAKAK	CE	AONO	BIP	257 800 000	13	1		
319	02/M/JO3/C.EMO/CIPM/2021	ENTRETIEN DES TRONCONS DE ROUTES ELIG MFOMO LEKOUKOUA EP MEBOMO ELIG ONANA KOMO ESSELE OKOK ESSELE CARR ELIG BITSTA EP KOKODO ELIG BITSETSA CARR LEKOUKOUA	TRAV	SOCIETE NKOM BTP SARL	C_ELIG_MFOMO	CE	AONO	FR	135 123 964	10	-		
320	001/M/CAYII/CIPM/SMP/2021	Travaux d'aménagement du tronçon de route au quartier ciel verte à l' ISMT--RUSTICK home restaurant avec bretelle.	TRAV	GENERAL BUILDING COMPANY SARL	C_YAOUNDE_II	CE	AONO	BA	174 853 771	12	-	2	4
321	001/M/CAKGA/SG/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN COURANT PERIODIQUE DE CERTAINS TRONCONS DE ROUTES COMMUNALES D 1 LINEAIRE 40 KM	TRAV	ETS MANKO	C_AKONOLINGA	CE	AONO	BIP	239 988 507	12	1		
322	13/LC/AONO/CIPM/COKI	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER R-103(BAFIA-MESSANGANG)	TRAV	BM AND PARTNERS CONSULTING	C_KIIKI	CE	AONO	BIP	149 991 191	12	-		
323	001/M/RC/C-YKO/CIPM/2021	Travaux d'entretien de la route communale Issandja-Minfoumbé-village	TRAV	ETS ZAC	C_YOKO	CE	AONO	BIP	119 738 925	13	-	-	-
324	003/M/MINDEVEL/RCE/DNL/CBOTMAK/21	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES L'HOTEL DE VILLE DE BOT MAKAK	TRAV	NET WORLD BUSINESS AND COMPANY	C_BOT_MAKAK	CE	AONO	FEICOM	304 189 535	6	-		
325	006/LC/C.MFOU/SG/DAG/SPM/2021	EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DUN BLOC DE 2 SALLES DE CLASSES A LECOLE PUBLIQUE DAKOK	TRAV	ETS MAGNI ET FILS	C_MFOU	CE	AONO	BIP	19 000 000	12	-	3	1

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
326	009/M/C NSEM/SG/2021	TRAVAUX D'OUVERTURE DE CERTAINS TRONCONS DE ROUTES COMMUNALES DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA	TRAV	ETS CEDUC BTP	C_NSEM	CE	AONO	FR	108 255 200	10	-		
327	003/M/CAYIER/SFMP/BMP/2021	Travaux de construction d'un marché moderne BILLIK-PASEI dans la CAYIER	TRAV	ETS LES QUATRE ETOILES	C_YAOUNDE_I	CE	AONO	BA	188 682 684	13	-		
328	011/M/CUY/CIPM/2022	FOURNITURE DE DIX(10)VEHICULES PICK-UP 4*4 DOUBLE CABINEA LA CUY	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CUY	CE	AONO	BIP	339 999 996	4	-		
329	22/M/CBK/SG/2021	Travaux d'entretien de la route communale AKOK BEKOE-ANDOCK (Rive du NYONG) dans la Commune de BIKOK	TRAV	ETS TDP & CIE	C_BIKOK	CE	AONO	FEICOM	139 357 935	11	-	3	9
330	012/LC/CBONDJOCK/21	RENFORCEMENT DE LA LIGNE DE TRANSPORT ELECTRIQUE MONOPHASEE EN LIGNE ELECRIQUE TRIPHASEE SUR L'AXE LIBAMBA-LOLA	TRAV	ETS DEO GRACIA	C_BONDJOCK	CE	AONO	BIP	174 121 099	7	-		
331	024/M/CBK/SG/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 06 RESEAUX D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE (AEP) ALIMENTES PAR ENERGIE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE BIKOK	TRAV	LA CHUTE DES EAUX	C_BIKOK	CE	AONO	FEICOM	375 050 160	13	5	-	-
332	01/M/C.LOBO/CIPM/21	CONSTRUCTION DU BATIMENT R 1 DEVANT ABRITER LES SERVICES DE L'HÔTEL DE VILLE	TRAV	TURKISH CONSTRUCTION CAMEROON SARL	C_LOBO	CE	GG	BIP	257 558 013	12	-		
333	157/M/CUY/CIPM/2021	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE 1500 LAMPADAIRES SOLAIRE INTERNNECTES DANS LA VILLE DE YAOUNDE	AG	ARODEL EQUIPEMENT	CUY	CE	GG	BIP	5 724 000 000	9	-		
334	006/M/MINDDEVEL/RCE/DHS/CNE/SG/21	EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 100 BOUTIQUES ET D'UN CHÂTEAU D'EAU D'UNE CAPACITÉ DE 20 M	TRAV	CAMEROUN BUSINESS SERVICES	C_NANGA_EBOKO	CE	AONO	FEICOM	382 145 200	10	-	3	-
335	492/M/CUY/CIPM/2021	FOURNITURE DE VEHICULES DE SERVICES AU CONSEIL REGIONAL DU CENTRE	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_CE	CE	AONO	BIP	209 000 000	3	-		
336	15/M/C NGMOU/SG/21	Travaux de construction du bâtiment R+1 devant abriter les services de la Mairie (Hôtel de Ville) dans la Commune de NGOUMOU	TRAV	TS CONSTRUCTION ENTERPRISE	C_NGOUMOU	CE	AONO	FEICOM	330 082 937	6	-	-	5
337	LC N°11/C NKOLMETET/CIPM/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE LA ROUTE COMMUNALE CO13550	TRAV	ETS PENTAGONE II	C_NKOLMETET	CE	GG	FR	199 951 925	12	-	10	8
338	04/LC/C.NDKLA/CIPM/BEC/2021	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LOUGGUERE Lot 1	TRAV	ETS LIMAN	C_NDOUKOULA	EN	AONO	BIP	164 998 059	11	-		
339	006/M/CIPM§2021	Acquisition d'un camion tracteur routier dans la ville de Gobo	AG	COPRES SARL	C_GOBO	EN	AONO	BIP	100 000 000	11	2		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
340	001/M/C.GOULFEY/CIPM/2021	Electrification de certaines localités de la commune de Goulfey en lampadaire solaire Goulfey-centre (25); Abassadna Hamadié (04); Nadjj(04); Amdane (04); Mara (04); Takoulwébé (04)	TRAV	ETS AL-AZIZA	C_GOULFEY	EN	AONO	BIP	100 000 000	8	-		
341	013/M/C.GLFEY/SG/2021	Construction d'un bloc de 2 salles de classe a EP NIGUE Lot 1	TRAV	ADALBI SARL	C_GOULFEY	EN	AONO	BIP	143 999 994	7	1		
342	006/LC/C.HINA/SG/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE HINA -CARREFOUR HAMADOU ZOURMBA	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_HINA	EN	AONO	BIP	269 999 999	12	-		
343	15/M/MINDDEVEL/REN/DMK/C/TLM/CIPM-R/2021	Travaux d'entretien de la route Touloum-Kofidé-Waiba long de 12 km	TRAV	ETS MAHAMA ABBA	C_TOULOU	EN	GG	BIP	150 000 000	8	-		
344	017/M/AC/C-MINDIF/CIPM/2021	Travaux d'entretien de la route Nanikalou-Mogom-Ouro Bounne (10 KM)	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_MINDIF	EN	GG	BIP	149 999 780	10	-		
345	006/M/CIPM-CUM/2022	Travaux d'amélioration de trois terrains multisports dans la ville de Maroua	TRAV	ETS AMD	CU_MAROUA	EN	AONO	BUDGET DU PROGRAMME C2D/CR/FONDS DE CONTREPARTIE	466 014 338	8	-		
346	010/2021/LC/C.KAR-HAY/CIPM	Travaux d'entretien du tronçon de la route communale Doukoula-Guissia-Bordo limite Hougno (14km)	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	C_KAR-HAY	EN	AONO	BIP	125 000 000	12	-		
347	006/AC/GG/CREN/CIPM/2021	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS EN MATERIELS ET MOBILERS AU PROFIT DU CREN	AG	CONFORT HOUSE SARL	CR_EN	EN	GG	DGI	300 810 706	6	-		
348	005/M/CREN/CIPM/2021	TRAVAUX DE VIABILISATION DU BATIMENT ABRITANT LE SIEGE DU CREN ET ACQUISITION D'UN DISPOSITIF DE RIPOSTE ANTI-COVID 19	AG	COPRES SARL	CR_EN	EN	GG	DGI	103 999 720	6	-		
349	001/M/CREN/CIPM/2021	FOURNITURE DE 03 PICK-UP DIESEL 4*4 DOUBLE CABINE CLIMATISES IDENTIQUES, 02 STATIONS WAGONS DIESEL IDENTIQUES ET 01 MOTO AU CREN	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_EN	EN	GG	BIP	210 500 000	6	-		
350	011/LC/C.GLFEY/CIPM/2021	Travaux d'Entretien de la Route Communale: TIYUS ARDEBE- GOULFEY-ABOUDIURWA- TANA (10 KM)	TRAV	ETS ANNADJIMA	C_GOULFEY	EN	AONO	BIP	100 000 000	11	-		
351	01/M/CMNE-KLE/CIPM/SG/BSMPC/ROUTE/2021	Travaux d'entretien de la route ZOUANA-ZASSINRI-GADAS (12 km) dans la commune de kaélé	TRAV	HAMOUS SARL	C_KAELE	EN	GG	BIP	119 973 609	6	-		
352	010/M/CREN/CIPM/2021	Acquisition des matériels de voirie (engins de génie civil) au conseil régional	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_EN	EN	GG	BA	763 380 950	-	-		
353	001/M/C.MOK/SG/2021	Travaux d'Amenagement de la Voie Carrefour Hopital Régional Annexe de Mokolo - Entrée Barrage de Mokolo.	TRAV	ETS KODJI SENI	C_MOKOLO	EN	AONO	BIP	167 000 520	-	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
354	022/LC/C.MORA/CIPM-TR/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIES: COMMISSARIAT DE SECURITE PUBLIQUE VERS CANTON DE MORA-MASSIF=600ml, CARREFOUR MOUSTI VERS MOSQUEE=300ml, carrefour MAHAMAT ABOUYA-VERS ABATTOIR=300ml	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	BA	100 000 000	-	-		
355	003/M/C.MOGODE/CIPM/2021	Travaux d'Entretien de la route Commune KARANTCHI - MBOUGAROUDJIPPA - SAR/SM 32 KM. (lot 2)	TRAV	ETS VANDI TERI	C_MOGODE	EN	AONR	FR	119 979 000	-	-		
356	004/C.MMA/CIPM/2021	Construction d'une mini centrale solaire à Mboma	TRAV	" A B C "SARL	C_MBOMA	ES	AONO	BIP	269 997 511	12	-	11	5
357	n 002/M/CK/SG/CIPM/2021	Entretien Route Commune Gogazi Kette : LOT 1	TRAV	ETS OMA MANDONG	C_KETTE	ES	AONO	BIP	100 000 000	12	-		
358	07/LC/CNGRA/SG/ST/CIPM/NGRA/2021	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP GOUNTE : LOT 1	TRAV	ETS MAISON MERE	C_NGOURA	ES	AONO	BIP	179 999 535	12	-	12	1
359	02/M/CM/SG/ST/CIPM/2021	Travaux de construction de l'hôtel de ville de la commune de MANDJOU	TRAV	ETS NOUMBO GERMAIN	C_MANDJOU	ES	AONO	FEICOM	335 000 000	11	-		
360	003/M/ST/SG/C.MNA/CIPM/2021	TRAVAUX D'ÉLECTRIFICATION PAR ÉNERGIE SOLAIRE DE LA VILLE DE MESSAMENA .	TRAV	J & H SARL	C_MESSAMENA	ES	AONO	FEICOM	380 000 000	12	-		
361	002/LC/CBTA1ER/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTES COMMUNALE BIRPONDO-KPWANDJANG-BONIS Y COMPRIS LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LA RIVIÈRE KPANDOUA DANS LA COMMUNE DE BERTOUA 1er	TRAV	GROUPE TALMA SARL	C_BERTOUA_I	ES	AONO	FR	138 315 094	12	-		
362	002/M/SG/ST/C.NKA/CIPM/2021	Travaux d'entretien du tronçon de Route Régionale NGUELEMENDOUKA – LAMBA – AKOSSA – Limite MBOMA et bretelles (Carrefour LAMBA – Carrefour BATITOU et LAMBA – MIAMBO) dans l'Arrondissement deNGUELEMENDOUKA	TRAV	HMO CAMEROON SARL	C_NGUELEMENDOUKA	ES	AONO	FR	117 369 666	12	-	13	5
363	006/M/C.MMA/CIPM/2021	LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE MBOMA (INTER R0203)- NAMEDJAP-LIMITE CENTRE DANS LA COMMUNE DE MBOMA. DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG	TRAV	" A B C "SARL	C_MBOMA	ES	AONO	FR	136 490 056	12	-	18	7
364	009/LC/CBTA1ER/CIPM/2021	Construction d'une salle polyvalente à l'esplanade de l'hôtel de ville de la commune de Bertoua 1er	TRAV	ETS GLOBAL BUSIINESS	C_BERTOUA_I	ES	AONO	BIP	227 000 994	12	-		
365	002/M/C.AM/CIPM/2021	Travaux de construction d'un complexe commercial dans la ville d'Abong Bang	SPI	ETS GLOBAL TRADING	C_ABONG-MBANG	ES	AONO	FEICOM	476 139 742	12	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
366	01/M/C DG/CIPM/2022	Travaux de finition de l'hotel de ville de DIANG	TRAV	ETS GLOBAL BUSINESS COMPANY	C_DIANG	ES	AONO	FEICOM	167 064 000	8	-		
367	001/M/CGB/CIPM/2021	Travaux de construction d'une salle polyvalente de Garoua-Boulai	TRAV	ETS MBEKE & FILS	C_GAROUA-BOULAI	ES	AONO	FEICOM	148 686 397	9	-	13	2
368	038/LC/CKETTE/CIPM/2021	Construction d'un bloc de 02 de deux logements d'astreinte avec un bloc cuisines externes et un bloc latrines à 02 compartiments à EPP KETTE 1	TRAV	ETS TACHE BLANCHE	C_KETTE	ES	DC	PNDP,PNDP	269 922 000	7	-		
369	01/M/CAN2/SG/CIPM/2021	Acquisition de deux (02) camions 10 roues au profit de la mairie de Nkongssamba 2e	AG	STE GUEMMA SARL	C_NKONGSAMBA_I	LT	AONO	BIP	100 000 000	10	1		
370	10/LC/CIPM/C.DIZ/SG/21	Équipement en Énergie Solaire CMA de Dizangue	AG	ARCHITECTURAL BUSINESS SOLUTION ENGINEERING (ABS SARL)	C_DIZANGUE	LT	DC	BIP	14 998 073	11	-	9	3
371	04/M/C.MKO/CIPM/SG/2021	Aménagement du tronçon de route NSEPPE (limite DIZANGUE-MOUNAKO) - carrefour MARIEMBERGE -MBANGA	AG	KJ BTP SARL	C_MOUANKO	LT	AONO	BIP	350 000 000	10	-	-	-
372	03/M/CIPM/CAD1/2021	fourniture de deux véhicules utilitaires neufs de type 4x4	AG	TED CONNECT SARL	C_DOUALA_I	LT	DC	BA	134 156 250	2	-		
373	01/M/CAD3/CIPM/2021	acquisition camion Benne 10 tonnes	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	C_DOUALA_III	LT	AONO	BIP	120 000 000	12	1	-	-
374	005/LC/CAD4/CIPM/2021	travaux de construction d'une clôture en matériaux définitif à l'école publique de BONENDALE	TRAV	CETECH SARL	C_DOUALA_IV	LT	AONO	BIP	25 996 202	11	-	-	-
375	022/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Travaux de Réhabilitation de la signalisation horizontale de certaines voiries de Bonanjo	TRAV	TON SUPER SARL	CUD	LT	AONO	BA	141 277 025	9	-	7	-
376	020/M/CUD/SG/DSGP/SDP M/2022	Aménagement des bases logistiques de Youpwè; Deido et Bonamoussadi	TRAV	SIBA & TP SARL	CUD	LT	AONO	BA	366 650 254	3	-	8	2
377	025/M/CUD/SG/DSGP/SDP M	Aménagement d'équipements divers dans la ville de Douala: Site de Nkolmbong	TRAV	ETS SERAYIM	CUD	LT	AONO	BA	118 384 716	7	-	18	-
378	023/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Illuminations Festives des Fêtes de fin d'années 2021	TRAV	2L TECHNOLOGIES SARL	CUD	LT	AONO	BA	143 849 606	11	-	-	-
379	033/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Aménagement de drains dans la Ville Douala	TRAV	SMAR SARL	CUD	LT	AONO	BA	244 616 739	11	-	-	-
380	037/M/CUD/DSGP/SDP MAP/2021	Travaux de stabilisation des éboulements dans la ville de DOUALA	TRAV	KJBTP SARL	CUD	LT	AONO	BA	142 544 474	11	-	8	-
381	031/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Acquisition du Matériel et Mobilier de Bureau pour la CUD	AG	SOCIETE FURNITURE PLAZA SARL	CUD	LT	AONO	BA	100 158 075	10	-	-	-
382	01/M/C.NGBECIPM/2021	Travaux de construction de l'Hôtel de Ville	TRAV	ETS BAHOU & CIE	C_NGAMBE	LT	AONO	FEICOM	278 632 955	12	-	12	-
383	011/M/CUD/SG/DSGP/2021	Pré collecte des ordures auprès des ménages des quartiers à accès difficile de la Commune de Douala 5ème	SPI	GROUPE GENELCAM	CUD	LT	AONR	BA	1 041 768 000	12	-	9	3

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maître d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
384	010/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Pré collecte des ordures auprès des ménages des quartiers à accès difficile de la Commune de Douala 4ème	SPI	CAMEROON ALERT SYSTEM SARL	CUD	LT	AONR	BA	956 146 500	12	-	8	2
385	013/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Pré collecte des ordures auprès des ménages des quartiers à accès difficile de la Commune de DLA 3ème	SPI	ETS BUIL. PA.BUS.CO	CUD	LT	AONR	BA	1 128 496 140	12	-	6	2
386	050/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Pré- collecte des ordures auprès des ménages des quartiers à accès difficile dans les Arrondissements de Douala 1er et 2ème	SPI	SECA	CUD	LT	AONR	BA	571 508 276	10	-	6	2
387	019/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Aménagement de la rue 2.748 (rue UM NYOBE) au marché central de Douala	TRAV	NOUCK & FILS SARL	CUD	LT	AONO	BA	198 771 304	12	-		
388	02/M/C.NDOM/CIPM/2021	Travaux d'entretien des routes communales des tronçon NONN-TOUE(24km)	TRAV	FOTABONG ROYAL ETS	C_NDOM	LT	AONO	BIP	119 998 965	10	-	11	2
389	02/M/CAN2/SG/CIPM/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE "INTER N5-ENTREE CHEFFERIE NDOGMOA-ECOLE PUBLIQUE NDOGMOA-ECOLE PUBLIQUE D'EKANGTE-ENTREE PALMIERS-INTER N5"	TRAV	ETS. TATCHOUO ET FILS	C_NKONGSAMBA_I I	LT	AONO	FR	109 809 000	12	-		
390	001/MCAE1er/SM/2021	Travaux d'aménagement de la voie "Carrefour-rond-amour-sous-préfecture-CarrefourCNPS-Commissariat Bisséké-Sortie Camp Sic(lieudit Alino)	TRAV	GROUPEMENT GALANT / MNH	C_EDEA_I	LT	GG	BIP	536 560 827	10	3		
391	001/M/C/EBONE/SG/2021	Pour les travaux de construction d'un pont définitif au pk19+800 sur la riviere sole de la route ebone-mangamba- mbaka dans le village mbaka, arrondissement de nlonako,	TRAV	ETS M & M BUILDING	C_EBONE	LT	AONO	FR	166 712 115	11	-	1	11
392	04/M/C.BARE/SG/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE INTER RN5-CHUTE D'EKOM-NKAM EN 02 PHASES	TRAV	ETS. TATCHOUO ET FILS	C_BARE	LT	AONO	BIP	149 705 068	10	-	3	10
393	01/M/CAN3/SIGAMP/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE ADDUCTION EN EAU POTABLE A POOLA 2EME PHASE	TRAV	ZAIN GLOBAL COMPANY LTD	C_NKONGSAMBA_I II	LT	GG	BA	100 000 000	7	-	-	-
394	028/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Réhabilitation et sécurisation des trottoirs des rues Surcouf et Christian Tobie Kuoh (Axe intersection avec la rue Pierre Loti)	TRAV	CETECH SARL	CUD	LT	AONO	BA	118 682 176	11	-	-	-
395	029/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Réhabilitation et sécurisation des trottoirs (Avenue de Gaulle)	TRAV	CAFT SARL	CUD	LT	AONO	BA	110 747 475	12	-	-	-
396	038/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Achat du matériel d'éclairage public dans la ville de Douala	TRAV	CATRASCO SARL	CUD	LT	AONO	BA	117 682 772	10	-	8	2
397	030/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Approvisionnement en matériaux routiers: POUZZOLANE	TRAV	SMAR SARL	CUD	LT	AONO	BA	146 373 413	11	-	8	2
398	001/M/LT/CR/CIPM/2021	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL DE GENIE CIVIL AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL. LOT 1 : Niveleuse de type 1.	AG	TRACTAFRIC EQUIPMENT CAMEROUN	CR_LT	LT	AONO	BA	191 675 877	12	1	12	4

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
399	_/M/LT/CR/CIPM/2021	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL DE GENIE CIVIL AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL. LOT 2 : Niveleuse de type 2.	AG	TRACTAFRIC EQUIPMENT CAMEROUN	CR_LT	LT	AONO	BA	374 645 349	12	1	12	4
400	003/M/LT/CR/CIPM/2021	FOURNITURE DES EQUIPEMENTS ET DU MATÉRIEL DE GENIE CIVIL AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL. LOT 4 : Camion benne.	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_LT	LT	AONO	BA	104 000 000	12	1	12	2
401	___/M/LT/CR/CIPM/2021	FOURNITURE DU MATÉRIEL ROULANT AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL. LOT 3 : Véhicule Station Wagon 4x4 de format inférieur.	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_LT	LT	AONO	BA	250 000 000	12	1	12	4
402	003/M/SG/C.MASSOK/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE IHENDEL-ISSONDJE 2	TRAV	ETS EASYTECH CAMEROUN	C_MASSOCK	LT	GG	FR	148 926 459	7	-	7	8
403	005/M/SG/CMASSOK/2021	ACQUISITION D'UNE NIVELEUSE A LA MAIRIE DE MASSOK	AG	TRACTAFRIC EQUIPMENT CAMEROUN	C_MASSOCK	LT	GG	BIP,BA	105 000 000	7	5	-	-
404	001/AONO/C/PJA/SG/2021	Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA SUD tronçons: BUADIC-PALMIER, PALMIER NDOKO,CHAPELLE BOUBA IV, CARREFOUR BOUBAIV	TRAV	ETS KENFACK & FILS	C_PENJA	LT	AONO	FR	123 468 111	10	-	13	1
405	001/LC/CUN/CAB/SG/2021	Exécution des travaux de construction de la tribune officielle de la communauté urbaine de nkongsamba	TRAV	ETS BATILUX	CU_NKONGSAMBA	LT	AONO	FEICOM	186 245 378	9	-		
406	006/M/LT/CR/CIPM/2021	TRAVAUX D'AMENAGEMENTS DIVERS DE L'IMMEUBLE ABRITANT LE SIEGE DU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL A DOUALA-BONANJO. LOT 1 : Travaux d'aménagement des bureaux du Conseil Régional du Littoral (RDC)	TRAV	CSR - CAMEROUN SERVICES & REALISATIONS	CR_LT	LT	AONO	BA	133 753 722	11	-	12	4
407	049/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2021	Location des toilettes mobiles et urinoirs pour la CAN dans la ville de Douala	TRAV	GROUPE GENELCAM	CUD	LT	AONO	BA	114 979 296	11	-		
408	018/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires de la ville de Douala: Route Entrée Lycée Ndogpassi-Carrefour Chefferie Ndogpassi I	TRAV	ROUT'DAF SA	CUD	LT	AONO	BA	3 645 830 944	6	-		
409	012/M/CUD/SG/DSGP/SDP M/2022	Entretien curatif de certaines voiries: Rue TOBBIE KOUOH; Rue Gouverneur Carras-Rue de Bonapriso et Rue French.	TRAV	ERTA SARL	CUD	LT	AONO	BA	992 448 042	6	-		
410	014/M/CUD/SG/DSGP/SDP M/2022	Travaux d'aménagement en pavés de certaines voiries: Rue Boulevard des Nations unies-Rue de Japoma; Rue derrière Hotel MBANYA	TRAV	SMAR SARL	CUD	LT	AONO	BA	1 019 515 633	7	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
411	024/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Aménagement en pavés de certaines voiries de la ville de Douala: Rue liaison Boulevard Est et Route Hopital de Nylon-Rue Tradex-Génie Militaire	TRAV	GROUPE SOMAF SARL	CUD	LT	AONO	BA	1 115 490 668	7	-		
412	017/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Travaux d'aménagement en pavés de certaines voiries dans la ville de Douala: Route Japoma-Chefferie Canton BAKOKO-Carrefour Cité des Palmiers-Marché PK14	TRAV	CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION "CRBC CO"	CUD	LT	AONO	BA	1 507 080 065	7	-		
413	009/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Maîtrise d'œuvre pour la surveillance des travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires: Route Entrée Lycée de Ndogpassi-Carrefour Chefferie Ndogpassi II	SPI	GROUPEMENT TYGA SOLUTIONS ET DIDON CONSEIL	CUD	LT	AONR	BA	130 240 080	5	-		
414	013/M/CUD/SG/DSGP/SDP MAP/2022	Travaux de stabilisation de la zone d'éboulement de NDOGBONG-SOCAVER, phase I	TRAV	KJBTP SARL	CUD	LT	AONO	BA	925 248 631	3	-		
415	01/LM/CAN3/SIGAMP/2022	Pour les travaux de construction d'une clôture, d'un restaurant d'une salle de détente y compris l'aménagement des espace extérieures de l'hôtel de ville de Nkongsamba 3eme	AG	SAVANNA	C_NKONGSAMBA_II	LT	AONO	FEICOM	151 564 390	6	-	5	5
416	003/M/CUG/SG/DST/CIPM/CCM-SPI/2021	Réalisation d'un Plan d'Occupation au Sol	SPI	GROUPEMENT HUMAN TECHNOLOGY RESOURCES CAMEROON&ETS EMERGENCE/HTC	CU_GAROUA	NO	AONR	BIP	179 135 681	11	1		
417	05/LC/C-GDER/SCPM/CIPM/2021	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de SOULKANDOU, lot 1	TRAV	ETS MOBACH	C_GUIDER	NO	AONO	BIP	199 999 885	8	1		
418	004.1/M/C-GASCHIGA/CIPM/2021	Construction de 10 blocs de 02 salles de classe équipées de tables-bancs et 10 blocs latrines à 06 compartiments dans certaines Ecoles Publiques de la Commune de GASCHIGA.	TRAV	ETS ZAKAR ET FRERES	C_GASHIGA	NO	AONO	FEICOM	104 825 468	12	-		
419	001/M/CRB/SG/2021	Construction d'un Centre Multiculturel et Touristique à REY-BOUBA.	TRAV	ETS INNA AISSATOU	C_REY BOUBA	NO	AONO	FEICOM	108 198 149	8	-		
420	000002/M/CRN/SG/CIPM/2021	Construction d'une extension du bâtiment abritant le Conseil Régional	TRAV	DNB INTERNATIONAL SARL	CR_NO	NO	GG	BA	150 000 000	-	-	4	1
421	29/M/C-NG/CIPM/2021	Travaux de Construction de l'Hotel de Ville de la commune de Ngong	TRAV	GLOBAL ENGINEERING CORPORATION SARL	C_NGONG	NO	AONO	FEICOM	347 375 250	7	-	10	-
422	05/M/CUB/SG/DAG/SDMGP/SPMP/CIPM/2021	Réhabilitation de l'immeuble abritant l'hôtel de ville de Bafoussam	TRAV	ETS DAVID & FRERES	CU_BAFOUSSAM	OU	GG	FEICOM	176 297 435	10	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
423	01/M/CUB/SG/SDMGP/SPM P/CIPM/2021	Acquisition d'une pelle excavatrice sur pneus 5 (Lot 1)	AG	FOKOTO ATD (AUTO TECHNIC DIFFUSION) SA	CU_BAFOUSSAM	OU	AONO	BA	189 000 000	12	1		
424	02/M/CUB/SG/DAG/SDMG/CIPM/2021	Acquisition d'un camion benne 20 tonne (Lot 2)	AG	FOKOTO ATD (AUTO TECHNIC DIFFUSION) SA	CU_BAFOUSSAM	OU	AONO	BA	102 000 000	12	1		
425	01/M/C-MDA/CIPM/2021	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'hôtel de ville de Mbouda	SPI	TECHNICIS SARL	C_MBOUDA	OU	AONR	FEICOM	481 917 694	13	1		
426	07/LC/BDJA/SG/CIPM AI/2021	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière CHI LA'A LAK dans le Village BALAKO - Bandja (Lot 2)	TRAV	CABTE SERVICE LIPANO SARL	C_BANDJA	OU	AONO	BIP	266 999 999	11	-		
427	005/LC/2021/C.BGRAIN/SG	E.P de KOUCHONG construction d'un bloc de deux (02) salles de classe	TRAV	STPE SARL	C_BANGOURAIN	OU	AONO	BIP	169 992 454	12	1		
428	002/LC/CFBAN/CIPM/2021	CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL DE L'ESPACE STRUCTURANT DANS LA COMMUNE DE FOUMBAN (EN PROCEDURE D'URGENCE)	TRAV	NETTOYAGE INDUSTRIEL CAMEROUNAIS (NICAM)	C_FOUMBAN	OU	AONO	BIP	353 842 541	12	-		
429	015/LC/CBKA/CIPM/2021	TRAVAUX DE LA ROUTE COMMUNALE ETA-BAKOJYICARREFOUR BALOUM AEC BRELLE CHEFFERIE BANKA-CHEFFERIE BANKA-CHEFFERIE TOUKAP-CARREFOUR TCHAA-CARREFOUR BALOUM (12KM)	TRAV	PRO INTER SARL	C_BANKA	OU	AONO	FR	109 918 688	10	-		
430	18/M/C.DS/SG/CIPM/2021	Travaux de fourniture et d'installation de 106 lampadaires solaires à simple crosse et à composants séparés dans la ville de Dschang (en procédure d'urgence)	AG	STE FIRST SERVICES SARL	C_DSCHANG	OU	AONO	FEICOM	146 853 155	13	2		
431	01/M/CPM/SG/SM/CIPM/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE PENKA-MICHEL	TRAV	ETS MBAKAM	C_PENKA-MICHEL	OU	GG	FEICOM	257 800 000	11	-		
432	04/LC/CUB/SDMGP/2021	TRAVAUX DE FOURNITURE ET INSTALLATION DE 114 LAMPADAIRES SOLAIRES NEUFS A SIMPLE CROSSE ET A COMPOSANTES SEPARÉES DANS LA VILLE DE BAFOUSSAM	TRAV	ETS DJANKAM & FILS	CU_BAFOUSSAM	OU	DC	FEICOM	156 559 151	14	1		
433	001/M/C.MLT/CCPM-TI/2021	POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE MALANTOUEN (INTER RO 609) AVANT EPB FERUPA MANJE MAGNIT-MANJE KOUTOU SUR 15 KM DANS LA COMMUNE DE MALANTOUEN.	TRAV	LE FLEURON SARL	C_MALENTOUEN	OU	AONO	FR	130 537 112	12	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
434	001/M/2021/C.BGRAIN/SG	Pour l'Exécution des routes communales PAGHA (Inter P20) - FONKA LONG =4,5 Km avec construction de deux (02) pont définitif de portée 5ml et deux dalot de 2 X 1,5 X 6m dans l'Arrondissement de Bangourain, Département du Noun, Région de l'Ouest	TRAV	SOGEMARCAM SARL	C_BANGOURAIN	OU	AONO	FR	149 950 865	12	-		
435	010/LC/CIPM/CBAH/2021	ASSAINEMENT ET D AGRANDISSEMENT DE LA ROUTE CARREFOUR SADO CARREFOUR ANCIEN PHASE 1	TRAV	ETS WAM'S AUTOMOBILE	C_BAHAM	OU	AONO	BIP	199 999 149	12	-		
436	00/M/CUB/SG/CIPM/2022	COLLECTE TRANSPORT DES ORDURES MENAGERES DU BALAYAGE ET DU NETTOYAGE DES RUES PLACES PUBLIQUES GARES ROUTIERES ET MARCHES AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DECHETS DE LA VILLE DE BAFOUSSAM	AG	HYSACAM SA	CU_BAFOUSSAM	OU	AONO	BIP,BA	10 922 223 190	3	-		
437	003/M/CFBAN/CIPM/2021	Construction de 07 blocs de 02 salles de classe en matériaux locaux dans les écoles publiques suivantes: EP de Mbouogom à Koupa Matapit; EP de Njikwet à Koupa Matapit; EP de Magnabon; EP de Manfu de Koundoum; EP de Koupfapche et EP de de Marron dans la commune de Fouban en procédure d'urgence	TRAV	ETS SAMARY ET CIE SARL	C_FOUMBAN	OU	AONO	FEICOM	158 550 000	9	-		
438	14/M/CBLKOU/SG/CIPM/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE BAKOU	TRAV	ETS ESIP SERVICES	C_BAKOU	OU	AONO	FEICOM	279 991 000	6	-		
439	01/M/CUE/CIPM/2021	Travaux de réhabilitation de l'éclairage public dans la ville d'Ebolowa	TRAV	SOPROCIT SARL	CU_EBLOWA	SU	AONO	FEICOM	350 652 526	13	-		
440	001/M/C.LOLO/CIPM/SG/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HOTEL DE VILLE DE LA COMMUNE DE LOLODORF	TRAV		C_LOLODORF	SU	AONO		274 002 443	12	1		
441	001/M/DVNT/CKO/CIPM/2021	CONSTRUCTION DE DIX-HUIT (18) ADDUCTION D'EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE KYE-OSSI	TRAV	PURE ENERGY AFRICA S A	C_KYE-OSSI	SU	AONO	FEICOM	116 780 333	12	-		
442	002/M/DVNT/CKO/CIPM/2021	CONSTRUCTION DE DIX-HUIT (18) ADDUCTION D'EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE KYE-OSSI	TRAV	IGTX SARL	C_KYE-OSSI	SU	AONO	FEICOM	115 075 248	12	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
443	003/M/DVNT/CKO/CIPM/2021	CONSTRUCTION DE DIX-HUIT (18) ADDUCTIONS D'EAU AVEC POMPAGE SOLAIRE DANS CERTAINES LOCALITÉS DE LA COMMUNE DE KYE'OSSI	TRAV	MARTEAU SERVICES SARL	C_KYE-OSSI	SU	AONO	FEICOM	118 672 830	12	-		
444	001/M/RS/DvNT/C-ABAM/SG/SCODELMAP/SIGAMP/2021	Construction de l'Hôtel de Ville d'Ambam	TRAV	ETS NB FOURNITURES-SERVICES	C_AMBAM	SU	AONO	FEICOM	479 992 174	12	-		
445	01/M/C.BBANE/CIPM/2021	Travaux s'entretien de la route NGOZIP 1 -NGOZIP 2 -BIWONG BANE -NKOLAMOYOAN	TRAV	ETS KENFACK ET FILS	C_BIWONG BANE	SU	GG	BIP	149 962 340	4	-		
446	0009/M/CUK/SG/CIPM/2021	Travaux de réhabilitation de certaines routes communales dans le centre urbain de la ville de Kribi	TRAV	ETS REG	CU_KRIBI	SU	AONO	BA	439 429 691	7	-		
447	06/M/AONO/C-BBU/CIPM/MVILA/2021	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CERTAINES ROUTES EN TERRE DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIWONG-BULU	TRAV	ETS FIRST PRINT SERVICE	C_BIWONG BULU	SU	AONO	BIP	149 999 999	12	2	-	-
448	039/LC/SG/C-DJO/SG/2021	TRAVAUX DE LOGEMENT D'UN TERRAIN DE 50 HECTARE	TRAV	ETS BAHOU & CIE	C_DJOUM	SU	AONO	FEICOM	137 853 000	12	-		
449	005/MAYOR/TIKO/TCTB/21	Construction and equipment of a modern ceremonial grandstand in tiko	TRAV	CAMEROON CONTRACTORS	C_TIKO	SW	AONO	BA	100 000 000	16	2		
450	002/MAYOR/AC/ACTB/PIB2021	CONSTRUCTION OF A MUNICIPAL HOTEL IN AKWAYA TOWN (PHASE 1).	TRAV	BAS-CAM ENTERPRISE	C_AKWAYA	SW	AONO	BIP	100 000 000	13	1		
451	N01/ONIT/KUMBAlII/MEME/ITB/2021	Acquisition and installation of 50 solar street lights in Kumba II municipality	TRAV	ETCHI GRAPHICS	C_KUMBA_II	SW	AONO	BIP	100 000 000	14	1		
452	09/JO/BCITB/PIB2021	Construction of a council chamber	TRAV	BRUNO & SONS	C_BAMUSSO	SW	AONO	BIP	294 464 750	13	-		
453	08/CO/ETCITB/2021	MAINTENANCE WORK OF THE BONGONGO-LIPENJA-BAROMBI-BEKORA ROAD WITH THE CONSTRUCTION OF 02 BRIDGES OVER IRIBA, WA BOTATA RIVER AND NAMBUFI MBUSA RIVER	TRAV	CANAAN ENTERPRISE	C_EKONDO_TITI	SW	AONO	BIP	199 992 888	13	-		
454	05/JO/DCCITB/2021	MAINTENANCE WORK OF THE LOBE ESTATE - DIKOME ROAD	TRAV	ETS T MICHEL CAM	C_TOKO	SW	AONO	BIP	199 979 507	13	-		
455	N02/C/KCC/MEME/KCCITB/2021	For the rehabilitation of the Amusement park at town green kumba	TRAV	EASY POINT	CU_KUMBA	SW	AONO	BIP	100 000 000	14	-		
456	N01/C/KCC/MEME/KCCITB/2021	FOR THE TARRING OF SOME STREETS IN KUMBA MUNICIPALITY	TRAV	EAGLE WINGS AND JAGUAR INCORPORATION LTD	CU_KUMBA	SW	AONO	BIP	175 624 990	14	-		
457	001/JO/MCITB/2021	CONSTRUCTION OF BRIDGE OVER THE IYORO RIVER 12ML WITH OPENING ROAD OF IYAS HOTEL - ESCADROM GENDARMERIE	TRAV	ETS T MICHEL CAM	C_MUNDEMBA	SW	AONO	BIP	120 000 000	13	-		
458	011/C/BADEPP/2021	SUPPLY OF (01) SAND SUNCTION/ PUMPING MACHINE AT IDENAU BEACH	AG	AFRICA TECHNOLOGIES SARL	C_ISANGUELE	SW	AONO	AFD	123 999 728	13	1		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
459	007/C/BADEPP/2021	CONSTRUCTION OF THE FISHERMEN HOSTEL (STUDY AND EXECUTION IN IDABATO) AND HOUSING MATERIALS AND TECHNICAL SUPPORTS	TRAV	DICAM ENGINEERING GROUP	C_ISANGUELE	SW	AONO	BIP	274 999 363	13	-		
460	08a/C/BADEPP/2021	CONSTRUCTION OF WHARF AT NEW BEACH ISANGELE	TRAV	TETCO OFFSHORE S.A.L	C_ISANGUELE	SW	AONO	BIP	279 901 113	13	-		
461	006/CN/BANGEMCOUNCIL/B CITB/KM/SWR/2021	THE EMBELLISHMENT OF BANGEM COUNCIL CHAMBERS	TRAV	ETS SHEDEX GLOBAL	C_BANGEM	SW	AONO	FEICOM	115 162 792	10	-		
462	01/DC/R-AD/D-FD/C-TIG/CIPM-CTIG/SIGAM/2021	ACQUISITION DU MATERIEL DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA COVID-19	AG	ETS SIDIKI ABOUBAKAR	C_TIGNERE	AD	GG	BIP	11 066 662	10	2		
463	0007/LC/CRAD/CIPM/2021	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DÉCORATION DES BUREAUX DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA	AG	ETS MASSA	CR_AD	AD	GG	BA	49 995 747	9	-		
464	001/LC/CRAD/CIPM/2021	REALISATION D'UN MINI RESEAU D'APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DU BATIMENT R+1 ABRITANT LE CONSEIL REGIONAL DE L'ADAMAOUA	TRAV	ETS IBM	CR_AD	AD	GG	BA	19 999 999	10	-		
465	008/LC/CRAD/SG/2021	ACQUISITION DE 10 MOTOCYCLETTES DE TYPE YC-Z125 POUR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA	AG	CENTRAL MOTORS CAMEROUN	CR_AD	AD	GG	BA	21 999 991	8	-		
466	0012/LC/CRA/SG/CIM/2021	ELABORATION DE PLAN REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE L4aDAMAOUA	SPI	STE ANDAL SYNERGY ENGINEERING	CR_AD	AD	GG	BA	30 000 000	10	-		
467	0004/M/CRAD/CIPM/2021	acquisition du mobilier pour la salle des actes du conseil régional de l'Adamaoua	AG	CONFORT HOUSE SARL	CR_AD	AD	GG	BA	84 309 750	10	2		
468	0005/LC/CRAD/CIPM/2021	acquisition du matériel et mobilier de bureau pour la salle de réunion du conseil régional	AG	CONFORT HOUSE SARL	CR_AD	AD	GG	BA	34 761 375	9	-		
469	003/LC/CRAD/CIPM/2021	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN GROUPE ELECTROGENE DE 5 KVA DANS LE BÂTIMENT ABRITANT LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA	AG	ETS IBM	CR_AD	AD	GG	BA	15 000 000	10	-		
470	0006/LC/CRAD/CIPM/CIPM/2021	ACQUISITION DES KITS INFORMATIQUES POUR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA	AG	ETS BARAKAT BUSINESS	CR_AD	AD	GG	BA	49 979 216	10	-		
471	009/LC/CRAD/SG/CIPM/CRA D/2021	FORMATION EN MANDATURE DUS ÉLUS RÉGIONAUX ET DES PERSONNELS DU CONSEIL RÉGIONAL	SPI	ETS CABINET IBRAHIMA ALIOU	CR_AD	AD	GG	BA	19 999 954	8	-		
472	0002/LC/CRAD/SG/2021	ÉTUDES TECHNIQUES ET ARCHITECTURALES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEL IMMEUBLE SIÈGE DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA (phasel)	SPI	ARCHITECTURE TECHNIQUE ET CONSTRUCTION (ATC)	CR_AD	AD	GG	BA	49 935 940	10	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
473	0010/B/CRAD/CIPM/2021	SOUSCRIPTION D'UNE POLICE D'ASSURANCE MALADIE ÉVACUATION SANITAIRE -ASSISTANCE PAR LE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ADAMAOUA (LOT N°2: primes d'assurances du chef de l'Exécutif,des adjoints et du personnel)	SPI	AGENT GENERALE SAAR ASSURANCE	CR_AD	AD	GG	BA	19 998 713	9	-		
474	0010/LC/CRA/CIPM/2021	SOUSCRIPTION D'UNE ASSURANCE MALADIE ET ÉVACUATION SANITAIRE POUR LE CONSEIL REGIONAL ADAMAOUA	SPI	AGENT GENERALE SAAR ASSURANCE	CR_AD	AD	GG	BA	29 999 024	9	2		
475	0000/m/mo/cndal/cipm/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 03 PARCS D'INTERVENTION ZOO SANITAIRE EQUIPES DUN BLOC LATRINES 02 CELLULES MAGBOR? TAPARE YOKO BEKA GOTTO DANS LA COMMUNE DE NGAOUNDAL	TRAV	ETS BISKEWAL	C_NGAOUNDAL	AD	GG	PRODEL	60 817 325	8	-		
476	01/M/CO/JO3/CIPM/21	Construction d'un centre commercial à Okola (phase 1 : un bâtiment R+1 pour 20 boutiques, une boulangerie, un espace de restauration et un bloc de 04 toilettes)	TRAV	CETRA BTP SARL	C_OKOLA	CE	GG	BIP	99 877 361	15	-	-	-
477	02/M/CO/JO3/CIPM/21	Travaux de parachèvement du CPFF d'Okola	TRAV	ETS GLOBAL AFFAIRS TRAINING	C_OKOLA	CE	GG	BIP	65 625 422	16	-	-	-
478	07/LC/CO/JO3/CIPM/21	Équipement du matériel médical au CSI de MEKAK-lot1	AG	ETS AMOUR ET LOUANGES	C_OKOLA	CE	GG	BIP	8 000 000	12	1	-	-
479	06/LC/CO/JO3/CIPM/21	Équipement du matériel médical au CSI de YEGUEASSI-lot2	AG	ETS AMOUR ET LOUANGES	C_OKOLA	CE	GG	BIP	8 000 000	12	1	-	-
480	08/LC/CO/JO3/CIPM/21	Éclairage public en énergie solaire avec 16 lampadaires sur l'itinéraire lycée classique d'Okola-Centre Commercial d'Okola	TRAV	ETS EMILIO	C_OKOLA	CE	GG	BIP	19 959 200	13	-	-	-
481	04/LC/CO/JO3/CIPM/21	Réhabilitation du tronçon routier Enobita fin cloture général-CR Oban-CR Louma (5.8km)	TRAV	ETS COGECI	C_OKOLA	CE	GG	BIP	26 999 999	12	-	-	-
482	02/LC/CO/JO3/CIPM/21	Construction d'une mini-adduction d'eau au quartier sous préfecture	TRAV	AIR FORAGE SARL	C_OKOLA	CE	GG	BIP	24 801 675	17	-	-	-
483	004/LC/C/DK/SG/SPM/CIPM/2021	Construction d'un forage avec PMH à quartier résidentiel-plateau de Deuk - Lot 1	TRAV	ETS GBAAMA	C_DEUK	CE	GG	BIP	8 383 273	7	-		
484	0004/LC/C/DK/SG/SPM/CIPM/2021	Construction d'un forage avec PMH à Mpouga - Lot 3	TRAV	ETS GBAAMA	C_DEUK	CE	GG	BIP	8 383 275	8	-		
485	00004/LC/C/DK/SG/SPM/CIPM/2021	Construction d'un forage avec PMH à Mpagne - Lamboue - Lot 4	TRAV	ETS GBAAMA	C_DEUK	CE	GG	BIP	8 383 273	7	1		
486	000004/LC/C/DK/SG/SPM/CIPM/2021	Construction d'un forage avec PMH à Mpagne - Lot 5	TRAV	ETS GBAAMA	C_DEUK	CE	GG	BIP	8 383 275	7	1		
487	002/LC/CAK/SG/CIPM	Réhabilitation du tronçon de route carrefour Adzap-nkol nlong III - Lot 1	TRAV	ETS NOA & FILS	C_AKONO	CE	GG	BIP	33 982 196	8	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maître d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
488	003/C/CAK/SG/CIPM/2021	Réhabilitation de la piste agricole Okombe-rive Nyong carrefour adjap nkot mbama - Lot 2	TRAV	ETS NOA & FILS	C_AKONO	CE	GG	BIP	34 979 533	9	1		
489	08/M/CE/MAIRE/SG/2021	Installation de quarante (40) lampadaires photovoltaïques	TRAV	ETS MARKA	C_ENDOM	CE	GG	BIP	67 000 000	11	3	-	-
490	010/LC/CE/MAIRE /SG/2021	Raccordement Des lignes triphasées ENDOM-MEBASSA-EDJOM avec installation d'un inverseur automatique	TRAV	MUTNAL INC SARL	C_ENDOM	CE	GG	BIP	19 987 965	11	1	-	-
491	001/M/CAK/SG/CIPM/21	TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CERTAINES ROUTES COMMUNALES DANS LA COMMUNE D'AKONO DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO	TRAV	ETS NOA & FILS	C_AKONO	CE	GG	BIP	99 984 614	8	-		
492	03/LC/CMBA/SG/CIPM/2021	FOURNITURE D'UN CAMION BENNE DESTINE A LA COMMUNE DE MBANDJOCK	AG	ARTIFIS CONSULTING	C_MBANDJOCK	CE	GG	BA	40 000 000	10	-	-	-
493	01/LC/CO/JO3/CIPM/21	CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LA LOCALITE DE NKOLPOBLO	TRAV	ETS NGA	C_OKOLA	CE	GG	BIP	7 997 037	14	-	-	-
494	002/M/RC/CMBMO/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DE LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE EN 03 LOTS LOT 2 : ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE ZOUATOUPSI-NKOLMAN (05KM)	TRAV	ETS CHIC DESIGN & PRITING	C_MBANKOMO	CE	GG	FR	79 999 459	7	-	2	1
495	022/LC/RC/CMBMO/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO EN 03 LOTS LOT 2 : CARREFOUR KOLI CHEFFERIE-MMBANYEGUE	TRAV	ETS LM & FRERES	C_MBANKOMO	CE	GG	BIP	17 885 408	6	-	-	-
496	021/LC/RC/CMBMO/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO EN 03 LOTS LOT 3 : RN3-NKOLYEGUE	TRAV	ETS WADJIRI & COMPAGNIE	C_MBANKOMO	CE	GG	BIP	12 545 584	6	-	-	-
497	020/LC/R/CMBMO/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DANS LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO EN 03 LOTS LOT 1 : MBANKOMO VILLAGE-ANGON II	TRAV	ETS WADJIRI & COMPAGNIE	C_MBANKOMO	CE	GG	BIP	17 973 930	6	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
498	004/LC/PR/G&G/CMBMO/CI PM/21	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DE LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE EN 03 LOTS LOT 3 : CONTROLE DES TRAVAUX	SPI	ETS WADJIRI & COMPAGNIE	C_MBANKOMO	CE	GG	BIP	8 000 000	7	-	1	-
499	001/M/RC/CMBMO/CIPM/2021	TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES DE LA COMMUNE DE MBANKOMO, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, REGION DU CENTRE EN 03 LOTS LOT 1 : ENTRETIEN DU TRONCON INTER (CARREFOUR OVENG)-MBAYENGUE-NKOLBIBANDA-NKONG ABOCK CARREFOUR (17,30km)	TRAV	ETS ANCA DECOR	C_MBANKOMO	CE	GG	BIP	79 992 900	7	-	1	3
500	09/LC/C.LOBO/CIPM/21	MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE LOBO	SPI	SCETRA - BET(SOCIETE CENTRALE DES ETUDES ET DES TRAVAUX - BUREAU	C_LOBO	CE	GG	BIP	18 025 076	12	1		
501	08/LC/C.LOBO/CIPM/21	REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE LOBO CARREFOUR NGOULMEKONG	TRAV	AIR FORAGE SARL	C_LOBO	CE	GG	BIP	34 955 287	12	4		
502	02/M/COM.BGA/CIPM/21	REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE PAMNASSI NKOGEKANG	TRAV	ETS FOMENE CAMEROUN	C_BATCHENGA	CE	GG	BIP	69 937 728	8	-		
503	01/M/COM.BGA/CIPM/21	REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE CARREFOUR OTIBILI VILLAGE NDJI	TRAV	ETS FALCON	C_BATCHENGA	CE	GG	BIP	59 959 139	8	-		
504	LC N°12/LC/C.NKMT/2021	MAITRISE D'ŒUVRE DU SUIVI ET DE CONTROLE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON DE ROUTE COMMUNALE	SPI	ICO GLOBAL LIMITED	C_NKOLMETET	CE	GG	FR	7 499 649	12	1	5	6
505	010/LC/CE/MAIRE/SG/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN LOGEMENT D ASTREINTE POUR LES ENSEIGNANTS DE L EP DE MEDJEME	TRAV	ETS TAFFO	C_ENDOM	CE	GG	BIP	19 987 965	11	1	-	1
506	11/LC/CENDOM/MAIRE/SG/2021	RACCORDEMENT DE LA LINE ELECTRIQUE ENDOM EKOMBA EN RESEAU TRIPHASE AVEC LES POTEAUX EN BETON	TRAV	MUTNAL INC SARL	C_ENDOM	CE	GG	BIP	42 969 645	11	1	-	1
507	10/LC/SG/CIPM-CAFAN/21	Réhabilitation de la route carrefour NSANAKO'O carrefour AWAE-ESSE dans la Commune d'Afanloum	TRAV	PROSPERE ET PERENNE SARL	C_AFANLOUM	CE	GG	BIP	34 915 000	-	-		
508	002/2021/LC/C.WINA/SG/CI PM	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP KALGAM Lot 1	TRAV	ETS FALMAS	C_KALFOU	EN	GG	BIP	31 851 103	6	-		
509	14/LC/CMNE-KLE/CIPM/SG/BSMPC/AI/2021	Construction d'un monument à l'entrée de la ville venant de Maroua (MINAC)	TRAV	ETS DAMA ET FRERES	C_KAELE	EN	GG	BIP	8 000 000	7	-		
510	02/M/CMNE-KLE/CIPM/SG/BSMPC/AI/2021	Construction de la décharge municipale pour stockage d'ordures ménagères (MINEPDED)	TRAV	ETS BOUBA FAMILY SARL	C_KAELE	EN	GG	BIP	54 995 930	7	-		
511	004/LC/C.GOULFEY/CIPM/2021	Ouverture de la piste agricole Ridjil Hamadji-HILELE(10km)	TRAV	ETS DJIBRINE KLETA	C_GOULFEY	EN	GG	BIP	21 000 000	6	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
512	005/LC/C.GOULFEY/CIPM/2021	Réhabilitation de la voirie en terre dans la commune de Goulfeiy avec construction de deux dalots au Carrefour Abakar Mahamat vers la tribune et le complexe sportif	TRAV	ETS DJIBRINE KLETA	C_GOULFEY	EN	GG	BIP	38 900 000	5	-		
513	004/LC/C-KTA/CIPM/2021	Acquisition des intrants et fertilisants	AG	ETS HACHIMI ET FILS	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	10 000 000	4	-		
514	010/LC/C-KTA/CIPM-AI/2021	Eclairage par panneaux solaires dans la commune de KOLOFATA	TRAV	BERCO TECHNOLOGY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	44 988 000	6	-		
515	00/LC/C-KTA/CIPM/2021	Construction d'un magasin de stockage d'oignon à GOUZOUODOU, TOLKOMARI et GANCE	TRAV	SKYLINE CONTRACTORS	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	16 834 236	-	-		
516	005/LC/C-KTA/CIPM/2021	Construction d'un magasin de stockage d'oignon à GOUZOUODOU	TRAV	ETS HACHIMI ET FILS	C_KOLOFATA	EN	GG	BA	16 999 826	4	-		
517	001/C-KTA/CIPM/2021	Équipement en matériel médical du CSI de TOLKOMARI Lot 1	AG	SAMOA COMPANY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	7 970 949	6	1		
518	003/LC/C-KTA/CIPM/2021	Équipement en matériel médical du CMA de AMCHIDE Lot 2	AG	ETS MALLOUM	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	14 999 999	4	-		
519	012/LC/C.KTA/SG/CIPM-TR/2021	Réhabilitation de la route communale Blabline(inter Kourgui - Tolkomari - Gouzoudou - KolofataGuidi (7,3 Km)	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	26 999 999	9	-		
520	006/LC/C.KTA/CIPM/2021	EP TOLKOMARI I: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 1	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	16 499 967	2	-		
521	006/LC/C-KTA/CIPM/2021	EP SANDAWADJIRI: Construction d'un bloc de deux salles de classe Lot 2	TRAV	SOCIETE CHAKMAZ (SARL)	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	16 499 967	4	-		
522	024/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé de PMH à BOUNDERI Lot 1	TRAV	ETS LE PALMIER	C_MORA	EN	GG	BIP	7 999 998	-	-		
523	008/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé de PMH à DJABIRE Lot 3	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	2	-		
524	014/LC/C.MORA/SG/2021	Réalisation d'un forage équipé de PMH à MORA/Quartier Mokolo Lot 4	TRAV	ETS WANDALA	C_MORA	EN	GG	BIP	8 000 000	5	-		
525	002/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé de PMH au CES GOUDJIMDELE Lot 5	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BIP	8 500 000	3	-		
526	007/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipe de PMH à YOLDE DADI Lot 6	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	C_MORA	EN	GG	BIP	8 500 000	2	-		
527	001/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé de PMH à BOURDALA Lot 7	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 500 000	-	-		
528	021/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé de pompes solaires avec bornes fontaines à GUIRBALA	TRAV	ETS LE FROMAGER	C_MORA	EN	GG	BIP	19 209 899	5	-		
529	023/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Extension du réseau électrique à MASSARE II	TRAV	ETS MAHAMA ABBA	C_MORA	EN	GG	BIP	49 999 856	3	-		
530	006/LC/C.MORA//2021	Construction d'un forage pastorale à BALA PLATA/KOSSA	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BIP	20 000 000	3	-		
531	013/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Réalisation d'un forage équipé en PMH à ADAKELE Lot 1	TRAV	ETS WANDALA	C_MORA	EN	GG	BIP	8 000 000	-	-		
532	003/LC/C.MORA//2021	Réalisation d'un forage équipé en PMH à MOGOGNE HARDE Lot 2	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	3	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
533	018/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2021	Construction d'un CZV à BALDAMA Lot 2	TRAV	ETS MAHAMA ABBA	C_MORA	EN	GG	BIP	29 999 985	3	-		
534	011/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	Construction d'un bloc maternel à l'EM AISSA HARDE Lot 1	TRAV	ETS WANDALA	C_MORA	EN	GG	BA	25 000 000	1	-		
535	017/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2021	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MAHOULA Lot 1	TRAV	ETS ADJIA	C_MORA	EN	GG	BIP	19 000 000	2	-		
536	010/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2021	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de YOUNOUS Lot 2	TRAV	ETS CHETIMA MALLOUM	C_MORA	EN	GG	BIP	19 000 000	4	-		
537	0003/M/CUM/CIPM-BEC/2021	Réhabilitation de la fourrière municipale de Domayo dans la commune de Maroua 1er	TRAV	ETS CAMECO B.T.P	CU_MAROUA	EN	GG	BA	60 000 000	3	-		
538	0002/M/CUM/CIPM-BEC/2021	Construction d'atelier de génie civil avec magasin incorporé à la communauté urbaine de Maroua	TRAV	ETS BOUBAKARI & FILS	CU_MAROUA	EN	GG	BA	80 000 000	3	-		
539	0003/LC/CUM/CIPM-TR/2021	Réhabilitation de la route voie de contournement Missinguiléo dans la commune de Maroua 2e	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	CU_MAROUA	EN	GG	BA	45 000 000	3	-		
540	0001/M/CUM/CIPM-TR/2021	Travaux de réhabilitation de la route marché de poulet-Doualaré dans la commune de Maroua 2e	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	CU_MAROUA	EN	GG	BA	98 000 000	3	-		
541	0004/M/CUM/CIPM-TR/2021	Réhabilitation de l'axe IRAD-ELECAM-PLAN CAMEROUN jusqu'à l'intersection de la route Direction Polytechnique de Maroua dans la commune de Maroua 1e	TRAV	ETS BOUBAKARI & FILS	CU_MAROUA	EN	GG	BA	70 000 000	3	-		
542	002/LC/C.KTA/CIPM/2021	équipement en matériel médical au CSI de KEREWA	AG	SAMOA COMPANY SARL	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	7 970 949	-	-		
543	014/C.KTA/CIPM/2021	travaux de construction d'un forage équipé de PMH à BLABLINE	AG	ETS LE PALMIER	C_KOLOFATA	EN	GG	BIP	7 999 999	6	1		
544	013/LC/C.HINA/SG/2021	CONTROLE TECHNIQUE ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DU TRONÇON DE ROUTE COMMUNAL CARREFOUR DJOUMDJOU (31,00km) DANS LA COMMUNE DE HINA, DEPARTEMENT DU MAYO TSANAGA	SPI	ETS SACO-SA	C_HINA	EN	GG	BIP	5 950 575	8	-		
545	003/LC/CREN/CIPM/2021	ACQUISITION ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE AU SIEGE DU CREN	AG	FAI-DA-TE SARL	CR_EN	EN	GG	DGI	9 999 728	9	1		
546	002/M/CREN/CIPM/2021	TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS, CONSTRUCTION DE LA CLOTURE ET DE LA GUERITE AU SIEGE DU CREN	TRAV	COPRES SARL	CR_EN	EN	GG	DGI	59 999 381	9	-		
547	004/M/CREN/CIPM/2021	ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE, VIDEOSURVEILLANCE ET INSTALLATION EN RESEAU AU SIEGE DU CONSEIL REGIONAL	AG	FAI-DA-TE SARL	CR_EN	EN	GG	BIP	92 499 768	6	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
548	0006/M/CUM/CIPM-TR/2021	Travaux de rechargement + dalette de la route Carrefour shell - 10 villas	TRAV	ETS CAMEROON BUSINESS SERVICE	CU_MAROUA	EN	GG	BA	86 900 000	3	-		
549	21/LC/CMNE-KLE/CIPM/PI/2021	Maîtrise d'oeuvre technique des travaux d'entretien de la route Zouana-Zassinri-Gadas (12 km) dans la commune de Kaélé	TRAV	ETS SOLEIL DIVINE PLUS	C_KAELE	EN	GG	BIP	5 973 580	6	-		
550	006/LC/C.L.BIRNI/SG/2021	Travaux d'Eclairages Publiques par 27 Lampadaires dans certaines grandes Agglomérations de la Commune de L. Birni.	TRAV	ETS ANDJAGARA	C_LOGONE_BIRNI	EN	GG	BIP	54 000 000	3	-		
551	006/LC/C.GOULFEY/CIPM/2021	Travaux d'Ouverture de la Route Carrefour Djagaré - Limite Arrondissement Makary.	TRAV	ETS BOUTAL - FIL	C_GOULFEY	EN	GG	BIP	26 999 999	5	-		
552	16/LC/C-MINDIF/CIPM/2021	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'entretien de la route Nanikalou-Mogom-Ouro Bounné long de 10 km	TRAV	INGENIERIE DE SERVICE ET DEDEVELOPPEMENT	C_MINDIF	EN	GG	BIP	7 500 000	7	-		
553	011/LC/CREN/CIPM/2021	Maîtrise d'oeuvre relative Acquisition des matériels de voirie (engins de génie civil) au conseil régional	SPI	PARC NATIONAL DE MATERIEL DE GENIE CIVIL (MATGENIE)	CR_EN	EN	GG	BA	36 000 000	-	-		
554	009/LC/CREN/CIPM/2021	Étude de faisabilité et rédaction de cahier de spécifications techniques pour une centrale solaire dans certaines zones pilotes	SPI	SOLAR KAMERUN TECHNOLOGY	CR_EN	EN	GG	BA	29 619 643	-	-		
555	008/LC/CIPM/CREN/2021	Réalisation des études techniques et géotechniques en vue de l'entretien durable de 44 km de route en terre dans la région de l'extrême-nord	SPI	INGENIERIE DE SERVICE ET DEDEVELOPPEMENT	CR_EN	EN	GG	BA	33 080 846	-	-		
556	007/LC/CREN/CIPM/2021	Recrutement des cabinets et consultants en vue de la finalisation d'un plan régional de développement de la région de l'extrême-nord	SPI	INTERACTION GIE	CR_EN	EN	GG	BA	24 899 400	-	-		
557	000005/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LA LOCALITE DE BOUDOUA BOUKAR	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	-	-		
558	009/LC/C.MORA/CIPM-ROUTE/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE T1: HOPITAL GODIGON-GODIGON CHEFFERIE= 3.400KM; T2: GODIGON CHEFFERIE-EP IGZAWA=1.700km	TRAV	ETS ABDOULAYE ALI	C_MORA	EN	GG	BIP	27 000 000	-	-		
559	004/LC/C.MORA/SG/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LA LOCALITE DE GUEBEDE	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	-	-		
560	015/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH A WALKAME.	TRAV	ETS WANDALA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	-	-		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
561	019/LC/C.MORA/CIPM-TBEC/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MAGASIN DE STOCKAGE DE CEREALES A ZOUELA	TRAV	ETS MAHAMA ABBA	C_MORA	EN	GG	BIP	22 999 883	-	-		
562	032/LC/C.MORA/CIPM/2021	TRAVAUX DE PROTECTION PARTIELLE DES BERGES DU MAYO WLLADE AU LIEU DIT MBARMA	TRAV	ETS ABBA CHETIMA	C_MORA	EN	GG	BA	7 000 000	-	-		
563	004/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LA LOCALITE DE GUEBEDE	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	-	-		
564	005/LC/C.MORA/CIPM-AI/2021	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN FORAGE EQUIPE DE PMH DANS LA LOCALITE DE BOUDOOUA BOUKAR	TRAV	ETS AGA	C_MORA	EN	GG	BA	8 000 000	-	-		
565	022/M/GG/CBO/SG/CIPM/2021	Construction d'un ouvrage de franchissement de type dalot à Betare Oya	TRAV	RAZEL CAMEROUN SA	C_BETARE-OYA	ES	GG	BIP	99 954 862	9	-	7	5
566	001/M/CGB/SG/CIPM/2021	Réhabilitation du lac municipal dans la commune de Garoua-Boulai	TRAV	ETS MAMOUDOU NASROU	C_GAROUA-BOULAI	ES	GG	BIP	99 505 181	17	-		
567	05/LC/CAD3/CIPM/2021	achèvement du CMA de MBANGA PONGO	TRAV	ETS JOSDJEMO	C_DOUALA_III	LT	GG	BIP	34 999 678	7	1	4	2
568	01/LC/CAE1ER/SM/2021	Maîtrise d'oeuvre destravaux d'aménagement de la voie"Carrefour-rond-amour-sous-préfecture-CarrefourCNPS-Commissariat Bisséké-Sortie Camp Sic(lieudit Alino)	TRAV	ETS BEP SERVICES	C_EDEA_I	LT	GG	FR	37 559 258	7	2		
569	05/LC/COMMUNE-LOUM/SG/CIPM/2021	FOURNITURE DU MATERIEL D SSAINISSEMENT DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC COVID19	TRAV	ETS MANUELA ET COMPAGNIE	C_LOUM	LT	GG	BIP	4 999 906	6	1	5	-
570	05/LC/CAN3E/SIGAMP/2021	Acquisition des matériels de lutte contre le coronavirus	AG	ETS AMAES	C_NKONGSAMBA_II	LT	GG	BIP	11 659 293	8	1	-	-
571	002/M/C.POUMA/CIPM/SM/2021	Travaux de construction de 07 forages dans certaines localités de POUMA	TRAV	WC DISENG SARL	C_POUMA	LT	GG	BIP	58 000 000	8	-	11	3
572	LC n°004/LC/SG/C.MSOK/2021	MAITRISE D'OEUVRE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE LA ROUTE COMMUNALE IHENDEL-ISSONDJE 2	SPI	ETS INNOVATIONS	C_MASSOCK	LT	GG	FR	7 500 000	7	1	-	-
573	13/LC/COMMUNE-LOUM/SG/CIPM/2021	Projet d'aménagement de la bibliothèque Municipale de Loum	TRAV	COMPLEXE TECHNOLOGIQU E ET DE PRESTATION SARL	C_LOUM	LT	GG	BIP	5 000 000	9	-	7	-
574	003/LC/C.MKO/CIPM/2021	Réhabilitaion et équipement du Centre de la Promotion de la Femme et de la Famille	TRAV	KONYVE SARL	C_MOUANKO	LT	GG	BIP	23 103 431	7	-	10	-
575	011/LC/CAD3/CIPM/2021	Travaux d'aménagement des voiries centre administratif sous préfecture-recette municipale (2eme phase)	TRAV	LINK SERVICES CAMEROUN SARL	C_DOUALA_III	LT	GG	BIP	62 339 979	7	-	-	-

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
576	007/LC/CR_LT/CIPM/2021	MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'ACQUISITION DU MATERIEL DE GENIE CIVIL AU CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL	SPI	PARC NATIONAL DE MATERIEL DE GENIE CIVIL (MATGENIE)	CR_LT	LT	GG	BA	35 774 952	-	-	9	2
577	001/M/C-MH/SG/ST/2021	Construction d'une adduction d'eau potable (phase II)	TRAV	ETS MASSA	C_BARNDAKE	NO	GG	BIP	70 000 000	7	-	3	3
578	009/LC/CRN/SG/CIPM/2021	Équipement des résidences de fonction	AG	MARCOZAK	CR_NO	NO	GG	BA	18 832 139	7	-		
579	00011/M/CRN/SG/CIPM/2021	Equipement et aménagement de la salle de Conseil et de la salle réunion	TRAV	CONFORT HOUSE SARL	CR_NO	NO	GG	BA	62 814 938	-	-		
580	0005/M/CRN/SG/CIPM/2021	Aménagement d'un parc d'engins de génie civil	TRAV	TRANSCONTINENTAL TRAVELS AND SERVICE AGENCY SARL (IT)	CR_NO	NO	GG	BIP	50 000 000	7	-		
581	0003/LC/CRN/SG/CIPM	Aménagement de bureaux à la Délégation Régionale de l'Education de Base du Nord	TRAV	TRANSCONTINENTAL TRAVELS AND SERVICE AGENCY SARL (IT)	CR_NO	NO	GG	BIP	50 000 000	10	-		
582	0001/LC/CRN/SG/CIPM/2021	Construction et aménagement de parkings couverts	TRAV	DNB INTERNATIONAL SARL	CR_NO	NO	GG	BA	11 000 000	7	-	5	1
583	004/LC/CRN/SG/CIPM	Sécurisation de la cloture	TRAV	TRANSCONTINENTAL TRAVELS AND SERVICE AGENCY SARL (IT)	CR_NO	NO	GG	BIP	14 999 265	8	-		
584	000006/LC/CRN/SG/CIPM/2021	Acquisition du mobilier de bureau	AG	CONFORT HOUSE SARL	CR_NO	NO	GG	BA	42 035 625	-	-		
585	09/M/CABAF2/CIPM/AI/2021	Projet extension électrique de l'axe BOBDA –Carrefour TAGHANG à Bapi King Place (Lot 1)	TRAV	ETS GEFRAC	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	20 000 000	13	2		
586	10/M/CABAF2/CIPM/AI/2021	Projet d'électrification du quartier axe Fampie I (carrefour SOP KAPTUE-ancienne brigade TCHATIO) (Lot 2)	TRAV	ETS GNADENEU & FILS	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	30 000 000	13	1		
587	02/M/C-BGTE/CIPM/21	POUR LA RÉHABILITATION DE CERTAINS TRONÇONS DE ROUTES ET OUVERTURE DES PISTES AGRICOLE DANS LA COMMUNE DE BANGANGTE	TRAV	N.N.J. SARL	C_BANGANGTE	OU	GG	BIP	85 000 000	11	-		
588	13/M/CABAF2/CIPM/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION ET OUVERTURE DU BASSIN AGRICOLE ALLANT DE TAKOUCHE SANGSANG A BAYE LOT1	TRAV	GEFA & ENGINEERING SARL	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	69 999 000	10	4		
589	12/M/CABAF2/CIPM/AI/221	TRAVAUX DE REHABILITATION DU TRONCON CARREFOUR TAPOFO-BAPI-BADENG-BANEFO LOT2	TRAV	ETS GNADENEU & FILS	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	53 999 000	11	3		

GROUPEMENT SEC DIARRA – BEKENG

N°	Référence du marché	Intitulé du marché	Nature des prestations	Titulaire	Maitre d'ouvrage	Région	Mode de passation (GG, AO)	Source du financement	Montant TTC du marché signé	Documents disponibles (suivant la BD)		Documents communiqués à l'Auditeur	
										Passation	Exécution	Passation	Exécution
591	16/LC/CIPM/CABAF2/2021	MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES ROUTES COMMUNALES DANS LA COMMUNE DE BAFOUSSAM2	SPI	ETS GECID'AF	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	9 999 160	11	1		
592	14/M/CIPM/CABAF2/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE CARREFOUR BAYE-TICHA-FAMCHUET LOT1	TRAV	ETS MP3	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	79 998 200	11	-		
593	15/M/CIPM/CABAF2/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE KALE-TCHADA-CHEFFERIE BANEFO LOT1	TRAV	GEFA & ENGINEERING SARL	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	54 969 999	11	-		
594	21/M/CIPM/CABAF2/2021	TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA ROUTE COMMUNALE BRETELLE-NEFOLEM-PONT CHIFET LOT2	TRAV	GEFA & ENGINEERING SARL	C_BAFOUSSAM_II	OU	GG	FR	64 982 690	11	-		
595	01/LC/CPM/SG/CIPM/2021	MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE DE PENKA-MICHEL	SPI	ETS BETTER BUILDING	C_PENKA-MICHEL	OU	GG	FEICOM	18 045 864	11	1		
596	06/LC/CBNA/CIPM-AG/2021	ACQUISITION DES KITS SANITAIRES ,DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONA VIRUS	AG	TAGNING MEDICAL SARL	C_BANA	OU	GG	FOND SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTRE CONTRE LE COVID ET SES REPERCUSSIONS ECONOMIQUES	5 000 000	6	2		
597	05/LC/SG/CBKOU/SG/CIPM/2021	ACQUISITION DES KITS SANAIRE ET EQUIPEMENT ET MATERIELS DE LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID	AG	ETS KOLE	C_BAKOU	OU	GG	FOND SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTRE CONTRE LE COVID ET SES REPERCUSSIONS ECONOMIQUES	5 000 000	6	2		
598	00/LC/KEKEM/CIPM/2021	Fourniture du materiel destine a la lutte contre le corona Virus	AG	ETS ADAAMS	C_BANDJA	OU	GG	FOND SPECIAL DE SOLIDARITE NATIONALE POUR LA LUTTRE CONTRE LE COVID ET SES REPERCUSSIONS ECONOMIQUES	5 000 000	7	-		
599	17/LC/BDJA/SG/CIPM/2021	EXECUTION DES TRAVAUX DE CANTONNAGE SUR CERTAINS TRONCONS DE ROUTE DU RESEAU ROUTIER BITUME DANS LA FCOMMUNE DE BANDJA	TRAV	SOCIÉTÉ G.F.A CAMEROUN SUARL	C_BANDJA	OU	GG	BIP	14 999 623	7	-		
600	001/LC/C.BBANE/CIPM/2021	Contrôle des travaux s'entretien de la route NGOZIP 1 -NGOZIP 2 -BIWONG BANE -NKOLAMOUGOU	SPI	ETS BUREAU D'ETUDE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE FOURNITURES	C_BIWONG BANE	SU	GG	BIP	7 479 360	4	-		
Total des documents suivant la BD										5 591	347	711	251
Moyenne par marché										9	1		
Nombre de marchés communiqués à l'auditeur												212	212
Nombre de marchés dont les données sont attendues												387	387
Pourcentage de marchés communiqués												35%	35%
Nombre de documents communiqués en moyenne par marché										5	0	3	1

**5.4. ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS DISPONIBLES A LA BANQUE DES
DONNEES AU DEMARRAGE DE L'AUDIT**

**5.5. ETAT DETAILLE DES DOCUMENTS MANQUANTS DES LE
DEMARRAGE DE L'AUDIT**

5.6. COLLECTE COMPLEMENTAIRE AUPRES DES MAÎTRES D'OUVRAGE

**5.7. DOCUMENTS MANQUANTS AU TERME DE LA COLLECTE DE
RATTRAPAGE**

