

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

-----  
MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE  
-----



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

-----  
MINISTRY OF ARTS AND CULTURE  
-----

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE POUR  
LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA  
CULTURE DE NDONGA MANTUNG (NKAMBE)**

\*\*\*\*\*

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 003/AONO/MINAC/CIPM/2025 DU  
POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE LA CULTURE DE NDONGA  
MATUNG (NKAMBE)**

\*\*\*\*\*

**FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINAC  
EXERCICE 2025 et suivants**

\*\*\*\*\*

**IMPUTATION : 5914 149 04 340003 523112**

\*\*\*\*\*

**Février 2025**



## ***SOMMAIRE***

***PIECE N°1 – AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)***

***PIECE N°2 – REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)***

***PIECE N°3 – REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)***

***PIECE N°4 – CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)***

***PIECE N°5 – CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)***

***PIECE N°6 – BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)***

***PIECE N°7 – DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE)***


***PIECE N°8 – SOUS – DETAIL DES PRIX***

***PIECE N°9 – MODELE DE MARCHE***

***PIECE N°10 – FORMULAIRES ET MODELES***

***PIECE N°11 – LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS DE PREMIER RANG AGREES PAR LE MINFI***

***PIECE N° 12 –GRILLE DE NOTATION***



**PIECE N°1**

*AVIS D'APPEL D'OFFRES*



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF ARTS AND CULTURE

Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence  
N°003/AONO/MINAC/CIPM/2025 du ~~2.1.FEV.2025~~ pour la construction de  
la Maison de la Culture de Ndonga Matung (Nkambe)

**1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES**

Le Ministre des Arts et de la Culture (MINAC), Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence pour la construction de la Maison de la Culture de Ndonga Matung (Nkambe).

**2- CONSISTANCE DES TRAVAUX**

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préliminaires ;
- Fondations ;
- Maçonneries-élévation ;
- Charpente couverture-étanchéité ;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité ;
- Plomberie sanitaire ;
- Revêtement ;
- Plafond ;
- Peinture ;
- VRD ;
- Pavage ;

**3- DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX**

Le délai maximum d'exécution des travaux est de trente-six (36) mois à partir de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

**4- ALLOTISSEMENT**

Les travaux se dérouleront en un (01) lot unique.

**5- COÛT PREVISIONNEL**

Le Budget prévisionnel est de 400 000 000 (Quatre cent millions) de francs CFA.

**6- PARTICIPATION ET ORIGINE**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises et/ou groupement d'entreprises de droit camerounais justifiant d'une expérience établie dans le domaine des travaux mentionnés dans le CCTP.

**7- MODE DE SOUMISSION**

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne et en ligne.

## **8- FINANCEMENT**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence sont financés par le BIP MINAC, Exercice 2025 et suivants, sur la ligne d'imputation budgétaire N 5914 149 04 340003 523112

## **9- CAUTIONNEMENT PROVISOIRE**

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances d'un montant de : 8 000 000 (Huit millions) francs CFA.

Le montant de la caution reste valable pendant cent vingt (120) jours après la date de dépôt des Offres.

## **10- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES (DAO)**

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables, au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales du MINAC. La version électronique est disponible sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> dès publication du présent avis.

## **11- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au Ministère des Arts et de la Culture au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales, dès publication du présent avis, sur présentation d'une quittance de versement au trésor public d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA. Il est également possible d'obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

## **12- TAILLE ET FORMATS DES FICHIERS**

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

NB. Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

## **13- REMISE DES OFFRES**

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

- Pour la soumission hors ligne, l'offre est en sept (07) exemplaires, dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels devront parvenir au Service des

Marchés, de la Direction des Affaires Générales du MINAC, au plus tard le **27 MARS 2025** à 12 heures, heure locale et devront porter la mention suivante :

"Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence n° 003/AONO/ MINAC/CIPM/2025 du **21 FEV 2025** pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe) "

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- Pour la soumission en ligne, l'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le **27 MARS 2025** à 12 heures. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus des références de la consultation dans les délais impartis.

#### 14- RECEVABILITE DES OFFRES

Les autres pièces administratives requises devront être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des Offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature du présent avis d'Appel d'Offres.

Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances.

#### 15- OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis se fera en un temps, le **27 MARS 2025** heures, heure locale, au Ministère des Arts et de la Culture, au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales, par la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère des Arts et de la culture en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

#### 16- CRITERES D'EVALUATION

##### 16.1) Critères éliminatoires :

1. Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après 48 heures ;
2. Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3. Omission dans le dossier financier d'un prix unitaire quantifié ;
4. Non-satisfaction d'au moins cinq (05) critères sur les sept (07) critères de qualification ;
5. Absence de la caution de soumission ;
6. Déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché public au cours des deux (02) dernières années ;
7. Expérience du personnel d'encadrement :
  - Conducteur des travaux : Ingénieur des Travaux de Génie Civil avec au moins 05 (cinq) ans d'expérience dans le domaine

Marchés, de la Direction des Affaires Générales du MINAC, au plus tard le **27 MARS 2025** à 12 heures, heure locale et devront porter la mention suivante :

"Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en Procédure d'Urgence n° 003/AONO/ MINAC/CIPM/2025 du **21 FEV 2025** pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe) "

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

- Pour la soumission en ligne, l'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le **27 MARS 2025** à 12 heures. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus des références de la consultation dans les délais impartis.

#### 14- RECEVABILITE DES OFFRES

Les autres pièces administratives requises devront être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des Offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature du présent avis d'Appel d'Offres.

Toute Offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des Finances.

#### 15- OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis se fera en un temps, le **27 MARS 2025** heures, heure locale, au Ministère des Arts et de la Culture, au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales, par la Commission Interne de Passation des Marchés du Ministère des Arts et de la culture en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

#### 16- CRITERES D'EVALUATION

##### 16.1) Critères éliminatoires :

1. Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après 48 heures ;
2. Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
3. Omission dans le dossier financier d'un prix unitaire quantifié ;
4. Non-satisfaction d'au moins cinq (05) critères sur les sept (07) critères de qualification ;
5. Absence de la caution de soumission ;
6. Déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché public au cours des deux (02) dernières années ;
7. Expérience du personnel d'encadrement :
  - Conducteur des travaux : Ingénieur des Travaux de Génie Civil avec au moins 05 (cinq) ans d'expérience dans le domaine

### **19- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Ministère des Arts et de la Culture, au Service des Marchés, de la Direction des Affaires Générales.

### **20- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES**


Pour toute tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le MINMAP ou envoyer un SMS aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Yaoundé, le 21 FEV 2025

LE MINISTRE DES ARTS ET DE LA  
CULTURE

#### **Ampliations :**

- MINMAP (pour information)
- Président CIPM (pour information)
- ARMP (pour publication et archivage)
- SOPECAM (pour publication)
- ARCHIVES / CHRONO



**BIDOUNG MKPATT**



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF ARTS AND CULTURE

National Open Call for Tenders under emergency procedure  
N°003/AONO/MINAC/CIPM/2025 of .....2..1..FEV..2025.....for the  
construction of the culture house in Ndonga-Mantung (Nkambe).

**1. PURPOSE OF THE CALL FOR TENDER**

The Minister of Arts and Culture (MINAC), the contracting authority, is launching an emergency National Open Call for Tenders for the construction of the Culture house of Ndonga-Mantung (Nkambe).

**2. SCOPE OF WORK**

The works include in particular:

- Preliminary works;
- Elevation masonry
- Carpentry roofing
- Aluminium-wood-joinery
- Electricity
- Sanitary plumbing
- Flooring and wall covering
- Ceiling
- Painting
- Frame – roof; ✓
- Roads and utilities
- Paving

**3. TIME LIMIT FOR THE EXECUTION OF THE WORK**

The maximum period of execution is Thirty Six (36) months from the notification of the service order to start the works.

**4. ALLOTMENT**

The works are into one (01) single lot.

**5. ESTIMATED COST**

The estimated budget is 400,000,000 CFA francs.

**6. PARTICIPATION AND ORIGIN**

Participation in this call for tenders is open to companies registered under Cameroonian law and specialised in construction and rehabilitation works.

**7. METHOD OF SUBMISSION**

Files could be handed online or offline.

#### **8. FUNDING**

The works covered by this National Open Call for Tenders under emergency procedure are financed by the MINAC Public Investment Budget, Fiscal Year 2025, on the budgetary allocation line, 5914 149 04 340003 523112

#### **9 PROVISIONAL DEPOSIT**

Each tenderer must attach to his administrative documents, a bid bond established by a first class bank or a financial organisation approved by the Ministry of Finance amounting to: 8 000 000 CFA francs.

The amount of the deposit shall remain valid for one hundred and twenty (120) days after the date of submission of the Tenders.

#### **10. CONSULTATION OF TENDER FILE**

The Tender documents can be consulted during working hours, at the Public Contracts Service, of the General Affairs Directorate of MINAC, as soon as this notice is published. The electronic version is available on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> immediately after publication of this notice.

#### **11. ACQUISITION OF THE TENDER FILE**

The Tender file may be obtained from the Ministry of Arts and Culture at the Public Contracts Service, from the Directorate of General Affairs upon publication of this notice, upon presentation of a receipt of payment to the public treasury of a non-refundable sum of One hundred thousand (100,000) CFA francs. It is also possible to obtain the tender file by free download on the COLEPS platform available at the addresses indicated above for the electronic version. However, the online submission is conditional on the payment of the purchase fee for the tender file.

#### **12. SIZE AND STYLE OF THE FILES**

For the online tender, the maximum sizes of the documents that will go through the platform and constitute the bidder's tender are as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are:

- PDF format for textual documents;
- JPEG for images.

NB. The candidate shall use the compression software in order to possibly reduce the size of the files to be transferred.

#### **13. HANDING IN OF TENDER FILES**

Each offer shall be written in French or English.

For offline submission, the offer shall be done in seven (07) copies, of which one (01) original and six (06) copies marked as such must reach the Public Contract Department, the General Affairs Directorate of MINAC, on or before **27 MAR 2025** at 12 noon local time and must bear the following statement:

**"National Open Call for Tenders under Emergency Procedure  
N°003/AONO/MINAC/CIPM/2025 of 21 FEB 2025 the construction of the Culture House  
in Ndonga Mantung (Nkambe).**

**To be opened only at the screening session**

- For online submission, the tender must be sent by the tenderer on the COLEPS platform no later than **27 MARS 2025**. A backup copy of the offer registered on a USB key or CD/DVD shall be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy", in addition to the references of the consultation within the time limits.

**14. ADMISSIBILITY OF BIDS**

The other administrative documents required must be produced in originals or in certified true copies by the issuing service or an administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Regulations of the Call for Tenders.

They must be dated no more than three (03) months before the date of submission of the Tenders or must have been established after the date of signature of this tender notice.

Any Offer that does not comply with the requirements of this notice and the Tender File shall be inadmissible. In particular, the absence of the bid guarantee issued by a first-rate bank or a financial institution approved by the Ministry in charge of Finance.

**15. OPENING OF BIDS**

The opening of the folds will be done simultaneously, on the **27 MARS 2025** 1 p.m. local time, at the Ministry of Arts and Culture, at the Public Contracts Service of the Directorate of General Affairs, by the Internal Procurement Commission of the Ministry of Arts and Culture in the presence of the bidders or their representatives duly mandated and having a perfect knowledge of the tender for which they are responsible.

**16. EVALUATION CRITERIA**

**1) - Eliminary Criteria:**

1. Absence or non-conformity of a document in the administrative file after 48 hours;
2. False declaration or falsified document;
3. Absence of a sub-detail of a quantified unit price;
4. Failure to meet at least five (05) criteria out of the seven (7) qualification criteria;
5. The absence of the bid guarantee issued by a first-rate bank or a financial institution approved by the Ministry in charge of Finance.
6. Absence of a sworn declaration on the non-abandonment of a project in the last two (02) years;
7. Staff experience

-Construction manager: a Civil Engineering Engineer, with at least five (05) years of experience and registered with the National Order of Civil Engineering Engineers;

- Site manager: Senior Civil Engineering Technician or equivalent, with at least five (05) years of experience;

-Engineering Electrical Technician or electrotechnician, or specific diploma in industrial maintenance), with at least five (05) years of experience

- A technician of sanitary or a plumber with at least three (03) years of experience or a technician with a O/L certificate with at least five (05) years of experience.

**Additive Eliminator Criteria for the online tender**

- Non-conformity of the submission ;
- Non-respect of the size of bids ;
- Absence of the backup copie.

**16.2) Qualification criteria:**

**a) - Evaluation of technical tenders**

Technical Offers shall be evaluated in a binary manner and according to the following qualification criteria:

1	Medium yearly turn-over equal or above 200.000.000 Frs. CFA during the five (05) last years.	Yes/No
2	Financial capacity of or above 120.000.000 CFA francs	Yes/No
3	References of the company with similar achievements	Yes/No
4	Availability of essential materials and equipment	Yes/No
5	Methodology and work schedule (consistency of planning)	Yes/No
6	Submission of tenders (summary; documents in order, spacers in colour other than white);	Yes/No
7	Declaration of site visit signed on honour	Yes/No

**b) Evaluation of Financial Offers**

It shall consist of:

Check the amounts in numbers and letters and make the necessary corrections;

Rank Offers from lowest to highest (Offer may be declared abnormally low). In accordance with the procedures provided for by the Procurement Code.

The currency used shall be the CFA Franc.

**17. METHOD OF AWARD OF CONTRACT.**

The commission shall propose the tenderer who has submitted the lowest financial tender, and who has the required technical capabilities.

**18. VALIDITY PERIOD OF THE TENDER**

Bidders shall remain bound by their bids for a period of ninety (90) days from the date of submission of the bids.

**19. ADDITIONAL INFORMATION**

Additional information can be obtained during working hours at the Ministry of Arts and Culture in the Public Contracts Service of the Directorate of General Affairs, Room 4 or online on the COLEPS platform at: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>

## 20. FIGHT AGAINST CORRUPTION AND BAD PRACTICES


For any attempt at corruption or bad practices, please call MINMAP or send an SMS to the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

Done in Yaoundé, on **21 FEV 2025**

THE MINISTER OF ARTS AND CULTURE

### Copies :

- MINAC (for information)
- MINMAP (for information)
- President CIPM for information)
- ARMP (for publication and archiving)
- ARCHIVES / CHRONO



**E. DOUNG MKPATT**

## **PIECE N° 2**

REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL

D'OFFRES (R.G.A.O)

## **REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES**

### **Table des matières**

#### **A. Généralités**

*Article 1 : Portée de la soumission*

*Article 2 : Financement*

*Article 3 : Fraude et corruption*

*Article 4 : Candidats admis à concourir*

*Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés*

*Article 6 : Qualification du Soumissionnaire*

*Article 7 : Visite du site des travaux*

#### **B. Dossier de Consultation**

*Article 8 : Contenu du Dossier de Consultation*

*Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier de Consultation et recours*

*Article 10 : Modification du Dossier de Consultation*

#### **C. Préparation des offres**

*Article 11 : Frais de soumission*

*Article 12 : Langue de l'offre*

*Article 13 : Documents constituant l'offre*

*Article 14 : Montant de l'offre*

*Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement*

*Article 16 : Validité des offres*

*Article 17 : Caution de Soumission*

*Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires*

*Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres*

*Article 20 : Forme et signature de l'offre*

#### **D. Dépôt des offres**

*Article 21 : Cachetage et marquage des offres*

*Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres*

*Article 23 : Offres hors délai*

*Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres*

#### **. Ouverture des plis et évaluation des offres**

*Article 25 : Ouverture des plis et recours*

*Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure*

*Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage*

*Article 28 : Détermination de la conformité des offres*

*Article 29 : Qualification du soumissionnaire*

*Article 30 : Correction des erreurs*

*Article 31 : Conversion en une seule monnaie*

*Article 32 : Evaluation des offres au plan financier*

*Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux*

#### **F. Attribution du marché**

*Article 34 : Attribution du marché*

*Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer une consultation infructueuse ou d'annuler une procédure*

*Article 36 : Notification de l'attribution du marché*

*Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours*

*Article 38 : Signature du marché*

*Article 39 : Cautionnement définitif*

## **REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES**

### **A. Généralités**

#### **Article 1 : Portée de la soumission**

1.1. Le Maître d'Ouvrage, tel qu'il est défini dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO), ci-après dénommé le "Maître d'Ouvrage", lance un Appel d'Offres pour la l'exécution des travaux décrits dans le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO.

Le nom, le numéro d'identification et le nombre de lots faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO.

Il y est fait ci-après référence sous le terme "les travaux".

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes "Maître d'Ouvrage" et "Maître d'Ouvrage Délégué" sont interchangeables et le terme "jour désigne un jour calendaire.

#### **Article 2 : Financement**

La source de financement des travaux objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

#### **Article 3 : Fraude et corruption**

3.1. Le Maître d'Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d'Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

i. Est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché;

ii. Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché;

iii. "Pratiques collusoires" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d'Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

iv. "Pratiques coercitives" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

b. Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des



manœuvres frauduleuses, des pratiques collusoires ou coercitives pour l'attribution d'un marché.

3.2. Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics, Autorité chargée des Marchés Publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice de poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

#### **Article 4 : Candidats admis à concourir**

4.1. Si l'appel d'Offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l'appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :

i. Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des lettres commandes passés au titre du présent appel d'Offres ;

ii. Présente plus d'une Offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des Offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une Offre.

c. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

d. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

#### **Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

5.1. Les matériaux, les matériels de l'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir" désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

## **Article 6 : Qualification du Soumissionnaire**

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur Offre :

- a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire.
- b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
- ii. Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
- iii. Les commandes acquises et les lettres commandes attribuées ;
- iv. Les litiges en cours ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'Offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b. L'Offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c. La nature du groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du marché;
- e. En cas de groupement solidaire, les co-traitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO.

## **Article 7 : Visite du site des travaux**

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses

environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'Offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

7.2. Le Maître d'Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemnisent si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des Offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

## **B. Dossier d'Appel d'Offres**

### **Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

8.1. Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- a. La lettre d'invitation à soumissionner (pour les Appels d'Offres Restreints) ;
- b. L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- c. Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- d. Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- e. Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- f. Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- g. Le cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- h. Le cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- i. Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaires ;
- j. Le cadre du planning d'exécution ;
- k. Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
- l. Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
- m. Modèle de lettre de soumission ;
- n. Modèle de caution de soumission ;
- o. Modèle de cautionnement définitif ;
- p. Modèle de caution d'avance de démarrage ;
- q. Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie;

r. Modèle de marché;

s. Formulaire relatif aux études préalables ;

t. L'attestation d'immatriculation

t. La liste des banques et organismes financiers de 1<sup>er</sup> rang agréés par le Ministre en charge des finances, autorisés à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une Offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son Offre.

#### **Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours**

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des Offres.

Une copie de la réponse du Maître d'Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des Marchés Publics peut introduire une requête auprès du Maître d'Ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué avec copies à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission.

Il doit parvenir au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'ouverture des Offres.

9.4. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics :

#### **Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des Offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d'Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs Offres, le Maître d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des Offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

### **C. Préparation des Offres**

#### **Article 11 : Frais de soumission**

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son Offre, et le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'Offres.

#### **Article 12 : Langue de l'offre**

L'Offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'Offre, la traduction fera foi.

#### **Article 13 : Documents constituant l'offre**

13.1. L'Offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

##### **a. Volume 1 : Dossier administratif**

Il comprend :

##### **i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :**

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.

##### **ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;**

##### **iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'Offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;**

##### **b. Volume 2 : Offre technique**

##### **b.1. Les renseignements sur les qualifications**

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

##### **b.2. Méthodologie**

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant

l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

**b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

**b.4. Commentaires (facultatifs)**

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

**c. Volume 3 : Offre financière**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
5. L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

13.2. Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent des Offres pour plusieurs lots du même Appel d'Offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un marché.

**Article 14 : Montant de l'Offre**

14.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

14.3. Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des Offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son Offre.

14.4. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues dans le marché, la

date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

14.5. Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous-détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

#### **Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement**

15.1. En cas d'Appel d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre devront suivre les dispositions soit de l'option A ou de l'option B ci-dessous : l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2. Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

a. Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'Offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

b. Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son Offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3. Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

a. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée "monnaie nationale".

b. Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4. Le Maître d'Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5. Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d'un commun accord par le Maître d'Ouvrage et

l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6. Pour les Appels d'Offres Nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

#### **Article 16 : Validité des Offres**

16.1. Les Offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des Offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une Offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué comme non conforme.

16.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son Offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son Offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des Offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

#### **Article 17 : Caution de soumission**

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son Offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable du Maître d'Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des Offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 16.2 du RGAO. 7.3. Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera Commission de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'Offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les Offres des soumissionnaires non retenues seront restituées dans un délai de quinze (30) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le soumissionnaire retire son Offre durant la période de validité ;



b. Si, le soumissionnaire retenu :

- i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, ou
- ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 38 du RGAO.

#### **Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires**

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les Offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d'Appel d'Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d'Ouvrage a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'Offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins-disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'Article 31.2 (g) du RGAO.

#### **Article 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des Offres**

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieux et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon à ce qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'Appel d'Offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des Offres ne sera pas un motif de disqualification.

## **Article 20 : Forme et signature de l'Offre**

20.1. Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'Offre décrits à l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'Offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'Offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'Offre.

20.3. L'Offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

## **D. Dépôt des Offres**

### **Article 21 : Cachetage et marquage des Offres**

21.1. Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention «ORIGINAL» et «COPIE», selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT".

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l'Offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'Offre est égarée ou ouverte prématurément.

### **Article 22 : Date et heure limites de dépôt des Offres**

22.1. Les Offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des

Offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

#### **Article 23 : Offres hors délai**

Toute Offre parvenue au Maître d'Ouvrage après les dates et heure limites fixées pour le dépôt des Offres conformément à l'Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

#### **Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres**

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son Offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des Offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'Offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION »

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'Offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des Offres.

24.3. Les Offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune Offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des Offres et l'expiration de la période de validité de l'Offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son Offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

### **E. Ouverture des plis et évaluation des Offres**

#### **Article 25 : Ouverture des plis et recours**

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'Offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une Offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle Offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné

sans avoir été ouverte. Le remplacement d'Offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'Offre correspondante. La modification d'Offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les Offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'Offre, y compris tout rabais [en cas d'ouverture des Offres financières] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'Offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'Offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les Offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des Offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des Offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé au comité chargé de l'Examen de Recours à l'ouverture des plis et à l'attribution.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

## **Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure**

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des Offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du marché n'aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son Offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son Offre, il devra le faire par écrit.

#### **Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage**

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

#### **Article 28 : Détermination de la conformité des offres**

28.1. La Sous-commission d'analyse procédera à un examen détaillé des Offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les Offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La Sous-commission d'analyse déterminera si l'Offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une Offre conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une Offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

- i. Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;
- ii. Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits du Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du marché ;
- iii. Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des Offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une Offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des Offres.

#### **Article 29 : Qualification du soumissionnaire**

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'Offre

substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'Offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### **Article 30 : Correction des erreurs**

30.1. La Sous-commission d'analyse vérifiera les Offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'Offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son Offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

#### **Article 31 : Conversion en une seule monnaie**

31.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des Offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des Offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'Offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

#### **Article 32 : Evaluation et comparaison des Offres au plan financier**

32.1. Seules les Offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

32.2. En évaluant les Offres, la sous-commission déterminera pour chaque Offre le montant évalué de l'Offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'Offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite offre.

#### **Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux**

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

### **F. Attribution du marché**

#### **Article 34 : Attribution**

34.1. Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant le marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charges au moment de l'attribution.

#### **Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure**

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des Marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

### **Article 36 : Notification de l'attribution du marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage notifiera à l'attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

### **Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours**

37.7. Le Maître d'Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des Offres.

37.2. Le Maître d'Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du résultat de l'attribution, les Offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé au comité en charge des recours à l'ouverture et à l'attribution.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

### **Article 38 : Signature du marché**

38.1. Après publication des résultats, le projet de marché souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des Marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

38.3. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

### **Article 39 : Cautionnement définitif**

39.1. Dans les vingt (20) jours suivant la notification du marché par le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le

CCAG.



**PIECE N° 3**

REGLEMENT PARTICULIER DE  
L'APPEL D'OFFRES (R.P.A.O)



Clauses du RGAO	Généralités
Art 1 :1	<p>Définition des prestations : Le Ministre des Arts et de la Culture (MINAC), Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Travaux préliminaires ;</li> <li>- Fondations ;</li> <li>- Maçonneries-élévation ;</li> <li>- Charpente couverture-étanchéité ;</li> <li>- Menuiserie bois et métallique ;</li> <li>- Electricité ;</li> <li>- Plomberie sanitaire ;</li> <li>- Revêtement ;</li> <li>- Plafond ;</li> <li>- Peinture ;</li> <li>- VRD ;</li> <li>- Pavage ;</li> </ul> <p>Référence de l'Appel d'Offres : Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°003./AONO/MINAC/CIPM/2025 du ..... pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Matung (Nkambe)</p>
Art 1 :2	Délai d'exécution : Le délai d'exécution est de trente-six (36) mois
Art 2	<p>Source de financement : (BIP) MINAC, Exercice 2025 et suivants</p> <p>Imputation : 5914 149 04 340003 523112</p>
Art 12	Langue de l'Offre : les Offres seront rédigées en Français ou en Anglais
Art 6	<p>Qualification du soumissionnaire</p> <p>2) Critères éliminatoires :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après 48 heures ;</li> <li>2) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;</li> <li>3) Omission dans le dossier financier d'un prix unitaire quantifié ;</li> <li>4) Non-satisfaction d'au moins cinq (05) critères sur les sept (07) critères de qualification ;</li> <li>5) Absence de la caution de soumission ;</li> <li>6) Déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché public au cours des deux (02) dernières années ;</li> <li>7) Expérience du personnel d'encadrement : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conducteur des travaux : Ingénieur des Travaux de Génie Civil avec au moins 05 (cinq) ans d'expérience dans le domaine</li> <li>• Chef de chantier : Technicien de Génie Civil avec 05 (cinq) ans d'expérience</li> <li>• Un ingénieur de génie électrique (ou ingénieur électrotechnicien ou un ingénieur en maintenance industrielle) avec 05 (cinq) ans d'expérience</li> </ul> </li> </ol>

- Un technicien en installation sanitaire (niveau minimum CAP) avec 03 (trois) ans d'expérience ou un technicien avec niveau BEPC et possédant une expérience de 05 (cinq) ans dans le domaine

Critères éliminatoires additifs pour les soumissionnaires en ligne

- Non-conformité du mode de soumission ;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.

#### 16.3) Critères de qualification :

##### 10 Evaluation des offres techniques

Les Offres techniques seront évaluées de façon binaire et en fonction des critères de qualification ci-après :

1	Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à Deux cent (200) millions de FCFA au cours des cinq (05) dernières années	Oui/Non
2	Attestation de capacité financière de (120 000 000) de FCFA	Oui/Non
3	Références de l'entreprise dans le domaine	Oui/Non
4	Disponibilité du matériel et des équipements essentiels	Oui/Non
5	Méthodologie et planning des travaux (cohérence du planning)	Oui/Non
6	Présentation des offres	Oui/Non
7	Déclaration sur l'honneur de visite de site	Oui/Non

#### a-2) - Evaluation des Offres financières

Elle consistera à :

12. Vérifier les montants en chiffres et en lettres et à apporter les corrections nécessaires ;

13. Classer les Offres de la moins disante à la plus disante (l'Offre peut être déclarée anormalement basse). Conformément aux procédures prévues par le Code des Marchés. La monnaie utilisée est le Franc CFA.

Art  
6 :2.e

En cas de groupement de fournisseurs :

- Les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement sont précisées à la clause d ci-dessous ;
- L'Offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement
- La nature du groupement (conjoint ou solidaire) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis de l'Autorité Contractante pour l'exécution du marché ;

	e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte. lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.
Art 21	<p>Les Offres seront présentées en trois volumes insérés respectivement dans trois enveloppes intérieures le tout inséré dans une enveloppe extérieure portant les mentions suivantes :</p> <p style="text-align: center;"><b>Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°003 /AONO/MINAC/CIPM/2025 du                      pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Matung (Nkambe)</b>  <b>« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »</b></p> <p>Les trois volumes sont détaillés ainsi qu'il suit :</p>
Art 13	<p><b>Enveloppe A – Volume 1. : dossier administratif</b>  Le dossier administratif contiendra les pièces suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. La déclaration de soumission signée, datée et timbrée pour les soumissionnaires (suivant modèle joint) ;</li> <li>b. L'accord de groupement (solidaire ou conjoint) le cas échéant ;</li> <li>c. Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de résidence du soumissionnaire datant de moins de trois (3) mois précédant la date de remise des offres ;</li> <li>d. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre agréée par le Ministère des Finances du Cameroun ;</li> <li>e. La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'un montant de : Cent mille francs (100 000) FCFA ;</li> <li>f. La caution de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de 8 000 000 (Huit millions ) francs CFA timbrée.</li> <li>g. Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l'ARMP</li> <li>h. Le registre du commerce certifié ;</li> <li>i. Une attestation signée du Directeur Général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois ;</li> <li>j. Une attestation de conformité fiscale délivrée par l'administration fiscale certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois ;</li> <li>k. Une attestation d'immatriculation</li> <li>l. Preuves d'acceptation des conditions d'un marché signé du soumissionnaire CCAP.</li> </ol> <p>En cas de groupement, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces d, e, f étant uniquement présentés par le mandataire du groupement sous réserve des dispositions de la clause 2.3. ci-dessus.</p>

## Enveloppe B – Volume 2 : Offre technique

Elle contiendra les documents suivants :

### b.1. Les renseignements sur les qualifications

- i. Références de l'entreprise, un (01) marché au cours des trois (03) dernières années (1<sup>ère</sup> et dernière pages du contrat assortis du PV de réception);

### b.2. Les propositions techniques

- ✓ Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à 200 millions de FCFA au cours des cinq (05) dernières années
- ✓ Attestation de capacité financière de Cent vingt millions (120 000 000) de FCFA
- ✓ Les preuves d'avoir exécuté au cours des trois (03) dernières années, au moins un (01) marché public similaire.
- ✓ Joindre les copies de la première et de la dernière page des marchés ou des lettres-commandes, les procès-verbaux de réception provisoire et/ou définitive correspondants
- ✓ Liste du matériel et des équipements essentiels : véhicule de liaison, matériel de sécurité (combinaison, bottes de chantier, harnais de sécurité), boîte à pharmacie et petit matériel et outillage
- ✓ Joindre les justificatifs (factures d'achat, carte grise, contrats de mise à disposition ou de location, etc.)
- ✓ Attestation de visite des lieux ;
- ✓ Joindre les curricula vitae (CV) de chaque personnel d'encadrement dûment signés, les copies certifiées conformes du diplôme datant de moins de trois (03) mois et les attestations de disponibilité de chaque personnel dûment signé.
- ✓ Note méthodologique d'exécution des travaux (production d'un organigramme de chantier, cohérence de l'organigramme de chantier, description du projet, description tâche par tâche des différents prix, planning du personnel, planning du matériel, planning des travaux, contrôle de qualité interne, protection de l'environnement, production du rapport de visite de site)
- ✓ Preuves d'acceptation des conditions d'un marché signé du soumissionnaire CCAP et CCTP paraphé à chaque page, et signé à la dernière page

	<p><b>Enveloppe C. Volume 3 : Offre financière</b>  Elle regroupe tous les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;</li> <li>c2. Le cadre du Bordereau des prix unitaires dûment rempli ;</li> <li>c3. Le cadre du détail estimatif dûment rempli ;</li> <li>c4. Le cadre du sous-détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires.</li> </ul> <p>Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres.  NB : Les différentes parties d'un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur (autre que le blanc) aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.</p>
Art 14	Prix de L'Offre : Les prix du marché sont fermes et non révisables.
Art 15	Monnaie du pays de l'Autorité Contractante (monnaie nationale) : FCFA
Art 22	Préparation et dépôt des Offres
Art 16	Période de validité des Offres : La période de validité des Offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des Offres.
Art 21.1	<p>Nombre de copies de l'Offre qui doivent être remplies et envoyées : 07</p> <p>Dont un (01) original six (06) copies</p>
Art 21.1.1.b	<p>Numéro de l'Appel d'Offres</p> <p>Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°003/AONO/MINAC/CIPM/2025 du pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga – Mantung (Nkambe)</p>
Art 22.1	<p>Date et heure limite de dépôt des Offres : Chaque Offre rédigée en français ou en anglais sera déposée contre récépissé au Ministère des Arts et de la Culture, Direction des Affaires Générales, Sous-direction du Budget et du Matériel, Service des Marchés, Bâtiment B au plus tard le à 12 heures précises. Elles seront présentées sous pli fermé en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et devront porter la mention :</p> <p style="text-align: center;">Avis d'Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence  N°003/AONO/MINAC/CIPM/2025 du pour la construction de  la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe)  « A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »</p>
Art 7	<b>VISITE DES LIEUX</b> Il sera signé sur l'honneur de chaque candidat ayant acquis l'Offre, une attestation de visite de site.
Art 34	<b>Attribution du marché</b> : Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a satisfait à tous les critères éliminatoires, et dont l'Offre financière aura été évaluée la moins disante.
Art 39	<p><b>43.1. Cautionnement définitif</b>  Le cautionnement définitif est fixé à 2% du montant TTC du marché.  Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d'une main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du fournisseur.</p> <p><b>43.2. Cautionnement de garantie.</b> La retenue de garantie est fixée à 10 % et elle est libérée après la réception définitive.</p>



**PIECE N° 4**

CAHIER DES CLAUSES  
ADMINISTRATIVES  
PARTICULIERES(CCAP)





## SOMMAIRE :

### CHAPITRE I : GENERALITES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

ARTICLE 2 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS (CCAG ARTICLE 2 COMPLETE)

ARTICLE 4 : LANGUE, LOI ET REGLEMENTATION APPLICABLES

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE (CCAG ARTICLE 9)

ARTICLE 6 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES

ARTICLE 7 : COMMUNICATION (CCAG ARTICLE 6 ET 10 COMPLETES)

ARTICLE 8 : ORDRES DE SERVICE (CCAG ARTICLE 8)

ARTICLE 9 : LETTRES COMMANDES A TRANCHES CONDITIONNELLES (CCAG ARTICLE 9)

ARTICLE 10 : PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR (CCAG ARTICLE 15 COMPLETE) 42

### CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 11 : GARANTIES ET CAUTIONS (CCAG ARTICLES 29 ET 41)

ARTICLE 12 : MONTANT DU MARCHE (CCAG ARTICLES 18 ET 19 COMPLETES)

ARTICLE 13 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

ARTICLE 14 : VARIATION DES PRIX (CCAG ARTICLE 20)

ARTICLE 15 : FORMULES DE REVISION DES PRIX (CCAG ARTICLE 21)

ARTICLE 16 : FORMULES D'ACTUALISATION DES PRIX (CCAG ARTICLE 21)

ARTICLE 17 : TRAVAUX EN REGIE (CCAG ARTICLE 22 COMPLETE)

ARTICLE 18 : VALORISATION DES TRAVAUX (CCAG ARTICLE 23)

ARTICLE 19 : VALORISATION DES APPROVISIONNEMENTS (CCAG ARTICLE 24 COMPLETE)

ARTICLE 20 : AVANCES (CCAG ARTICLE 28)

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES TRAVAUX (CF. ART. 26, 27 ET 30 CCAG COMPLETES)

ARTICLE 22 : INTERETS MORATOIRES (CCAG ARTICLE 31)

ARTICLE 23 : PENALITES DE RETARD (CCAG ARTICLE 32 COMPLETE)

ARTICLE 24 : REGLEMENT EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES (CCAG ARTICLE 33)

ARTICLE 25 : DECOMPTE FINAL (CCAG ARTICLE 34)

ARTICLE 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF (CCAG ARTICLE 35)

ARTICLE 27 : REGIME FISCAL ET DOUANIER (CCAG ARTICLE 36)

ARTICLE 28 : TIMBRES ET ENREGISTREMENT DES LETTRES COMMANDES (CCAG ARTICLE 37)

### CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 29 : DELAIS D'EXECUTION DU MARCHE (CCAG ARTICLE 38)

ARTICLE 30 : ROLES ET RESPONSABILITES DE L'ENTREPRENEUR (CCAG ARTICLE 40)

ARTICLE 31 : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS ET DU SITE (CCAG ARTICLE 42)

ARTICLE 32 : ASSURANCES DES OUVRAGES ET RESPONSABILITES CIVILES (CCAG ARTICLE 45)

ARTICLE 33 : CONSISTANCE DES TRAVAUX (CCAG ARTICLE 46)

ARTICLE 34 : PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR (ARTICLE 49 COMPLETE)

ARTICLE 35 : ORGANISATION ET SECURITE DES CHANTIERS (CCAG ARTICLE 50)

ARTICLE 36 : IMPLANTATION DES OUVRAGES (CCAG ARTICLE 52)

ARTICLE 37 : SOUS-TRAITANCE (CCAG ARTICLE 54)

ARTICLE 38 : LABORATOIRE DE CHANTIER ET ESSAIS (CCAG ARTICLE 55)

ARTICLE 39 : JOURNAL DE CHANTIER (CCAG ARTICLE 56 COMPLETE)

ARTICLE 40 : UTILISATION DES EXPLOSIFS (CCAG ARTICLE 60)

ARTICLE 41 : RECEPTION PROVISOIRE (CCAG ARTICLE 67)

ARTICLE 42 : DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION (CCAG ARTICLE 68)

ARTICLE 43 : DELAI DE GARANTIE (CCAG ARTICLE 70)

ARTICLE 44 : RECEPTION DEFINITIVE (CCAG ARTICLE 72)

ARTICLE 45 - EDITION ET DIFFUSION DU MARCHE

ARTICLE 46 - LITIGES

ARTICLE 47 - RESILIATION DU MARCHE

ARTICLE 48 - CAS DE FORCE MAJEURE

ARTICLE 49 - ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE

## **Chapitre I : Généralités**

### **Article 1 : Objet du marché**

*Le présent marché a pour objet pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe);*

### **Article 2 : Procédure de passation du marché**

*Le présent marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence N°...003/AONO/MINAC/CIPM/2025 du pour la construction de la Maison de la Culture du Ndonga Mantung (Nkambe);*

### **Article 3 : Définitions et attributions (CCAG Article 2 complété)**

#### **3.1. Définitions générales**

- *L'Autorité Contractante est : Le Ministre des Arts et de la Culture, Maître d'Ouvrage.*
- *Le Maître d'Ouvrage est : Le Ministre des Arts et de la Culture.*
- *Le Chef de service du marché est : Le Directeur des Affaires Générales, ci-après désigné le Chef de service ; il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels désigné chef de service.*
- *L'Ingénieur du marché est : Le Délégué Départemental des Travaux Publics du Ndonga-Mantung ;*
- *La Maîtrise d'œuvre est assurée par:*
- *L'entrepreneur est : l'entreprise adjudicataire.*

#### **3.2. Nantissement**

- *L'autorité chargée de l'ordonnancement est : Le Ministre des Arts et de la Culture ;*
- *L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Ministre des Arts et de la Culture*
- *L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : La Paierie Spécialisée auprès des Ministères des Arts et de la Culture, de la Promotion de la Femme et de la Famille et des Affaires Sociales ;*
- *Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est : Le Chef de Service du Marché.*

### **Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables**

4.1. La langue utilisée est le Français ou l'Anglais.

4.2. L'entrepreneur s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### **Article 5 : Pièces constitutives du marché (CCAG Article 9)**

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité :

1. La lettre de soumission ou l'acte d'engagement ;
2. La soumission de l'entrepreneur et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;

5. Les éléments propres à la détermination du montant du marché, tels que, par ordre de priorité : les bordereaux des prix unitaires ; l'état des prix forfaitaires ; le détail ou le devis estimatif ; la décomposition des prix forfaitaires et le sous-détail des prix unitaires ;
6. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés de travaux mis en vigueur par arrêté N°033 du 13 février 2007 ;
8. Le ou les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux prestations faisant l'objet du marché.

#### **Article 6 : Textes généraux applicables**

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- 1 La Loi N° 2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat ;
- 2 La Loi N°2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ;
- 3 La Loi N°2024/013 du 23 décembre 2024 portant Loi de Finance de la République du Cameroun pour l'exercice 2025 ;
- 4 La loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;
- 5 Le Décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ;
- 6 Le décret n°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N°2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'ARMP ;
- 7 Le décret n°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés publics ;
- 8 L'arrêté N°0207/A/MINMAP du 03 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics auprès des Départements Ministériels et certaines administrations publiques ;
- 9 La Circulaire N°00013995/C/MINFI du 31 Décembre 2024 portant instructions relatives à l'Exécution des Lois de Finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat et des Autres Entités Publiques, pour l'Exercice 2025.
- 10 Les textes régissant les corps de métiers ;
- 11 Les normes en vigueur ;
- 12 D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.

#### **Article 7 : Communication (CCAG Article 6 et 10 complétés)**

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après :

- a. Dans le cas où le prestataire est le destinataire : .....

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage, au Chef de Service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la Communauté Urbaine de Yaoundé.

- b. Dans le cas où le Maître d'Ouvrage en est le destinataire : Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture avec copie adressée dans les mêmes délais, à l'Autorité Contractante, au Chef de service et à l'ingénieur.

#### **Article 8 : Ordres de service (CCAG Article 8)**

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

L'ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur.

Les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du

marché seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur.

Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur du Marché avec copie au Chef de service du marché et au Maître d'Ouvrage.

Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur.

Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries, seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur.

#### **Article 9 Marchés à tranches conditionnelles (CCAG Article 9)**

Le marché se réalisera en trois tranches. Des réceptions partielles pourraient être effectuées.

#### **Article 10 : Personnel de l'entrepreneur (CCAG Article 15 complété)**

10.1. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de service. En cas de modification, l'entrepreneur se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

10.2. En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément de l'Ingénieur, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. L'ingénieur disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

10.3. Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché.

### **Chapitre II : Clauses financières**

#### **Article 11 : Garanties et cautions (CCAG articles 29 et 41)**

##### **11.1. Cautionnement définitif**

Le cautionnement définitif fixé à 2% du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande écrite de l'entrepreneur et sous réserve des dispositions de l'article 42 ci-dessous.

##### **11.2. Cautionnement de garantie**

La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande écrite de l'entrepreneur.

##### **11.3. Cautionnement d'avance de démarrage**

L'avance de démarrage est fixée à 20% du montant TTC du marché et cautionnée à 100%. Elle est restituée dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant TTC du marché.

**Article 12 : Montant du marché (CCAG Articles 18 et 19 complétés)**

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du détail ou devis estimatif ci-joint, est de \_\_\_\_\_ (en chiffres) \_\_\_\_\_ (en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

- Montant de la TVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA

Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l'article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par l'entrepreneur.

**Article 13 : Lieu et mode de paiement**

13.1. En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage à l'entrepreneur, dans les conditions indiquées dans le marché, l'entrepreneur s'engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

13.2. Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Soit (chiffres et en lettres HTVA), par crédit au compte N° \_\_\_\_\_ ouvert au nom de l'entrepreneur à la banque \_\_\_\_\_

**Article 14 : Variation des prix (CCAG Article 20)**

Les prix sont fermes.

Les acomptes payés à l'entrepreneur au titre des avances ne sont pas révisables.

**Article 15 : Formules de révision des prix**

Sans objet.

**Article 16 : Formules d'actualisation des prix**

Sans objet.

**Article 17 : Travaux en régie**

Sans objet.

**Article 18 : Valorisation des travaux (CCAG article 23)**

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

**Article 19 : Valorisation des approvisionnements (CCAG article 24 complété)**

Sans objet.

**Article 20 : Règlement des travaux (cf. art. 26, 27 et 30 CCAG complétés)**

**20.1. Constatation des travaux exécutés**

Avant le 30 de chaque mois, l'entrepreneur et l'Ingénieur (le cas échéant) établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

**20.2. Décompte mensuel**

Au plus tard le cinq (5) du mois suivant le mois des prestations, l'entrepreneur remettra en sept (07) exemplaires à l'Ingénieur, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Le montant HTVA de l'acompte à payer à l'entrepreneur sera mandaté comme suit :

- 97,8% versé directement au compte de l'entrepreneur (ou 94,5%) ;

- 2,2% versé au trésor public au titre de l'IR dû par l'entrepreneur (ou 5,5%).

L'ingénieur disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au chef de service du marché, les décomptes qu'il a approuvés.

L'ingénieur transmettra à l'organisme payeur les décomptes qu'il a approuvé de façon à ce qu'ils soient en sa possession le plutôt possible. Dans ce cas, une copie du décompte et des attachements correspondants est transmise dans les mêmes délais au Chef de service et à l'Ingénieur pour dossier de suivi.

Une copie du décompte corrigé est retournée à l'entrepreneur le cas échéant.

Les paiements seront effectués dans les délais réglementaires prescrits.

### **20.3. Décompte d'avance de démarrage (le cas échéant)**

Confère Article 11.3

### **Article 21 : Intérêts moratoires (CCAG Article 31)**

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 88 du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### **Article 22 : Pénalités de retard (CCAG Article 32 complété)**

23.1. Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

a. Un deux millièmes (1/2000<sup>e</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b. Un millième (1/1000<sup>e</sup>) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

23.2. Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

### **Article 23 : Règlement en cas de groupement d'entreprises (CCAG Article 33)**

24.1. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

24.2. En cas de sous-traitance des travaux, les paiements seront effectués par l'entrepreneur suivant le mode de paiement convenu.

### **Article 24 : Décompte final (CCAG Article 34)**

25.1. Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire des travaux de la tranche écoulée, l'entrepreneur établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

25.2. Le Chef de service dispose d'un délai de huit (08) jours pour notifier le projet rectifié et accepté au Maître d'ouvrage.

25.3. L'entrepreneur dispose d'un délai de cinq (05) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### **Article 25 : Décompte général et définitif (CCAG Article 35)**

25.1. Le Chef de service ou l'Ingénieur dispose d'un délai de dix (10) jours pour établir le décompte général et définitif à l'entrepreneur après la réception définitive.

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des travaux, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer

contradictoirement par l'entrepreneur, l'ingénieur et le Maître d'oeuvre. Ce décompte comprend:

- le décompte final.
- le solde.
- la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par l'entrepreneur, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

25.2. L'entrepreneur dispose d'un délai de sept (07) jours pour renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

#### **Article 26 : Régime fiscal et douanier (CCAG Article 36)**

Le décret N°2003/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'IR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés ;
- des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché :
  - des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ou exonérées selon les dispositions des commandes publiques ;
  - des droits et taxes communaux,
  - des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

#### **Article 27 : Timbres et enregistrement du marché (CCAG Article 37)**

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, conformément à la réglementation.

#### **Chapitre III : Exécution des travaux**

##### **Article 28 : Délais d'exécution du marché (CCAG Article 38)**

29.1. Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de trente-six (36) mois.

29.2. Ces délais courent à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

##### **Article 29 : Rôles et responsabilités de l'entrepreneur (CCAG Article 40)**

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux tiendra compte de la période pour le choix des matériaux d'origine du fabricant qui sera communiqué à l'Ingénieur et à la Maîtrise d'œuvre en 02 exemplaires à chaque début de mois.

##### **Article 30 : Mise à disposition des documents et du site (CCAG Article 42)**

Sans objet.

##### **Article 31 : Assurances des ouvrages et responsabilités civiles (CCAG Article 45)**

Les polices d'assurances suivantes sont requises au titre du présent marché pour les montants minimum indiqués ci-après :

- Assurance des risques causés à des tiers par son personnel salarié en activité au travail, par le matériel qu'il utilise, du fait des travaux ;
- Assurance "Tous risques chantier";

#### **Article 32 : Consistance des travaux (CCAG Article 46)**

Les travaux comprennent notamment :

- Travaux préliminaires ;
- Fondations ;
- Maçonneries-élévation ;
- Charpente couverture-étanchéité ;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité ;
- Plomberie sanitaire ;
- Revêtement ;
- Plafond ;
- Peinture ;
- VRD ;
- Pavage ;

#### **Article 33 : Pièces à fournir par l'entrepreneur (Article 49 complété)**

##### **34.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité**

a. Dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer le travaux, l'entrepreneur soumettra en cinq (05) exemplaires, à l'approbation du Chef de service après avis du Maître d'Ouvrage, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles d'usage.

Deux (2) exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délai de quinze (15) jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation "BON POUR EXECUTION" ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

L'entrepreneur disposera alors de huit (8) jours pour en présenter un nouveau. Le Chef de service, l'ingénieur et le Maître d'oeuvre disposera alors d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de service, l'ingénieur et le Maître d'oeuvre n'atténuera en rien la responsabilité de l'entrepreneur. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

L'entrepreneur tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord du Chef de service à l'ingénieur et le Maître d'oeuvre.

b. Le Plan de Gestion Environnemental fera ressortir notamment les conditions de choix des sites techniques et de base vie, les conditions d'emprunt de sites d'extraction et les conditions remise en état des sites de travaux et d'installation.

c. L'entrepreneur indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.



d. L'agrément donné par le chef de service ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

**34.2. Projet d'exécution**

a. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) d'exécution nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Chef de service à l'ingénieur et le Maître d'œuvre un mois au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Chef de service, l'ingénieur et le Maître d'œuvre disposeront d'un délai de quinze (15) jours pour les examiner et faire connaître ses observations. L'entrepreneur disposera alors d'un délai de huit (08) jours pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

**Article 34: Organisation et sécurité des chantiers (CCAG Article 50)**

34.1. Les panneaux de signalisation seront placés au début et à la fin de chaque poste d'intervention dangereuse. Ils devront être mis en place durant la période d'intervention jusqu'à la fin de cette dernière.

34.2. Services à informer en cas d'interruption de la circulation ou le long des itinéraires déviés : Sans objet.

34.3. Mesures particulières demandées à l'entrepreneur, autres que celles prévues dans le CCAG, pour les règles d'hygiène et de sécurité et pour la circulation autour du ou dans le site : Sans objet.

**Article 35 : Implantation des ouvrages (CCAG Article 52)**

Le Maître d'Ouvrage notifiera à l'entreprise, dans un délai de huit (08) jours suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

**Article 36 : Sous-traitance (CCAG article 54)**

La part des travaux à sous-traiter est au maximum de 30% du montant TTC du marché de base et de ses avenants.

**Article 37 : Laboratoire de chantier et essais (CCAG Article 55)**

38.1. Modalités de réalisation des essais et études géotechniques : Sans objet.

38.2. Le Maître d'Ouvrage dispose d'un délai de huit (08) jours pour agréer le personnel de l'entrepreneur, dès réception de la demande.

**Article 38 : Journal de chantier (CCAG Article 56 complété)**

39.1. Le journal de chantier sera signé contradictoirement par le Maître d'Ouvrage et le représentant de l'entrepreneur systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

39.2. C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

**Article 39: Utilisation des explosifs (CCAG Article 60)**

Sans objet.

#### **Article 40 : Réception provisoire (CCAG Article 67)**

La réception provisoire est effectuée à la fin des travaux, toutefois une réception partielle pourrait-être effectuée à la demande de l'Entreprise.

Avant la réception provisoire, l'entrepreneur demande par écrit au Chef de service avec copie à l'ingénieur et à la Maîtrise d'œuvre, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

##### **40.1. Epreuves comprises dans les opérations préalables à la réception :**

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d'œuvre ou à l'Ingénieur avec copie et au Chef de Service du marché, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception et la présentation du certificat de conformité du Laboratoire de Génie Civil (le cas échéant).

##### **40.2. Constatation éventuelle du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux : Sans objet.**

##### **40.3. La Commission de réception sera composée des membres suivants :**

1. Le Maître d'Ouvrage ou son Représentant, Président ;
2. Le Chef de service du marché ou son Représentant : Membre ;
- 3 L'Ingénieur du marché, Rapporteur ;
4. Un Représentant du MINMAP : Observateur ;
- 5- le Délégué Départemental des Arts et de la Culture du Ndonga-Mantung : Membre ;
- 6- La Maîtrise d'œuvre : Membre ;
7. L'entrepreneur ou son Représentant : Membre.

L'entrepreneur est convoqué à la réception par courrier au moins 10 jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

Il assiste à la réception.

Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission après visite du chantier examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

La visite de réception provisoire fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé sur le champ par tous les membres de la commission.

Chaque procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

##### **40.4. La période de garantie commence à la date de cette réception provisoire.**

#### **Article 41 : Documents à fournir après exécution (CCAG Article 68)**

Après la visite de pré réception technique, le Cocontractant est tenu de déposer auprès de l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre les plans de récolement pour approbation.

#### **Article 42 : Délai de garantie (CCAG Article 70)**

La durée de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

#### **Article 43 : Réception définitive (CCAG Article 72)**

44.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.

44.2. La procédure de réception est la même que celle de la réception provisoire.

**Article 44 – Edition et diffusion du marché**

Sept (07) exemplaires du présent marché seront édités et diffusés par les soins du Maître d’Ouvrage.

**Article 45 - Litiges**

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de réconciliation par entente directe ou par médiation.

A défaut de règlement à l'amiable, tout différend découlant du présent marché sera définitivement tranché par la juridiction camerounaise compétente.

**Article 46- Résiliation du marché**

Le présent marché peut être résilié dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.

**Article 47- Cas de force majeure**

La force majeure s’entend de tout événement imprévisible et irrésistible empêchant le Prestataire de remplir tout ou partie de ses obligations contractuelles.

Les cas de force majeure devront être signalés au Maître d’Ouvrage dans un délai de 72 heures à compter du début de l’événement. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée.

Dans tous les cas, il appartient au Maître d’Ouvrage de faire apprécier par une Commission constituée à cet effet les cas de force majeure évoqués.

**Article 48 – Entrée en Vigueur du marché**

Le présent marché ne deviendra définitif qu’après sa signature par le Maître d’Ouvrage. Il entrera en vigueur dès sa notification au fournisseur par ce dernier.

.



**PIECE N° 5**

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES  
PARTICULIERES (CCTP)

# **CHAPITRE I : GENERALITES**

## **ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT DOCUMENT**

Le présent Cahier Des Clauses Techniques Particulières est le document qui fixe les règles d'exécution des travaux de construction de la Maison de la Culture de YAGOUA, financés par le Budget d'Investissement Public du MINAC, exercice 2025 et suivants.

Les dénominations utilisées dans le présent CCTP, sont conformes à la réglementation telle que définie dans le CCAP.

## **ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX**

La consistance des travaux à réaliser est détaillée dans le présent CCTP, au bordereau des prix –nomenclature des tâches et au détail estimatif.

Ils comprennent en particulier les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive

- Travaux préliminaires ;
- Fondations ;
- Maçonneries-élévation ;
- Charpente couverture-étanchéité ;
- Menuiserie bois et métallique ;
- Electricité ;
- Plomberie sanitaire ;
- Revêtement ;
- Plafond ;
- Peinture ;
- VRD ;
- Pavage ;

## **ARTICLE 3 : REFERENCES TECHNIQUES**

Le présent cahier des clauses techniques particulières désignées par le terme CCTP fait partie des pièces contractuelles du marché.

Il définit les normes et spécifications techniques applicables ainsi que les méthodes d'exécution des travaux et de mise en œuvre des matériaux.

L'entrepreneur est autorisé à utiliser toutes les normes à condition que celles-ci soient couramment admises et conduisent à des résultats de qualité égale ou supérieure.

Ces normes doivent être préalablement soumises à l'approbation de l'Ingénieur avec pièce à l'appui. L'Ingénieur justifie sa décision pour accepter ou rejeter une norme.

## **ARTICLE 4 : GENERALITES**

### **4.1 LES ESSAIS**

Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du marché et prescriptions des normes AFNOR homologués, les normes applicables étant ceux en vigueur le premier jour du mois qui précède la date limite de remise des offres.

### **4.2 ESSAIS D'ETUDES**

L'entrepreneur doit effectuer toutes les recherches et essais de laboratoire nécessaires pour vérifier la conformité des matériaux, déterminer les dosages, les compositions des mélanges et des bétons, les traitements et les différents apports, qui permettent de répondre aux critères d'utilisation des divers matériaux et stipulations techniques requises.

L'entrepreneur doit effectuer tous les essais de formulation et de convenance sur les matériaux composites utilisés sur le chantier.

A partir des pièces et documents joints au dossier d'appel d'offres, l'entrepreneur effectue toutes les vérifications qu'il juge nécessaires, afin de pouvoir signaler et rectifier les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles.

Tous ces essais et vérifications sont à la charge de l'entrepreneur qui remet ses conclusions à l'Ingénieur et au Maître d'oeuvre.

Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre pourront donner par écrit leur agrément ou prescrire une nouvelle recherche ou des essais complémentaires.

#### 4.3 ESSAIS DE RECEPTION DE MATERIAUX SUR LE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de réaliser les essais de réception selon la cadence fixée ci-après dans ce CCTP. Les résultats seront présentés à l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre qui, après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires pourront donner leur autorisation écrite pour l'utilisation du matériau concerné. L'Ingénieur et le Maître d'oeuvre se réservent le droit de demander des essais supplémentaires aux frais de l'entrepreneur ou de réaliser toutes les vérifications jugées nécessaires avec son propre matériel ou en faisant appel à un laboratoire spécialisé et agréé.

La liste non exhaustive des essais de réception des matériaux est la suivante :

Pour les bétons :

- Analyse granulométrique des agrégats.
- Propreté des granulats
- Equivalent de sable

#### 4.4 ESSAIS DE CONTROLE DE MISE EN OEUVRE

L'entrepreneur a l'obligation de réaliser son autocontrôle conformément à ceux prévus plus loin dans ce CCTP.

Le contrôle de la mise en œuvre du béton se fera par la mesure de l'affaissement au cône d'ABRAMS et par la mesure de la résistance à la compression simple à 7 jours et à 28 jours.

Toutefois l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre se réservent le droit de faire toutes vérifications jugées indispensables avec leur propre matériel et de recourir à tout autre moyen pour s'assurer que la mise en œuvre s'est opérée selon les règles de l'art. Il pourront notamment avoir recours à la mesure de la résistance des bétons au Scléromètre.

L'entrepreneur sera tenu d'effectuer toutes les reprises ordonnées par l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre.

#### 4.5 AMENEE DE L'EQUIPEMENT ET DU MATERIEL

L'entrepreneur effectue toutes les démarches nécessaires pour s'assurer que la livraison des équipements et du matériel importé soit effectué dans des délais compatibles avec le planning des travaux et que toutes les dispositions soient prises pour leur expédition sur le chantier.

L'Ingénieur et le Maître d'oeuvre vérifieront la conformité du matériel amené sur le

chantier à l'offre du titulaire.

#### 4.6 FOURNITURE DES MATERIAUX

Matériaux locaux :

- L'entrepreneur est autorisé à utiliser des matériaux locaux.

L'entrepreneur choisi et visite toute source locale de matériaux et prend les dispositions nécessaires pour leur achat et leur transport sur le site des travaux.

#### 4.7 EMLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Si, sur la base des plans et pièces techniques du dossier d'appel d'offres (DAO), les emplacements mis à sa disposition par l'administration sont insuffisants ou mal situés eu égard à sa propre organisation du chantier, l'entrepreneur est tenu de s'informer de la disponibilité d'autres emplacements. Dans l'hypothèse où de l'avis de l'entrepreneur, les emplacements ainsi demeurent insuffisants ou mal situés, il doit assurer la recherche des terrains supplémentaires, puis effectuer les formalités d'achats ou de location avant de procéder à leur aménagement. Il prend en charge les coûts de recherche, formalités et préparations de ces terrains, en vue de l'établissement de ces installations et aires de stockages. L'implantation et l'aménagement de ces terrains doivent être approuvés par l'Ingénieur qui ne peut les refuser sans raison valable.

Quel que soit le choix de l'entrepreneur quant à l'implantation de ces emplacements pour installation de chantier, aires de stockage, il demeure entièrement responsable de l'achèvement des Travaux dans les délais prévus

#### ARTICLE 6 : JOURNAL DE CHANTIER ET REUNION

Le journal de chantier sera rédigé et signé chaque jour par le représentant de l'Entrepreneur sur le chantier et par le représentant de l'Ingénieur et du Maître d'oeuvre. Il sera établi conjointement suivant un modèle défini et devra contenir au minimum les informations journalières suivantes :

- Les conditions atmosphériques ;
- Les travaux exécutés dans la journée, le personnel et le matériel employé ;
- L'avancement des Travaux ;
- Les prescriptions imposées ;
- Les quantités détaillées des Travaux ;
- Les opérations Administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché ;
- Des réceptions et agrément ;
- Les incidents, accidents et événements qui pourraient avoir une incidence ultérieure sur la tenue des ouvrages ou le déroulement du chantier ;
- Les non - conformités ;
- Les visites officielles.

Une réunion hebdomadaire à laquelle participeront obligatoirement l'Entrepreneur, l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre permettra de discuter des points relatifs à l'exécution du marché, d'évaluer l'avancement des travaux, et de préciser tout élément n'ayant pas reçu une définition suffisamment claire dans les termes du contrat ou avant le début des Travaux.

L'Ingénieur pourra modifier la périodicité des réunions sans que celle-ci puisse être supérieure à 15 jours

Les réunions hebdomadaires permettent à l'Ingénieur d'avoir une idée précise de l'évolution du chantier et de définir a priori les actions à entreprendre pour respecter les

conditions du marché.

Ces réunions font l'objet d'un procès-verbal rédigé par l'Ingénieur et signé par l'Entrepreneur et celui-ci également.

#### **ARTICLE 8 : PLAN DE RECOLEMENT**

L'Entrepreneur fournira à l'Ingénieur et à la Maîtrise d'oeuvre, en 3 exemplaires les plans de récolement des Travaux réalisés au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux y compris les réceptions partielles.

Ces plans se présentent sous la forme de matricule de bâtiment mentionnant la localisation, la nature, les quantités, les dates d'exécution de toutes les tâches réalisées.

En aucun cas, l'Entrepreneur ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignement fournis par l'administration, pour réclamer une revalorisation de son contrat.

#### **12-5 Emplacement mis à la disposition de l'entrepreneur**

Les emplacements nécessaires aux installations du chantier, au stationnement du matériel, au stockage des matériaux, peuvent être éventuellement mis gratuitement par l'Administration à la disposition de l'Entrepreneur, toutes les fois qu'il existe sur les zones d'activité, ou à proximité immédiate, des terrains libres dont l'Administration peut disposer.

#### **ARTICLE 9 : DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER**

Dans un préliminaire, l'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge nécessaires afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non seulement sur les documents de l'étude, mais aussi sur le terrain. La vérification portera notamment sur la localisation des emprunts

L'Entrepreneur présentera à l'Ingénieur et au Maître d'oeuvre les résultats de sa comparaison entre le projet et les conditions in situ et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Aucune exécution ne sera entreprise avant que les dispositions définitives ne soient prises, dans un délai maximum de dix jours. L'Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte des sujétions de délais entraînées par ces phases préliminaires.

L'Ingénieur définira à l'Entrepreneur, lors d'une visite détaillée, les travaux à réaliser.

Cette visite fera l'objet d'un procès-verbal signé par l'Ingénieur et l'Entrepreneur.

#### **ARTICLE 10: DOCUMENTS D'EXECUTION**

Après la définition des travaux conformément à l'article 9 ci-dessus et dans un délai maximum de CINQUANTE (50) jours à compter de la notification de l'ordre service de commencer les travaux, l'Entrepreneur soumettra à l'approbation de l'Ingénieur et au Maître d'oeuvre conformément aux directives du Maître D'ouvrage le programme d'exécution des travaux actualisés en trois (03) exemplaires.

Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis et fera ressortir en détail les différentes tâches à réaliser.

Deux exemplaires de ces pièces lui seront retournés dans un délais de 8 jours à partir de leur réception avec :

- Soit la mention d'approbation : "BON POUR EXECUTION"



- Soit la mention de leur rejet accompagnée du motif dudit rejet.

L'Entrepreneur disposera alors de 08 (huit) jours pour présenter un nouveau dossier.

L'Ingénieur et le Maître d'oeuvre disposeront alors d'un délai de 05 (cinq) jours pour donner leur approbation ou faire d'éventuels remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé les délais de 45 jours après notification de l'ordre de service de commencer les Travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionné à l'article 26 du CCAP. les délais de réponse supérieurs à 03 jours de l'Ingénieur et du Maître d'oeuvre étant décompté.

## **CHAPITRE IV MODE D'EVALUATION DES TRAVAUX**

### **ARTICLE 11 : CONDITIONS GENERALE D'EVALUATION**

Les prestations sont rémunérées à l'Entrepreneur, par application des prix du bordereau aux quantités réellement exécutés, conformément aux prescriptions du marché. Ces quantités doivent être constatées et approuvées par l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les conditions et suggestions imposées pour la bonne exécution des Travaux, et de toutes les conditions locales susceptibles d'avoir une influence sur cette exécution, et notamment :

- de la nature de la qualité des sols et terrains,
- des conditions de transport et d'accès sur le site
- du régime normal des eaux et des pluies dans la région concernée par le projet,
- de toutes les sources d'approvisionnement.

Il ne peut de ce fait élever aucune réclamation ayant pour base des difficultés ou suggestions imprévues en dehors des cas de force majeure définie au CCAP.

### **ARTICLE 12 : CONSISTANCE DES PRIX**

La consistance des prix unitaires fournis par l'Entrepreneur, est définie au CCAP.

### **ARTICLE 13: DEFINITION DES PRIX ET EVALUATION DES TRAVAUX**

Les prestations réalisées seront payées à l'Entrepreneur par application des prix du bordereau aux quantités des Travaux évalués selon les prescriptions du présent article.

En cas de constatation des travaux supplémentaires, dont les prix unitaires ne sont pas définis dans le bordereau des prix, l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre se réservent le droit d'appliquer les prix unitaires de références.



## CHAPITRE V : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

### ARTICLE 14: INSTALLATION DE CHANTIER

L'Entrepreneur proposera à l'Ingénieur et au Maître d'oeuvre, avant le début des travaux, le lieu de ces installations de chantier et sollicitera par note verbale son autorisation d'installation.

Le site doit être choisi en dehors des zones sensibles. il doit prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, l'Entrepreneur réalisera tous les Travaux nécessaires à la remise en état des lieux. Il devra démolir toute installation fixe, et ne pourra abandonner aucun équipement ni de matériaux sur le site, ni dans les environs.

Après le repli du matériel, un procès-verbal établi sous la responsabilité de l'Ingénieur et du Maître d'oeuvre constatera la remise en état du site. Il devra être dressé et joint au PV de la réception provisoire des Travaux. Le paiement du forfait de repli du matériel ne pourra être rémunéré qu'à la vue de ce PV constatant la remise en état du site.

### ARTICLE 15 : SANCTIONS ET PENALITES

Il est rappelé à l'Entrepreneur que l'article 79 de la loi cadre NI 96/12 du 5août 1996 prévoit une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA et une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement, pour toute personne ayant empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par ladite loi et /ou par ses textes d'application.

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées par écrit (ordre de service) à l'Entreprise par l'Ingénieur et le Maître d'oeuvre sera également consignée dans le cahier de chantier. Celui -ci pourra servir de pièce contractuelle en cas de litiges dans l'application des événements sanctions.

La reprise des travaux ou des travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses reste à la charge de l'Entrepreneur.

### B. Achèvement et soumission des rapports

RAPPORTS	DATE
1. Rapport initial	
2.Rapports d'avancement a.Premier rapport d'avancement b.Deuxième rapport d'avancement	
3.Projet de rapport final	
4.Rapport final	

**PIECE N° 6**

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX  
UNITAIRES



N° Prix	DESIGNATIONS	U	Prix en Chiffre	Prix en lettres	
100	<b>SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
101	Installation du chantier y compris amenée et repli	FF			
102	Clôture provisoire de chantier	ml			
103	Etudes géotechniques et d'exécution	FF			
104	Implantation	FF			
<b>SOUS-TOTAL 1 Série 100</b>					
200	<b>SERIE 200 : FONDATIONS</b>				
201	Nivellement de la plate-forme y compris abattage des arbres et dessouchage des racines	m²			
202	Fouilles en rigole	m³			
203	Fouilles en pleine masse	m²			
204	Béton de propreté dosé à 150 kg/m³	m³			
205	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour semelles	m³			
206	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour amorces	m³			
207	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour longrines	m³			
208	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour voile de la rampe	m³			
209	Agglomérés de 20x20x40 cm bourrés	m²			
210	Etanchéités sur mur de fondation	m²			
211	Enduits de mortier bicouches pour sous-bassement	m²			
212	Remblais de fondation et compactage avec emprunt latéritique	m³			
213	Béton dosé à 300kg/m³ pour dallage sol y compris film polyane	m³			
<b>SOUS-TOTAL Série 200</b>					
300	<b>SERIE 300 : ELEVATIONS RD</b>				
301	Agglomérés creux de 15x20x40	m²			
302	Agglomérés creux de 10x20x40	m²			
303	Béton dosé à 350kg/m³ pour Poteaux Rectangulaires	m³			
304	Béton dosé à 350kg/m³ pour Poteaux ronds	m³			
305	Béton dosé à 350kg/m³ pour Poteaux et Linteaux	m³			
306	Béton dosé à 350kg/m³ pour poteaux Baies en losange	m³			
307	Béton dosé à 350kg/m³ pour	m³			

	Chainage				
308	Béton dosé à 350kg/m3 pour Escalier				
309	Béton dosé à 350kg/m3 pour Chêneaux	m3			
310	Béton dosé à 350kg/m3 pour Acrotère	m3			
311	Béton dosé à 350kg/m3 pour Dallage et Rampe	m3			
312	Enduits de mortier bicouches pour murs extérieurs et intérieurs	m²			
	<b>SOUS-TOTAL Série 300</b>				
400	<b>SERIE 400 : COUVERTURE-CHARPENTES-ETANCHEITES</b>				
401	F/P Charpente en bastings de 12cm y compris pannes	m3			
402	Chevron de 8x8cm pour pannes	m3			
403	F/P Tôles en Alu prélaquées 6/10 <sup>e</sup> y compris tôles noues et toutes sujétions	m²			
404	F/P Tôles faitières	ml			
405	F/P Etanchéité du chéneau y compris toutes sujétions	m²			
406	F/P Descentes d'eaux pluviales en PVC y compris toutes sujétions	ml			
	<b>SOUS-TOTAL Série 400</b>				
500	<b>SERIE 400 : MENUISERIES BOIS ET METALLIQUES</b>				
501	F/P Portes en bois doubles battants avec Panneaux vitrés de 160*220	U			
502	F/P Portes en bois massif doubles battants de 140*220	U			
503	F/P Portes en bois simple battants 95*220	U			
504	F/P Portes en bois simple battants 85*220	U			
505	F/P Portes en bois simple battants 70*220	U			
506	F/P Portes en bois simple battants avec imposte de 80*240	U			
507	F/P Cadres en bois de 100*240	U			
508	F/P Baies Vitrées en losange de 140*220	U			
509	F/P Baies Vitrées rectangulaires de 120*280	U			
510	F/P Baies Vitrées rectangulaires de 120*120	U			
	<b>SOUS-TOTAL Série 500</b>				
600	<b>SERIE 600 : ELECTRICITE</b>				
601	F/P de circuit de terre, gaine d'isolation, câblage, tableau de	U			

	distribution, boîtier, raccords et coffrets électriques				
602	F/P des ampoules économiques y compris toutes sujétions	U			
603	F/P Prises fortes avec terres y compris toutes sujétions	U			
604	F/P Interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions	U			
605	F/P Interrupteurs double allumage y compris toutes sujétions	U			
606	F/P Interrupteurs va-et-vient y compris toutes sujétions	U			
607	F/P Appliques sanitaires y compris toutes sujétions	U			
608	F/P Lampes hublots étanches dans les salles d'eau et la circulation y compris toutes sujétions	U			
609	F/P Appliques murales y compris toutes sujétions	U			
610	F/P y compris toutes sujétions	U			
611	F/P y compris toutes sujétions	U			
	<b>SOUS-TOTAL Série 600</b>				
<b>700</b>	<b>SERIE 700 : INSTALLATION SANITAIRE ET PLOMBERIE</b>				
701	F/P Tuyauterie en PVC et Cuivre pour alimentation en EF/EC haute pression du compteur aux appareils	FF			
702	F/P Tuyauterie en PVC pour évacuation des EU-EV et EP de l'édifice à la fosse septique, puisards et Egouts	FF			
703	F/P WC en porcelaine vitrifiée à l'anglais avec chasse basse y compris toutes sujétions	U			
704	F/P Bidet complet y compris toutes sujétions	U			
705	F/P Lavabo sur piédestal en porcelaine vitrifiée avec robinetterie en fer chromé y compris toutes sujétions	U			
706	F/P Colonne de douche y compris toutes sujétions	U			
707	F/P Glace de lavabo y compris toutes sujétions	U			
708	F/P Urinoir en porcelaine vitrifiée y compris toutes sujétions	U			
709	F/P Porte savon en grès cérame y compris toutes sujétions	U			
710	F/P Porte papier hygiénique en porcelaine avec couche rabattant y compris toutes sujétions	U			

711	F/P Siphon y compris toutes sujétions	U			
	SOUS-TOTAL Série 700				
800	SERIE 800 : REVETEMENTS				
801	F/P Carreaux de faïence de 15x30 sur le mur (2.2m de hauteur) dans la salle d'eau y compris toutes sujétions	m²			
802	F/P Carreaux vérifiés de 60x60 pour sol intérieurs y compris toutes sujétions	m²			
803	F/P Carreaux grès cérame pour sol véranda y compris toutes sujétions	m²			
804	F/P Carreaux grès cérame pour plinthes h=10cm y compris toutes sujétions	ml			
805	F/P Carreaux antidérapants pour toilettes et salles d'eau y compris toutes sujétions	m²			
806	F/P Carreaux grès cérame antidérapants pour Rampe d'accès y compris toutes sujétions	m²			
	SOUS-TOTAL Série 800				
900	SERIE 900 : PLAFOND				
901	F/P Faux-plafond en staff y compris toutes sujétions	m²			
902	F/P Faux-plafond en lambris y compris toutes sujétions	m²			
903	F/P Faux-plafond en panneaux de 120x60cm en contre-plaqué vernis fixé sur ossature en bois préalablement traité	m²			
	SOUS-TOTAL Série 900				
1000	SERIE 1000 : PEINTURE				
1001	F/P Enduits blancs repassés en deux couches pour murs intérieurs et extérieurs	m²			
1002	F/P Peinture bicouche de qualité supérieure à l'extérieurs du bâtiment	m²			
1003	F/P Peinture bicouche de qualité supérieure à l'intérieur du bâtiment	m²			
1003	F/P Peinture type Glycéro sur menuiserie métallique dans tout le bâtiment	m²			
1005	F/P Vernis sur menuiserie en bois dans tout le bâtiment	m²			
	SOUS-TOTAL Série 1000				
1100	SERIE 1100 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS(VRD)				

1101	Regards en BA de pieds de chute des descentes d'EP de 40* 40 y compris toutes sujétions	U			
1102	Caniveaux de 50*40 en BA dosé à 350km3 y compris toutes sujétions	MI			
1103	Conduites PVC 0120 y compris toutes sujétions	MI			
1104	Fosse Septique de 45m3	U			
1105	Puisard Ø1, 20m et de 12ml	U			
	SOUS-TOTAL Série 1100				
1200	SERIE 1200 : PAVAGE				
1201	Pavés autobloquants en béton vibré d'épaisseur 15cm y compris toutes sujétions	m²			
	SOUS-TOTAL Série 1200				



## PIECE N° 7

### MODELE DE SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES



CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX				
Désignation:				
N°				
Prix	Rendement journalier	Quantité totale	Unité	Durée activité(j)
	CATEGORIE	Salaire journalier	jours facturés	Montant
Main d'œuvre				
	Total A			
Matériel et engins	TYPE	Taux journalier	jours facturés	Montant
	Total B			
Matériaux et Divers	TYPE	Prix Unitaire	Consommation	Montant
	Total C			
D	TOTAL COUTS DIRECTS		A+B+C	
E	Frais Généraux de Chantier		%D	
F	Frais Généraux de Siège		%D	
G	COUT DE REVIENT		D+E+F	
H	Risques + Bénéfices		%G	
P	PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE		H+G	
V	PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE		P/Qté	



**PIECE N° 8**

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET  
ESTIMATIF



N° Prix	DESIGNATIONS	U	QTE	P.U	TOTAL
100	<b>SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>				
101	Installation du chantier y compris amenée et repliement	FF	1		
102	Clôture provisoire de chantier	ml	300		
103	Etudes géotechniques et d'exécution	FF	1		
104	Implantation	FF	1		
<b>SOUS-TOTAL 1 Série 100</b>					
200	<b>SERIE 200 : FONDATIONS</b>				
201	Nivellement de la plate-forme y compris abattage des arbres et dessouchage des racines	m²	1,000		
202	Fouilles en rigole	m3	270.28		
203	Fouilles en pleine masse	m²	19.7		
204	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3	m3	13.79		
205	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour semelles	m3	10.42		
206	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour amorces	m3	32.38		
207	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour longrines	m3	23.71		
208	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour voile de la rampe	m3	9.14		
209	Agglomérés de 20x20x40 cm bourrés	m²	756.79		
210	Etanchéités sur mur de fondation	m²	385.54		
211	Enduits de mortier bicouches pour sous-bassement	m²	208.23		
212	Remblais de fondation et compactage avec emprunt latéritique	m3	1,058.87		
213	Béton dosé à 300kg/m3 pour dallage sol y compris film polyane	m3	88.24		
<b>SOUS-TOTAL Série 200</b>					
300	<b>SERIE 300 : ELEVATIONS RD</b>				
301	Agglomérés creux de 15x20x40	m²	1,527.10		
302	Agglomérés creux de 10x20x40	m²	52.62		
303	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poteaux Rectangulaires	m3	16.79		
304	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poteaux ronds	m3	28.4		
305	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poteaux Linteaux	m3	36.57		
306	Béton dosé à 350kg/m3 pour Poteaux Baies en losane	m3	61.4		
307	Béton dosé à 350kg/m3 pour Chainage	m3	14.19		

308	Béton dosé à 350kg/m3 pour Escalier		1.709		
309	Béton dosé à 350kg/m3 pour Chêneaux	m3	22.79		
310	Béton dosé à 350kg/m3 pour Acrotère	m3	17.09		
311	Béton dosé à 350kg/m3 pour Dallas et Rame	m3	3.45		
312	Enduits de mortier bicouches pour murs extérieurs et intérieurs	m²	3,300.00		
	<b>SOUS-TOTAL Série 300</b>				
400	<b>SERIE 400 : COUVERTURE-CHARPENTES-ETANCHEITES</b>				
401	F/P Charpente en bastaings de 12cm y compris pannes	m3	30.62		
402	Chevrons de 8x8cm pour pannes	m3	12.15		
403	F/P Tôles en Alu pré laquée 6/10 <sup>e</sup> y compris tôles noues et toutes sujétions	m²	1,329.39		
404	F/P Tôles faitières	ml	156		
405	F/P Etanchéité du chéneau y compris toutes sujétions	m²	367.48		
406	F/P Descentes d'eaux pluviales en PVC y compris toutes sujétions	ml	144.27		
	<b>SOUS-TOTAL Série 400</b>				
500	<b>SERIE 400 : MENUISERIES BOIS ET METALLIQUES</b>				
501	F/P Portes en bois doubles battants avec Panneaux vitrés de 160*220	U	3		
502	F/P Portes en bois massif doubles battants de 140*220	U	4		
503	F/P Portes en bois simple battants 95*220	U	4		
504	F/P Portes en bois simple battants 85*220	U	9		
505	F/P Portes en bois simple battants 70*220	U	17		
506	F/P Portes en bois simple battants avec imposte de 80*240	U	9		
507	F/P Cadres en bois de 100*240	U	8		
508	F/P Baies Vitrées en losange de 140*220	U	64		
509	F/P Baies Vitrées rectangulaire de 120*280	U	8		
510	F/P Baies Vitrées rectangulaire de 120*120	U	8		
	<b>SOUS-TOTAL Série 500</b>				
600	<b>SERIE 600 : ELECTRICITE</b>				
601	F/P de circuit de terre, gaine d'isolation, câblage, tableau de distribution, boîtier, raccords et	U	1		

	coffrets électriques				
602	F/P des ampoules économiques y compris toutes sujétions	U	90		
603	F/P Prises fortes avec terres y compris toutes sujétions	U	125		
604	F/P Interrupteurs simple allumage y compris toutes sujétions	U	42		
605	F/P Interrupteurs double allumage y compris toutes sujétions	U	18		
606	F/P Interrupteurs va-et-vient y compris toutes sujétions	U	12		
607	F/P Appliques sanitaires y compris toutes sujétions	U	12		
608	F/P Lampes hublots étanches dans les salles d'eau et la circulation y compris toutes sujétions	U	32		
609	F/P Appliques murales y compris toutes sujétions	U	28		
610	F/P y compris toutes sujétions	U	3		
611	F/P y compris toutes sujétions	U	20		
	<b>SOUS-TOTAL Série 600</b>				
700	<b>SERIE 700 : INSTTALATION SANITAIRE ET PLOMBERIE</b>				
701	F/P Tuyauterie en PVC et Cuivre pour alimentation en EF/EC haute pression du compteur aux appareils	FF	1		
702	F/P Tuyauterie en PVC pour évacuation des EU-EV et EP de l'édifice à la fosse septique, puisards et Egouts	FF	1		
703	F/P WC en porcelaine vitrifiée à l'anglais avec chasse basse y compris toutes sujétions	U	11		
704	F/P Budget complet y compris toutes sujétions	U	5		
705	F/P Lavabo sur piédestal en porcelaine vitrifiée avec robinetterie en fer chromé y compris toutes sujétions	U	4		
706	F/P Colonne de douche y compris toutes sujétions	U	4		
707	F/P Glace de lavabo y compris toutes sujétions	U	12		
708	F/P Urinoir en porcelaine vitrifiée y compris toutes sujétions	U	5		
709	F/P Porte savon en grés cérame y compris toutes sujétions	U	4		
710	F/P Porte papier hygiénique en porcelaine avec couche rabattant y compris toutes sujétions	U	11		
711	F/P Siphon y compris toutes	U	13		

	sujétions				
	SOUS-TOTAL Série 700				
800	SERIE 800 : REVETEMENTS				
801	F/P Carreaux de faïence de 15x30 sur le mur (2.2m de hauteur) dans la salle d'eau y compris toutes sujétions	m²	230		
802	F/P Carreaux vérifiés de 60x60 pour sol intérieurs y compris toutes sujétions	m²	580		
803	F/P Carreaux grés cérame pour sol véranda y compris toutes sujétions	m²	120		
804	F/P Carreaux grés cérame pour plinthes h=10cm y compris toutes sujétions	ml	560		
805	F/P Carreaux antidérapants pour toilettes et salles d'eau y compris toutes sujétions	m²	80		
806	F/P Carreaux grés cérame antidérapants pour Rampe d'accès y compris toutes sujétions	m²	60		
	SOUS-TOTAL Série 800				
900	SERIE 900 : PLAFOND				
901	F/P Faux-plafond en staff y compris toutes sujétions	m²	200		
902	F/P Faux-plafond en lambris y compris toutes sujétions	m²	250		
903	F/P Faux-plafond en panneaux de 120x60cm en contre-plaqué vernis fixé sur ossature en bois préalablement traité	m²	310		
	SOUS-TOTAL Série 900				
1000	SERIE 1000 : PEINTURE				
1001	F/P Enduits blancs repassés en deux couches pour murs intérieurs et extérieurs	m²	3508.23		
1002	F/P Peinture bicouche de qualité supérieure à l'extérieurs du bâtiment	m²	900		
1003	F/P Peinture bicouche de qualité supérieure à l'intérieurs du bâtiment	m²	2,400		
1003	F/P Peinture type Glycéro sur menuiserie métallique dans tout le bâtiment	m²	40		
1005	F/P Vermis sur menuiserie en bois dans tout le bâtiment	m²	180		
	SOUS-TOTAL Série 1000				
1100	SERIE 1100 : VOIRIES ET RESEAUX DIVERS(VRD)				

1101	Regards en BA de pieds de chute des descentes d'EP de 40* 40 y compris toutes sujétions	U	32		
1102	Caniveaux de 50*40 en BA dosé à 350km3 y compris toutes sujétions	MI	320		
1103	Conduites PVC 0120 y compris toutes sujétions	MI	300		
1104	Fosse Septique de 45m3	U	1		
1105	Puisard Ø1, 20m et de 12ml	U	1		
	SOUS-TOTAL Série 1100				
1200	SERIE 1200 : PAVAGE				
1201	Pavés autobloquants en béton vibré d'épaisseur 15cm y compris toutes sujétions	m²	2,000		
SOUS-TOTAL Série 1200					
TOTAL HT					
TVA (19,25%)					
TOTAL GENERAL TTC					
Arrêté le présent devis à la somme Tous taxes comprises de :					





## PIECE N° 9

### FORMULAIRES ET MODELES DES PIECES



## Table des modèles

Annexe N° 1 : Modèle de déclaration d'intention de soumissionner

Annexe N° 2 : Modèle de soumission

Annexe N° 3 : Modèle de caution de soumission

Annexe N° 4 : Modèle de cautionnement définitif

Annexe N° 5 : Modèle de caution d'avance de démarrage

Annexe N° 6 : Modèle de caution de retenue de garantie



# PIECE N°10:MODELE DE MARCHE



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix – Travail – Patrie

-----  
MINISTERE DES ARTS ET DE LA  
CULTURE  
-----

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace – Work – Fatherland

-----  
MINISTRY OF ARTS AND CULTURE  
-----

MARCHE N° \_\_\_\_\_/M/MINAC/CIPM/2025  
N° /AONO/MINAC/CIPM/2025 DU .....  
POUR LES TRAVAUX DE .....

**TITULAIRE DU MARCHE:**

**OBJET DU MARCHE:**

.....

**LIEU D'EXECUTION :**

.....

**MONTANT DU MARCHE:**

MONTANT TOTAL HTVA	
TVA : 19.25 %	
MONTANT TOTAL T.T.C.	
IR : 2,2% ou 5.5%	
NET A PERCEVOIR	

**DELAI D'EXECUTION:**

Trente-six (36) mois

**IMPUTATION :**

.....

**FINANCEMENT :**

BIP du MINAC/ EXERCICE 2025 et suivants

APPROUVE LE

SIGNE LE

NOTIFIE LE

ENREGISTRE LE.....



Entre

**Le Gouvernement de la République du Cameroun, représenté par le Ministre des Arts et de la Culture, ci-après dénommé :**

**« LE MAITRE D'OUVRAGE » d'une part**

et-----représenté par son Directeur Général ci-après désigné :

**« LE COCONTRACTANT », d'autre part.**

**Il est convenu et arrêté ce qui suit :**



# Sommaire


**Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)**

**Titre II : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)**

**Titre III : Bordereau des prix**

**Titre IV : Détail estimatif**

**Titre V : Calendrier de livraison**



Page ----- et dernière du marché N°-----passée après Appel  
d'Offres National Ouvert avec la société-----

**MONTANT :**

MONTANT TOTAL HTVA	
TVA : 19.25 %	
MONTANT TOTAL T.T.C.	
IR : 2,2% ou 5,5%	
NET A PERCEVOIR	

**DELAI :** Trente-six (36) mois

<p style="text-align: center;"><b>Lu et accepté par Le Cocontractant</b></p> <p style="text-align: center;">Yaoundé le .....</p>
<p style="text-align: center;"><b>Signé par le Ministre des Arts et de la Culture (Maître d'Ouvrage)</b></p> <p style="text-align: center;">Yaoundé le .....</p>
<p style="text-align: center;"><b>Enregistrement</b></p> <p style="text-align: center;">Yaoundé le .....</p>



**PIECE N°11:MODELES DE  
DOCUMENTS A UTILISER PAR  
LES SOUMISSIONNAIRES**





**ANNEXE N°1 : MODELE DE LETTRE D'INTENTION A SOUMISSIONNER (à  
timbrer)**

Je soussigné (nom et prénom du signataire) (1) -----  
agissant en qualité de ----- (qualité du signataire vis à vis de  
l'entreprise)de l'entreprise ----- dont le siège social est à ----  
----- inscrite au registre de commerce de ----- sous  
le n°-----.

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d'Appel d'Offres  
National Ouvert

N °/AONO/MINAC/CIPM/2025 DU ----- pour les  
-----

- Déclare par la présente, l'intention de soumission à cet Appel d'Offres;
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai de 90 jours à compter  
de la date limite de remise de l'offre.

Fait à -----, le -----  
-----

Signature ----- de  
-----

En qualité de -----

**ANNEXE N°2 : MODELE DE LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION**

**TECHNIQUE (à timbrer)**

Lieu et date

A Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture

Monsieur le Ministre,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, au titre de prestataire, pour ..... conformément à votre Dossier d'Appel d'Offres en date du ..... et à notre proposition. Nous vous soumettons par les présentes notre Proposition Technique.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la proposition, c'est-à-dire avant la notification nous nous engageons à négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre proposition a pour nous force obligatoire, sous réserve des modifications résultant de la négociation du contrat.

Nous savons que vous n'êtes tenu d'accepter aucune des propositions reçues.

Par ailleurs, nous déclarons sur l'honneur n'avoir abandonné aucun marché qui nous a été confié par l'Etat au cours de ces .....(nombre d'années) dernières années et ne figurons pas sur la liste des entreprises défailtantes annuellement établie par le Ministère des Marchés Publics.

Veillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité et  
adresse.

**ANNEXE N°3 : MODELE DE LETTRE SOUMISSION (à timbrer)**

Je soussigné (nom et prénom du signataire) (1) -----

-----  
agissant en qualité de ----- (qualité du signataire vis-à vis de  
l'entreprise)

de l'entreprise ----- nationalité -----  
-----

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces du Dossier d'Appel d'Offres  
N°/AONO/MINAC/CIPM/2025 du 2025 pour les travaux de  
----- me soumet et m'engage à exécuter les travaux  
conformément aux conditions du cahier des Clauses Administratives Particulières, du  
Cahier des Clauses Techniques Particulières, du Bordereau des Prix et du Dossier  
Technique pour un montant de :

- ----- (en chiffres et  
en lettres) francs Cfa hors TVA, et à -----francs CFA toutes taxes  
comprises :

- M'engage à exécuter les travaux dans un délai de ----- Mois ;
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 90 jours à compter de  
la date limite de remise des offres.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

-----  
-----  
-----

L'Administration se libérera des sommes dues par elle au titre du marché en faisant  
donner crédit au compte n° ----- ouvert au nom de  
-----

Auprès de la banque ----- Agence de  
-----

Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra  
engagement entre nous.

Fait à -----, le -----

-----


Signature ----- de

-----

En qualité de -----

Dûment autorisé à signer les soumissions pour  
et au nom de

-----



#### ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION

Adressée à Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que le fournisseur ..... ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du ..... pour..... ci-dessous désignée « Offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à ..... Francs CFA.

Nous ..... représenté(e)s par ..... ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage de la somme maximale de ..... francs Cfa, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'attribution du marché par le Maître d'ouvrage pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis du faire ;
- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définit du marché, comme prévu dans celui-ci.

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande, le Maître d'Ouvrage notera que le montant qu'il est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le Maître d'ouvrage pour la remise de l'offre. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité de l'offre. Toute demande du Maître d'ouvrage tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque  
à ....., le  
.....  
(signature de la banque)



**ANNEXE N°5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF**

Banque :

Référence de la caution : n°.....

Adressée à (indiquer le Maître d'Ouvrage et son adresse) Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que ..... (nom et adresse du fournisseur), ci-dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché désignée « le marché », à réaliser (indiquer la nature des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans du marché que le Fournisseur remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un montant égal à (indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5%) du montant de la tranche du marché correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché.

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous. ....(nom et adresse de banque)

Représentée par ..... (noms des signataires)

ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d'ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de .....

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définit et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif entre en vigueur dès sa signature et dès notification au Fournisseur, par le Maître d'Ouvrage, de l'approbation du marché. Elle sera libérée dans un délai de ..... à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Après cette date, la caution deviendra sans objet et devra nous être retournée sans demande expresse de notre part.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.



Signé et authentifié par la banque

à ....., le

.....

(signature de la banque)

**ANNEXE N°6 : MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE**

Banque :

Référence de la caution : n°.....

Adressée à (indiquer le Maître d'Ouvrage et son adresse),

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que ..... (nom et adresse du fournisseur),

Ci-dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, à réaliser les travaux de (indiquer l'objet des travaux)

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant du marché peut être remplacée par une caution solidaire.

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur cette caution.

Nous,..... (nom et adresse de la banque)

Représentée par ..... (noms des signataires), et ci-dessous désignée « banque »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage, au nom du Fournisseur, pour un montant maximum de ..... (en chiffres et en lettres), correspondant à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant du marché.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du marché modifiée le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à (pourcentage inférieur à 10% à préciser) du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification du marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de Trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et parvenir à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

à ....., le

.....

(signature de la banque)

**PIECE N°12:  
JUSTIFICATIFS DES ETUDES  
PREALABLES**



## **Annexe n° 7 : Justificatif des études préalables**

1. Une étude préalable a été menée qui a permis :

- Le site
- La superficie
- Les plans
- Les devis

2. Indiquer :

2.1. La date :2021-2024

2.2. Le nom du maître d'œuvre public ou privé l'ayant réalisé : Délégué  
Départemental du Ndonga-Mantung.

2.4. Description des études : (ci-joint les plans produits par cette  
étude)





# PROJET DE CONSTRUCTION DES MAISONS DE LA CULTURE AU CAMEROUN

*Maître d'ouvrage:*



MINAC



N° PLAN	TITRE	DATE
P 10		Jan. 2018
PHASE		ECHELLE
A.P.S		///
IMAGES DE SYNTHESE		


INDICES	MODIFICATIONS	DATES
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Dessiné par :	Ingenieur Projet:	Architecte
FOUSSA Yannick Gaspard		


V E S A

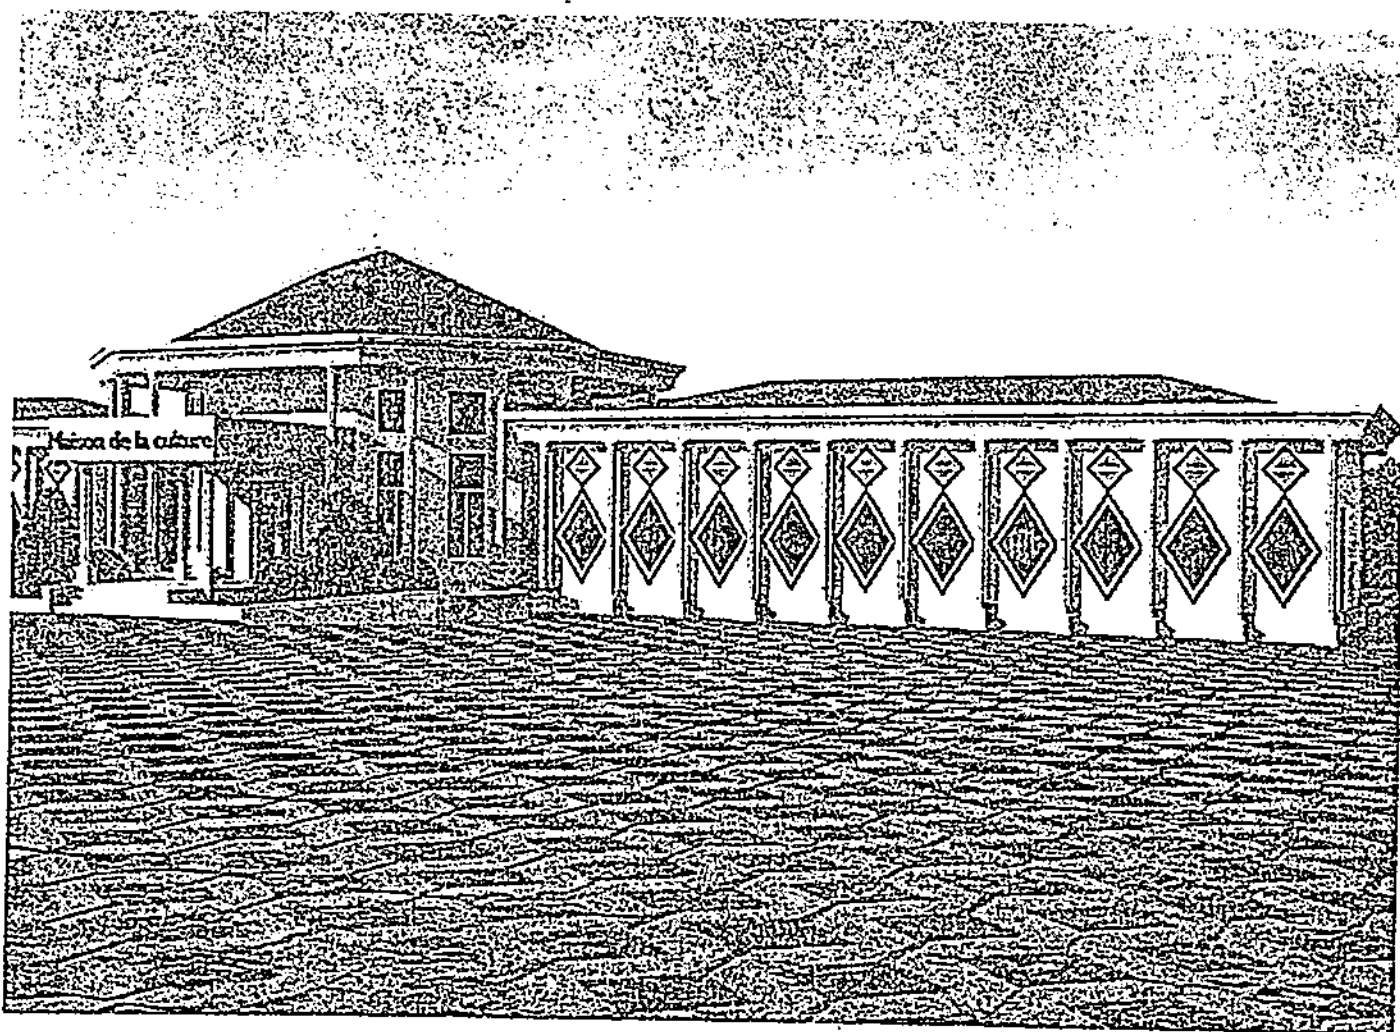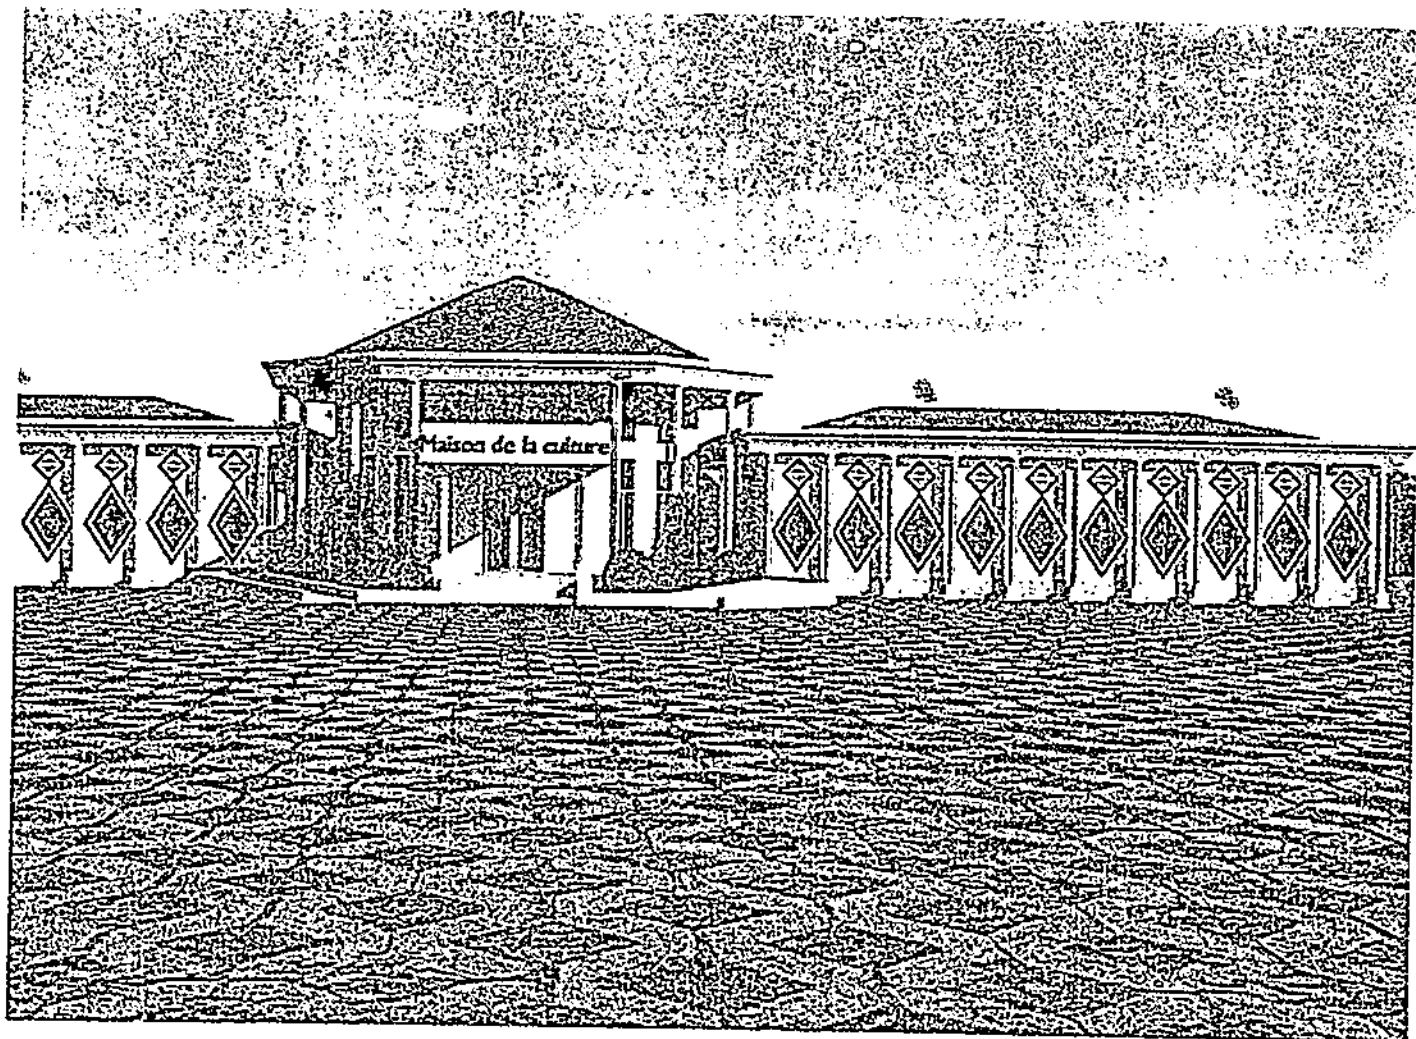

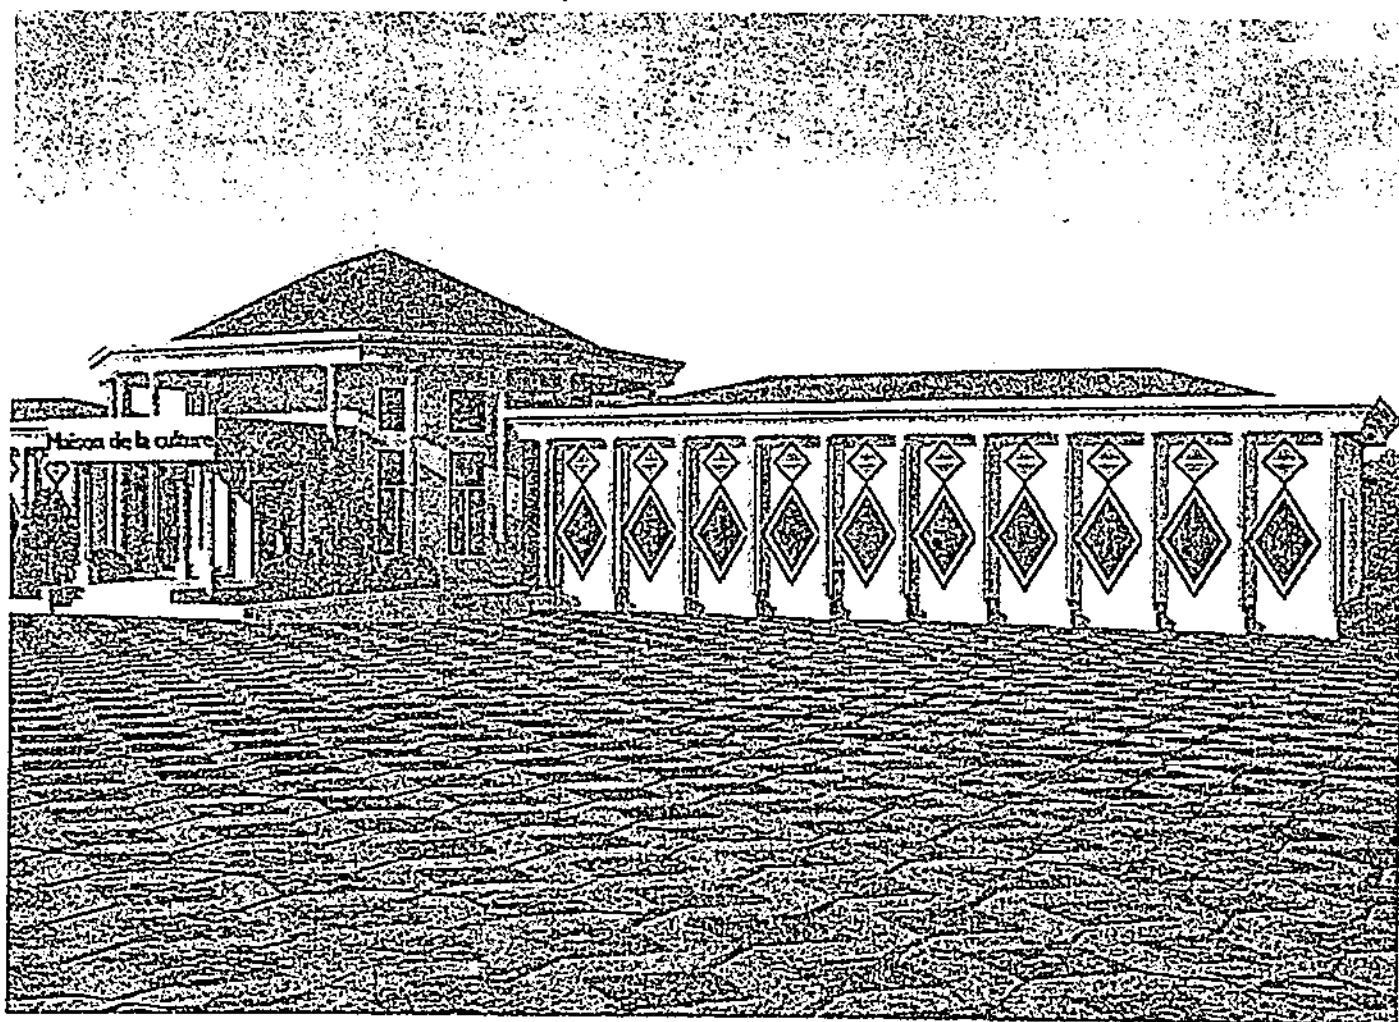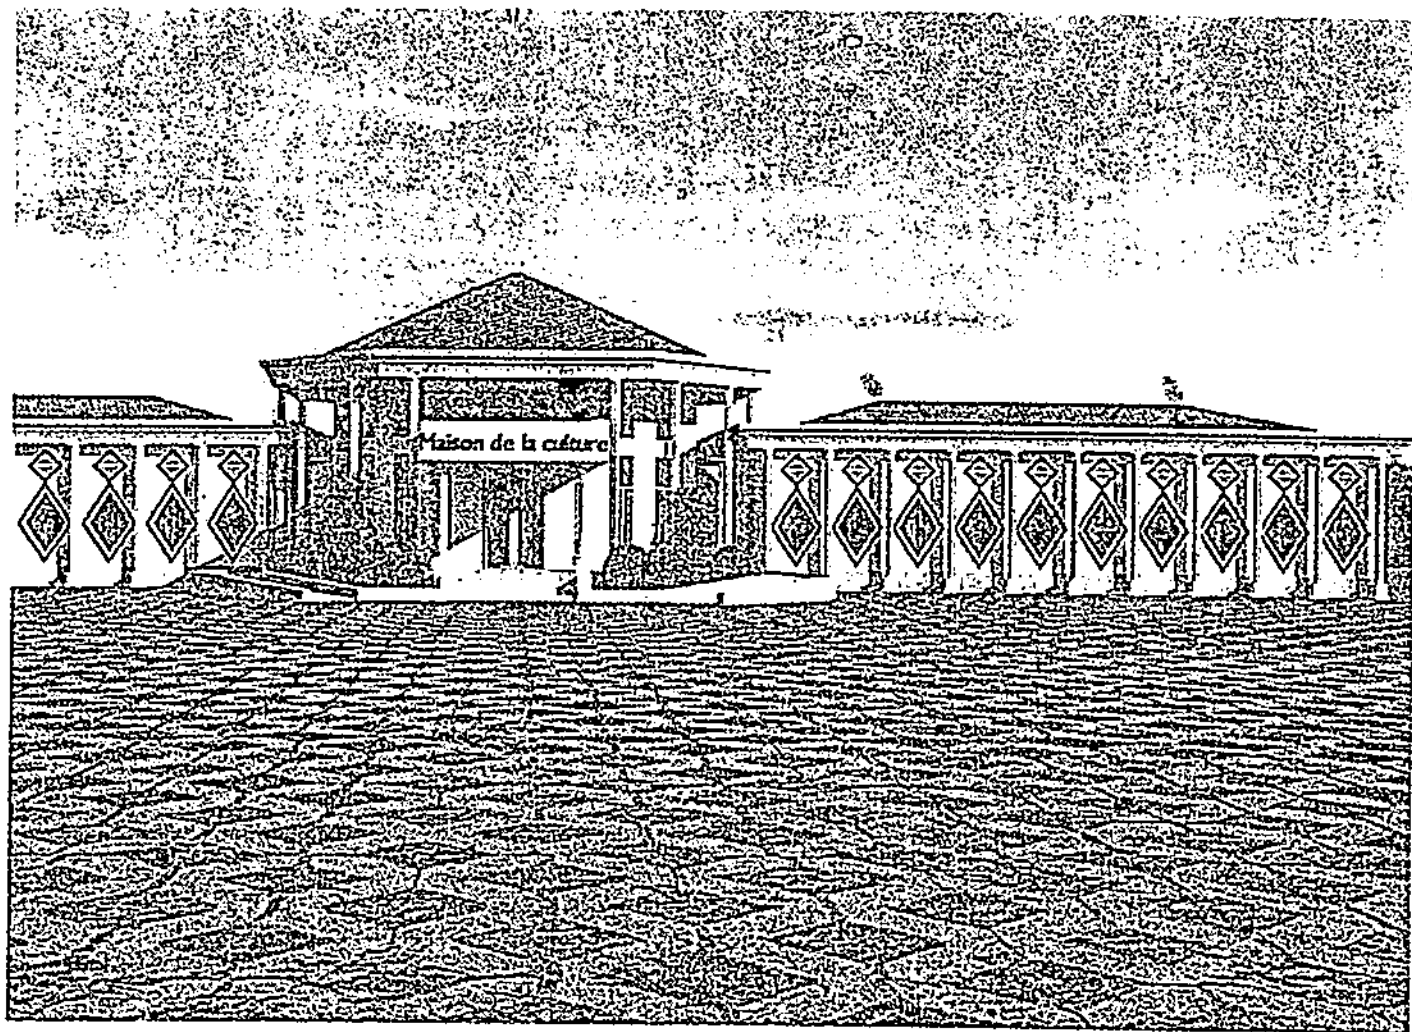

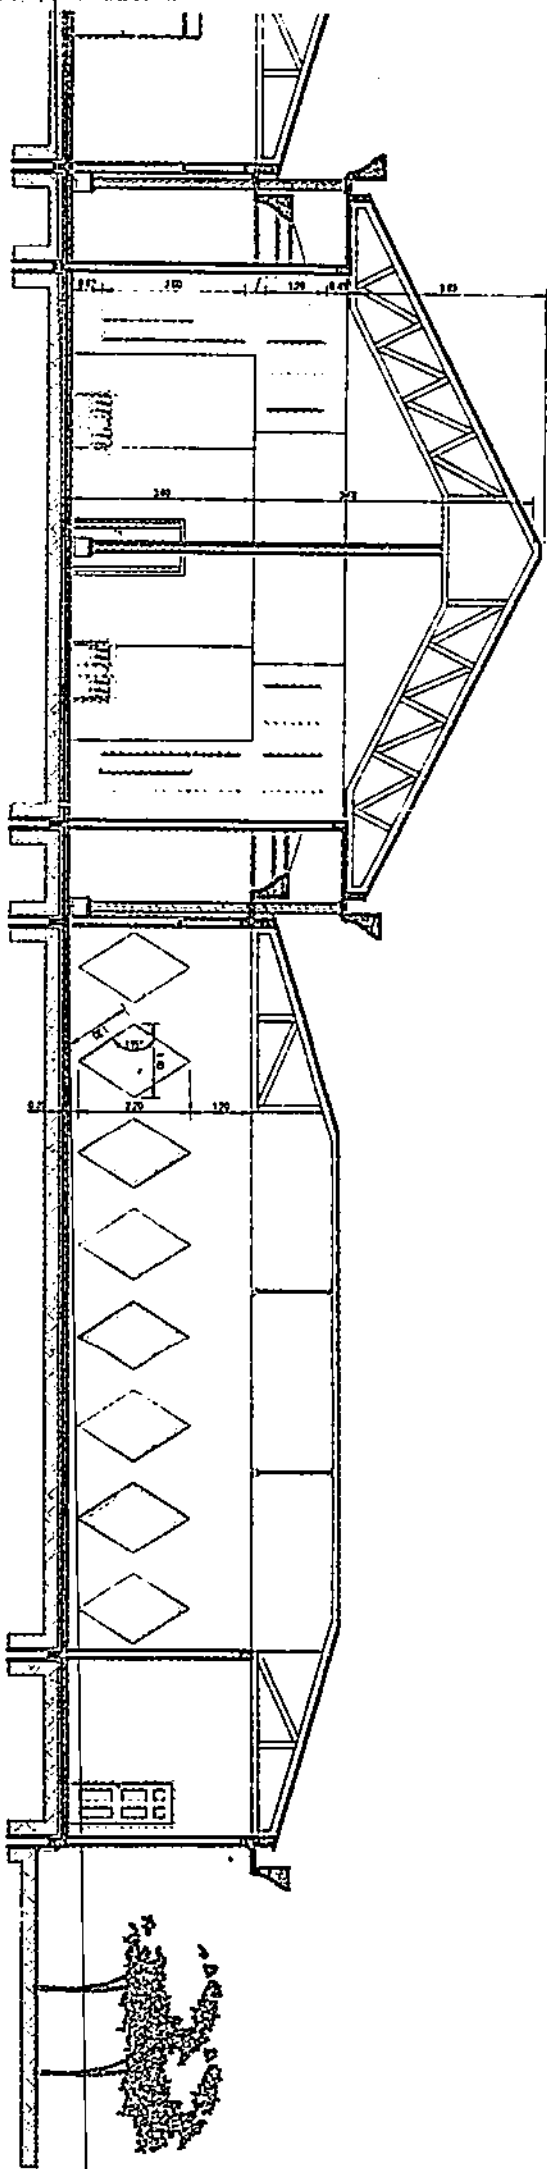

Coupe X-X



## ANNEXE N°7 : GRILLE D'EVALUATION

La grille d'évaluation qui sera utilisée par la Sous-commission d'Analyse est la suivante :

### GRILLE D'ANALYSE

<b>ENTREPRISE :</b>			
<b>CRITERES ELIMINATOIRES</b>			
1.	Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif après 48 heures		
2.	Fausse déclaration ou pièce falsifiée		
3.	Omission dans le dossier financier d'un prix unitaire quantifié		
4.	Non-satisfaction d'au moins cinq (05) critères sur les sept (07) critères de qualification		
5.	Absence de la caution de soumission		
6.	Déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché public au cours des deux (02) dernières années		
7.	<b>A- PERSONNEL D'ENCADREMENT (16 critères)</b>		
<b>1- Conducteur des travaux (4 critères)</b>			
<b>1.1. Formation de Base (2 critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Ingénieur des Travaux de Génie Civil		
	Attestation de disponibilité + CV daté signé		
	Nombre de critères		
<i>N.B. : l'expérience professionnelle n'est évaluée que si le CV est produit et signé</i>			
<b>1.2. Expérience dans le domaine des bâtiments (2 critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans		
	Supérieure à 10 ans		
	Nombre de critères		
<b>2- Chef de chantier N° 1 (4 critères)</b>			
<b>2.1. Formation de Base (2 critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Technicien de Génie Civil avec 05 (cinq) ans d'expérience		
	Attestation de disponibilité + CV daté signé		
	Nombre de critères		
<b>2.2 Expérience dans le domaine des bâtiments (2 critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans		
	Supérieure à 10 ans		
	Nombre de critères		
<b>3- Un ingénieur de génie électrique (ou ingénieur électrotechnicien ou un ingénieur en maintenance industrielle) 4 critères)</b>			
<b>3.1. Formation de Base (2critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Un ingénieur de génie électrique (ou ingénieur électrotechnicien ou un ingénieur en maintenance industrielle)		
	Attestation de disponibilité + CV daté signé		
	Nombre de critères		
<b>3.2 Expérience dans le domaine des bâtiments (2 critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans		
	Supérieure à 10 ans		
	Nombre de critères		
<b>4- Un technicien en installation sanitaire (4 critères)</b>			
<b>4.1 Formation de Base (2critères)</b>			
	Critères	Non	Oui
	Un technicien en installation sanitaire (niveau minimum CAP) avec 03 (trois) ans d'expérience ou un technicien avec		

niveau BEPC			
Attestation de disponibilité + CV daté signé			
<b>Nombre de critères</b>			
<b>4.2 Expérience dans le domaine des bâtiments (2 critères)</b>			
<b>Critères</b>	<b>Non</b>	<b>Oui</b>	<b>Observations</b>
Supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans			
Supérieure à 5 ans			
<b>Nombre de critères</b>			
<b>Total A- PERSONNEL</b>			

Le critère 7 est validé si l'entreprise obtient une note de 12/16 critères

### CRITERES ESSENTIELS

1. Chiffre d'affaire moyen supérieur ou égal à deux cent (200) millions de FCFA au cours des cinq (05) dernières années

<b>1- Chiffre d'affaire cumulé sur les 3 dernières années dans le domaine des travaux publics ou de structures similaires (1 critère par tranche de 100 millions). Les critères se cumulent.</b>			
Supérieur ou égal à 100 Millions et inférieur à 200 millions			
Supérieur ou égal à 200 Millions			
<b>Nombre de critères</b>			

Le critère 1 est validé si l'entreprise a un CA supérieur ou égal à 200 millions

2. Attestation de capacité financière de Cent vingt millions (120 000 000) de FCFA

<b>2- Attestation de capacité financière de Cent vingt millions (120 000 000) de FCFA (1 critère par tranche de 5 millions). Les critères se cumulent.</b>			
Supérieur ou égal à 50 000 000 et inférieur à 100 000 000			
Supérieur ou égal à 120 000 000 FCFA			
<b>Nombre de critères</b>			

Le critère 2 est validé si l'entreprise a une capacité financière supérieure ou égale à 120 millions

3. Références de l'entreprise dans le domaine

<b>Critères</b>	<b>Non</b>	<b>Oui</b>	<b>Observations</b>
<b>Nombre de critères</b>			
<b>2- Nombre de chantiers des travaux publics ou de structures similaires sur les 03 dernières années (1 critère par chantier).</b>			
Chantier 1			
Chantier 2			
<b>Nombre de critères</b>			
<b>Total C- REFERENCES</b>			

Le critère 3 est validé si l'entreprise présente au moins 1 chantier

4. Disponibilité du matériel et des équipements essentiels (4 critères)

Pièces justificatives des moyens matériels énumérés ci-dessous (cartes grise, certificat de vente enregistré de moins d'un an, attestation de dédouanement de moins d'un an) en originaux ou copies certifiées datant de moins de trois mois.

<b>Critères</b>	<b>Non</b>	<b>Oui</b>	<b>Observations</b>
Véhicule de liaison pick-up, ou station wagon (Carte grise ou contrat de location)			
Petit matériel et outillage (Brouettes, serre joints, pelle, pioches, seaux, et petit matériel et outillage)			
Matériel de sécurité à utiliser			
Boîte à pharmacie			
<b>Nombre de critères</b>			
<b>Total B- MATERIEL</b>			

Le critère est validé si 3 sur 4 sous critères sont validés.

- 5- ORGANISATION ET METHODOLOGIE (16 critères)

- 1- Organisation générale (7 critères)

Organisation de chantier			
Méthodologie d'exécution des différentes tâches,			
Planning d'exécution des travaux cohérent			
Mobilisation des personnels			
Mobilisation du matériel			
Matériaux de chantier			
Cohérence du sous détail des prix avec le planning proposé			
Mesures de protection es personnels, des matériels et de l'environnement			

Le critère est validé si 5 sur 7 sous critères sont validés

<b>6.Présentation des Offres</b>			
Présentation générale de l'Offre (reliure, lisibilité, agencement)			
Toutes les offres sont reliés			
Tous les documents sont lisibles			
Toutes les offres sont bien agencées			

Le critère 6 est validé si tous les sous critères sont validés

7. Déclaration sur l'honneur de visite de site (Le critère est validé si 2 sur 2 sous critères sont validés)

<b>DECLARATION DE VISITE DE SITE SIGNEE SUR L'HONNEUR</b>		
Déclaration signée		
Photos du site		

**ANNEXE N°8 :**

**LISTE DU PERSONNEL QUE LE SOUMISSIONNAIRE COMPTE UTILISER POUR  
L'EXECUTION DES TRAVAUX**

La liste sera faite conformément à la décomposition ci-dessous :

**1- CONDUCTEURS DE TRAVAUX (1)**

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

Diplômes universitaires \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

**2- AGENTS DE MAITRISE**

(Chefs de chantiers, Foreurs, Maçons, Métreurs, Electriciens, Plombiers)

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

**3- PERSONNEL ADMINISTRATIF**

Noms et Prénoms \_\_\_\_\_

Fonction \_\_\_\_\_

Nombre d'années d'expérience \_\_\_\_\_

**4- PERSONNEL DE CHANTIER**

- conducteurs d'engins et chauffeurs et leur nombre
- Chefs d'équipe et leur nombre
- Ouvriers spécialisés et leur nombre
- Ouvriers et leur nombre

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_  
(Nom et Signature du Soumissionnaire)

(1) Joindre un curriculum-vitae (nom, prénom, nationalité, expérience professionnelle) pour le personnel de direction et d'encadrement.





**-PIECE N°12:LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS**

**I. Etablissements bancaires :**

1. Afriland First Bank (AFB), B.P: 11 834 Yaoundé;
2. BANGE BANK CAMEROUN, BP 34692 Yaoundé
3. Banque Atlantique Cameroun (BACM) , B.P: 2933 Douala;
4. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), BP : 12 962 Yaoundé ;
5. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI Bank), BP : 660 Douala ;
6. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC), BP : 1925 Douala ;
7. CitiBank Cameroun B.P: 4571 Douala;
8. Commercial Bank Cameroon (CBC), B.P: 4 003 Douala;
9. Crédit Communautaire d'Afrique (CCA), 6578. Yaoundé
10. Ecobank Cameroun (ECOBANK), B.P: 582 Douala;
11. National Financial Credit Bank (NFC-BANK), B.P: 6578 Yaoundé;
12. Société Commerciale de Banques Cameroun (SCB-Cameroun), B.P : 300 Douala ;
13. Société Générale Cameroun (SGC), B.P : 4 042 Douala ;
14. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC), B.P: 1784 , B.P: 1784 Douala;
15. Union Bank of Cameroun (UBC), B.P: 15 569 Douala;
16. Union Bank for Africa (U.B.A), B.P: 2 088 Douala;
17. La Régionale BANK

**II. Compagnies d'assurance :**

18. Activa Assurances, B.P: 12 970 Douala ;
19. AREA Assurances , B.P: 15584 Douala;
20. Atlantique Assurances, B.P: 3073 Douala;
21. Chanas Assurances S.A., B.P: 109 Douala ;
22. CPA S.A., B.P : 54 Douala ;
23. Nsia Assurances S.A., B.P : 2759 Douala ;
24. PROASSUR, B.P: 5963 Douala;
25. Prudential Beneficial General Insurance, BP 2328, Douala
26. ROYAL ONYXINSURANCE Cie BP :12 230 Douala
27. SAAR, B.P : 1 011 Douala ;
28. Sanlam Assurances Cameroun., B.P : 2 125 Douala ;
29. Zenithe Insurance S.A., B.P: 1540 Douala./-
